



Ayuntamiento de Tihuatlán, Veracruz 2022-2025



SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL AÑO 2022

En el Municipio de Tihuatlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las quince horas del día veinte del mes de octubre del año dos mil veintidós, reunidos en la sala de Cabildo del Palacio Municipal para llevar a efecto sesión de Cabildo correspondiente a la Administración Pública Municipal 2022-2025, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28, 29, 30, 32, 36 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre, se lleva a efecto la sesión de Cabildo EXTRAORDINARIA, del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tihuatlán, la cual se integra con la presencia de los ciudadanos, **Leobardo Gómez González**, en su carácter de Presidente Municipal; **Licenciada Lidia de León Gutiérrez**, en su carácter de Síndica Única; **Ingeniero José Norberto Aguirre Orellan**, Regidor Primero; **C. Mónica Claudio Casados**, Regidora Segunda; **Licenciado Bernardo Aldana Vaquier**, Regidor Tercero; **Licenciada Norma Edith Herrera Viveros**, Regidora Cuarta y **C. Rodrigo Chávez Hernández**, Regidor Quinto, asistidos por la ciudadana **Lic. Mirta Idalia García García**, Secretaria del H. Ayuntamiento quien da fe; a fin de efectuar la sesión de Cabildo en base al siguiente:

Lidia de León Gutiérrez
Presidente

Mónica Claudio Casados
Síndica

José Norberto Aguirre Orellan
Regidor 1º.

Bernardo Aldana Vaquier
Regidor 2º.

..... ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Lista de asistencia y en su caso declaración de Quórum Legal.
- 2.- Aprobación del orden del día.
- 3.- Informe de parte de la Comisión de Obras Públicas y Comunicaciones, referente a la Obra Pública realizada por parte de la Dirección en el periodo correspondiente al mes de septiembre del año 2022.
- 4.- Propuesta para la aprobación del informe de Obra pública realizada en el mes de septiembre del año 2022, para la presentación ante el Congreso del Estado y el Órgano de Fiscalización Superior en el Estado.
- 5.- Clausura.

Mirta Idalia García García
Regidor 3º.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA.

PRIMER PUNTO: - Lista de asistencia y en su caso declaración de Quorum Legal. El Ciudadano **Leobardo Gómez González** Presidente Municipal Constitucional instruye a la Ciudadana **Licenciada Mirta Idalia García García** Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional, a fin de realizar pase de lista de asistencia dando cuenta que se encuentran presentes la totalidad de ediles, por lo que se decreta el **Quórum Legal** para sesionar, en términos del artículo 29 **segundo párrafo de la Ley Orgánica del Municipio Libre y en consecuencia se apertura oficialmente la sesión de cabildo**; por lo que los acuerdos que se tomen serán válidos, por ende obliga a su cumplimiento; el Ciudadano Presidente ordena a la Secretaria se proceda a pasar al segundo punto.

Leobardo Gómez González
Regidor 5º.





Ayuntamiento de Tihuatlán, Veracruz


2022-2025




SEGUNDO PUNTO: - La ciudadana **Mirta Idalia García García** Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional, da lectura a la propuesta del orden día en los términos de la convocatoria, sometiéndolo a consideración de este cuerpo edilicio, mismo que es **aprobado por Unanimidad de Votos.**


Presidente

TERCER PUNTO:- Corresponde al titular de la **Comisión de Obras Públicas**, el edil **José Norberto Aguirre Orellan**, dar el Informe de la obra pública realizada por parte de la Dirección en el periodo correspondiente al **mes de septiembre del año 2022**, para lo cual previamente se hizo circular documental, de los anexos **09H, 09V, 11 y 12**. Una vez aprobada se deberá presentar ante el Órgano de Fiscalización Superior en el Estado en donde se detallan los aspectos técnicos y financiero de las mismas, estando el **Ingeniero Erik Pérez Álvarez Director de Obras Públicas** presente en la sesión a fin de contestar los requerimientos u observaciones de parte de los integrantes del Honorable Cabildo.

D. G.

Sindica



Regidor 1º.

CUARTO PUNTO:- Habiendo concluido el informe de parte de la titular de la comisión respectiva, el ciudadano Presidente **Leobardo Gómez González**, solicita a los comparecientes manifiesten su conformidad para aprobar el informe de **Obra Pública** realizada en el mes de **septiembre del año 2022**, para que de ser así, se proceda a la presentación ante el Congreso del Estado y el Órgano de Fiscalización Superior en el Estado, los anexos **09H, 09V, 11 y 12**; derivado de ello se pone a consideración del Honorable Cabildo el punto en comento y se toma el siguiente:


Regidor 2º.

Regidor 3º.

ACUERDO: El Honorable Cabildo aprueba por **Unanimidad de Votos** el informe de **Obra Pública** del mes de **septiembre del año 2022**, de conformidad con los artículos **35** fracciones **VI, VII, 39, 40** fracción **VI, 50, 73 Ter. Fracción V** y demás relativos y aplicables de la **Ley Orgánica del Municipio Libre**. Hágase su remisión a la **Soberanía Legislativa, Órgano de Fiscalización Superior**. -Cúmplase.


Regidor 4º.

QUINTO PUNTO CLAUSURA. -El ciudadano **Leobardo Gómez González** Presidente Municipal pregunta a la ciudadana **Mirta Idalia García García** Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional, si existe algún otro punto a tratar, la cual responde que no. Por lo anterior se instruye se proceda a la elaboración del acta de cabildo correspondiente para que sea firmada al margen y al calce, se haga la remisión a la **Soberanía Legislativa**, se ha publicada en la página oficial de la **Unidad de Transparencia del Municipio de Tihuatlán, Veracruz**, y en su oportunidad sea fijada un extracto de la presente acta en el tablero de avisos de este H. Ayuntamiento


Regidor 5º.





Ayuntamiento de Tihuatlán, Veracruz 2022-2025



concluyéndose la misma el día de su inicio, en punto de las diecisiete horas con treinta minutos.
Doy fe. Cúmplase.


C. LEOBARDO GÓMEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

D. I. G.
ALDANA

C. LIC. LIDIA DE LEÓN GUTIÉRREZ
SÍNDICA ÚNICA

C. ING. JOSÉ NORBERTO AGUIRRE ORELLAN
REGIDOR PRIMERO

C. MÓNICA CLAUDIO CASADOS
REGIDORA SEGUNDA

C. LIC. BERNARDO ALDANA VAQUIER
REGIDOR TERCERO

C. LIC. NORMA EDITH HERRERA VIVEROS
REGIDORA CUARTA

C. RODRIGO CHÁVEZ HERNÁNDEZ
REGIDOR QUINTO


C. LIC. MIRTA IDALIA GARCÍA GARCÍA.
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.





Anexo al oficio No. EMO/2022/TIHUATLÁN/79616

| Número Obra | Descripción | Formato 09H | Formato 09V | Formato 11 | Formato 12 |
|---------------|--|-------------|-------------|------------|------------|
| 2022301750500 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL HACIA LAS PARCELAS EN LA LOCALIDAD TECOXTEMPA SEGUNDO, TIHUATLAN, VER. | Sí | No | Sí | No |
| 2022301750501 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y LINDERO DE LA LOCALIDAD DE LAS PIEDRAS, TIHUATLAN, VER. | Sí | No | Sí | No |
| 2022301750502 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CUAUHEMOC (PRIMERA ETAPA) DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, TIHUATLAN, VER. | No | Sí | Sí | No |
| 2022301750503 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y AGUSTIN DE ITURBIDE DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MIAHUAPAN, TIHUATLAN, VER. | Sí | No | Sí | No |
| 2022301750504 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES DE LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA (LOS MICOS), TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |
| 2022301750505 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE TUXPAN ENTRE LA CALLE NAUTLA Y CALLEJON DE LAS FLORES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL MECATEPEC, TIHUATLAN, VER. | Sí | No | Sí | No |

SELLO DIGITAL:

pmmqD5yblxImSHNbrl1Ve8uwAnRhn4hUcxMbpzoON61bTkNKl17nTkylWlt57iHWNHntUGEbrGh0RQ9JGf1aLtXf9+WCrnLTZdi9zBnNuJRYTWXCF/P5TIUNpfpb5n22RAaGsQl/aTaZgXTnugc18rXnsubMqOLOSNcG8mmBNo=



H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLÁN, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Municipio: | TIHUATLÁN | Localidad: | TECOXTEMPA SEGUNDO | Ejercicio fiscal: | EJERCICIO 2022 |
| No. de obra: | 2022301750500 | Periodo: | SEPTIEMBRE | Número de estimación: | N/A |
| Descripción: | REHABILITACION DE CAMINO RURAL HACIA LAS PARCELAS EN LA LOCALIDAD TECOXTEMPA SEGUNDO, TIHUATLAN, VER. | | | Fuente de financiamiento: | ORTAFIN 2016 (SENTENCIA) |
| | | | | Fecha de revisión: | 20/10/2022 |



Concepto de obra ejecutado:

Construcción de pavimento de concreto hidraulico de 18 CM de espesor de fc 250 Kg/cm2

Concepto de obra ejecutado:

Construcción de rampas de concreto hidráulico de 18 CM de espesor y 1.00m de ancho

Observaciones:

NINGUNA



ING. LUIS EDGAR RAMOS HERNANDEZ
Supervisor de obra Responsable

Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLÁN, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2022

| | |
|-----------------------|------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN: | 20/10/2022 |
| MES QUE SE REPORTA | SEPTIEMBRE |

| | | | |
|---------------------------------|---------------------------|---|--------------------|
| A) PLANEACION Y DATOS GENERALES | | | |
| MUNICIPIO: | TIHUATLÁN | LOCALIDAD: | TECOXTEMPA SEGUNDO |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | FORTAFIN 2016 (SENTENCIA) | No. DE OBRA: | 2022301750500 |
| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: | | REHABILITACION DE CAMINO RURAL HACIA LAS PARCELAS EN LA LOCALIDAD TECOXTEMPA SEGUNDO, TIHUATLAN, VER. | |

| | | | |
|------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| ANTECEDENTES: | | | |
| CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: | SI | X | NO |
| OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: | | | |
| TIPO DE ZONA: | RURAL | CLAVE AGE: | N/A |
| SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: | SI | NO | X |
| SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO | SI | X | NO |
| GRADO DE REZAGO SOCIAL: | | | |
| MUY ALTO | ALTO | MEDIO | BAJO X MUY BAJO |
| TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: | | | |
| DIRECTA | COMPLEMENTARIA | X | RESTRINGIDA |
| COORDENADAS DE GEORREFERENCIA | | | |
| LATITUD | 20.814387100 | LONGITUD | -97.505764700 |

| |
|---|
| DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA: |
| SE CONSTRUIRAN 759.90 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO CON UNA RESISTENCIA DE FC= 250 KG/CM2 EN RAMPAS DE 1.00 DE ANCHO Y 18 CM DE ESPESOR. |

| |
|--|
| DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES: |
| SE PRESENTA EL 100% DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA CON LA APERTURA DE CAJA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, COLOCACION DE BASE (CASACAJO) COMPACTADO AL 95% Y COLADO DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO. |

| C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA* | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|----------------|--------------|----------|---------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------|
| No. EST. | MONTO CON IVA | POLIZAS CHEQUE | | FACTURAS | | | | | |
| | | No. | MONTO | No. | IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACION | AMORTIZADO CON IVA | 5 MILLAR | CARGOS ADICIONALES | IMPORTE NETO |
| FINIQUITO | \$859,032.65 | 01 | \$597,620.12 | 020 | \$859,032.65 | \$257,709.80 | \$3,702.73 | \$0.00 | \$597,620.12 |
| TOTALES | \$859,032.65 | | \$597,620.12 | | \$859,032.65 | \$257,709.80 | \$3,702.73 | \$0.00 | \$597,620.12 |

| | | | |
|---|---------------------------------|-----------|-----------|
| MONTO AUTORIZADO: | \$859,945.58 | C/IVA | |
| MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: | \$859,945.58 | C/IVA | X |
| VALIDACIÓN DEL PROYECTO: | EXISTE | NO EXISTE | NO APLICA |
| DEPENDENCIA QUE VALIDA: | | | |
| FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: | EXISTE X | NO EXISTE | NO APLICA |
| DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: | H. AYUNTAMIENTO TIHUATLAN, VER. | | |
| PERMISOS Y CONCESIONES: | EXISTE X | NO EXISTE | NO APLICA |
| DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS: | H. AYUNTAMIENTO TIHUATLAN, VER. | | |
| TIPO DE LICITACIÓN: | ADJUDICACIÓN DIRECTA | EXISTE | X |
| | INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS | | |
| | LICITACIÓN PÚBLICA | | |

| | | | |
|-----------------------|---|--------------|-------------------|
| NO. DE CONTRATO: | IMI-AD-FORTAFIN(SENTENCIA)/2022/30/175/0500 | FECHA: | 31/05/2022 |
| CONTRATISTA: | CARLOS OLMOS OLARTE | | |
| RFC: | OOOC7709098R0 | | |
| MONTO CONTRATADO: | \$859,032.65 | C/IVA | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | PROGRAMADA | REAL | |
| | INICIO | 01/04/2022 | 01/06/2022 |
| | TÉRMINO | 15/12/2022 | 30/06/2022 |
| | DÍAS | 259 | 30 |
| ANTICIPO: | APLICA | X | NO APLICA |
| | MONTO: | \$257,709.79 | PORCENTAJE: 30.00 |
| | FECHA DE PAGO: | 05/06/2022 | |

| | | |
|-------------------------|--------------|------------|
| B) REPORTE | | |
| | EXISTE | FECHAS |
| MONTO PAGADO EN EL MES: | \$0.00 | |
| MONTO PAGADO ACUMULADO: | \$859,032.65 | 30/09/2022 |
| FINIQUITO CON IVA: | \$859,032.65 | 20/07/2022 |
| ACTA ENTREGA RECEPCIÓN: | X | 02/07/2022 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| AVANCE FISICO REAL | | | | | | | | | | | | |
| AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| ATRASO (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| TIPO DE FIANZA: | ANTICIPO | CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS |
| MONTO AFIANZADO: | \$257,709.79 | \$74,054.53 | \$85,903.00 |
| AFIANZADORA: | SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A | SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A | SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A |
| No. DE FIANZA: | 2673795 | 2673813 | 2673814 |
| FECHA: | 31/05/2022 | 31/05/2022 | 01/07/2022 |
| CONVENIO MODIFICATORIO: | MONTO | EXISTE | IMPORTE/PERIODO |
| | PLAZO | | FECHA |
| | NO APLICA | X | |
| MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: | \$859,032.65 | C/IVA | |

OBSERVACIONES:

NINGUNA



Ing. Erik Pérez Álvarez
DIRECTOR DE OBRAS

ING. LUIS EBEN RAMOS HERNANDEZ
SUPERVISOR

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLÁN, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

| | | |
|---|-------------------------------|---|
| Municipio: TIHUATLÁN | Localidad: LAS PIEDRAS | Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2022 |
| No. de obra: 2022301750501 | Periodo: SEPTIEMBRE | Número de estimación: N/A |
| Descripción: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y LINDERO DE LA LOCALIDAD DE LAS PIEDRAS, TIHUATLAN, | | Fuente de financiamiento: ORTAFIN 2016 (SENTENCIA) |
| | | Fecha de revisión: 20/10/2022 |



Concepto de obra ejecutado: Construcción de pavimento de concreto hidráulico fc de 250 Kg/cm2 de 18 CM de espesor, acabado texturizado.

Concepto de obra ejecutado: Pintura en guarniciones existentes, color amarillo tráfico

Observaciones:
NINGUNA



ING. LUIS EDGAR RAMOS HERNANDEZ
Supervisor de obra Responsable

Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLAN, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2022

| | |
|-----------------------|------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN: | 20/10/2022 |
| MES QUE SE REPORTA | SEPTIEMBRE |

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

| | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------------------|--|
| MUNICIPIO: | TIHUATLÁN | LOCALIDAD: | LAS PIEDRAS | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y LINDERO DE LA LOCALIDAD DE LAS PIEDRAS, TIHUATLAN, VER. |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | FORTAFIN2016 (SENTENCIA) | No. DE OBRA: | 2022301750501 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|------------|---------------|----|---|--|--|--|--|
| CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: | | SI | X | NO | | | | | |
| OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: | | | | | | | | | |
| TIPO DE ZONA: | RURAL URBANA | CLAVE AGE: | N/A | | | | | | |
| SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: | | SI | | NO | X | | | | |
| SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO | | SI | X | NO | | | | | |
| COORDENADAS DE GEORREFERENCIA | | | | | | | | | |
| LATITUD | 20.723741900 | LONGITUD | -97.493482700 | | | | | | |

| | |
|---|--|
| DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA: | SE CONSTRUIRAN 420.60 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO FC= 250 KG/CM2 DE 18 CM DE ESPESOR. |
|---|--|

| | |
|---|---|
| DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES: | LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA Y APTA PARA SER OPERADA. |
|---|---|

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

| No. EST. | MONTO CON IVA | PÓLIZAS CHEQUE | | No. | MONTO | No. | SEPARTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN | AMORTIZADO CON IVA | 5 MILLAR | CARGOS ADICIONALES | IMPORTE NETO |
|-------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|-----|---------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------|
| | | No. | MONTO | | | | | | | | |
| FINIQUITO | \$128,904.67 | 655091 | \$89,677.65 | 01 | \$128,904.67 | | \$38,671.40 | \$555.62 | \$0.00 | \$89,677.65 | |
| (UNO) NORMA | \$406,015.24 | 0672 | \$404,265.17 | 810A | \$406,015.24 | | \$0.00 | \$1,750.07 | \$0.00 | \$404,265.17 | |
| TOTALES | \$534,919.91 | | \$493,942.82 | | \$534,919.91 | | \$38,671.40 | \$2,305.69 | \$0.00 | \$493,942.82 | |

| | | | |
|---|----------------------------------|-----------|-----------|
| MONTO AUTORIZADO: | \$551,684.92 | C/IVA | |
| MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: | \$534,915.35 | C/IVA | X |
| VALIDACIÓN DEL PROYECTO: | EXISTE | NO EXISTE | NO APLICA |
| DEPENDENCIA QUE VALIDA: | | | |
| FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: | EXISTE | X | NO EXISTE |
| DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: | H. AYUNTAMIENTO, TIHUATLAN, VER. | | |
| PERMISOS Y CONCESIONES: | EXISTE | X | NO EXISTE |
| DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS: | H. AYUNTAMIENTO, TIHUATLAN, VER. | | |
| TIPO DE LICITACIÓN: | ADJUDICACIÓN DIRECTA | EXISTE | X |
| | INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS | | |
| | LICITACIÓN PÚBLICA | | |

| | | | |
|-----------------------|--|--------------|-------------------|
| NO. DE CONTRATO: | AD-FORTAFIN-2016(SENTENCIA)/2022//30/175/(FECHA: 26/04/2022 | | |
| CONTRATISTA: | GUILLERMO HERNANDEZ CAMACHO | | |
| RFC: | HECG690427P18 | | |
| MONTO CONTRATADO: | \$534,919.00 C/IVA | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | PROGRAMADA | REAL | |
| | INICIO | 27/04/2022 | 27/04/2022 |
| | TERMINO | 10/06/2022 | 10/06/2022 |
| | DÍAS | 45 | |
| ANTICIPO: | APLICA | X | NO APLICA |
| | MONTO: | \$160,475.69 | PORCENTAJE: 30.00 |
| | FECHA DE PAGO: | | 01/05/2022 |

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| B) REPORTE | |
| EXISTE | FECHAS |
| MONTO PAGADO EN EL MES: | \$0.00 |
| MONTO PAGADO ACUMULADO: | \$534,919.91 30/09/2022 |
| FINIQUITO CON IVA: | \$534,919.91 05/07/2022 |
| ACTA ENTREGA RECEPCIÓN: | X 12/06/2022 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| AVANCE FÍSICO REAL | | | | | | | | | | | | |
| AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 5 | 75 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REAL | 0 | 0 | 0 | 5 | 80 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 5 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| ATRASO (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| TIPO DE FIANZA: | ANTICIPO | CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS |
| MONTO AFIANZADO: | \$160,475.97 | \$46,113.79 | \$53,491.99 |
| AFIANZADORA: | DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. | DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. | DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. |
| No. DE FIANZA: | 1599222 | 1599228 | 1599227 |
| FECHA: | 26/04/2022 | 26/04/2022 | 10/06/2022 |
| CONVENIO MODIFICATORIO: | EXISTE | IMPORTE/PERIODO | FECHA |
| | MONTO | | |
| | PLAZO | INICIAL | FINAL |
| | NO APLICA | X | |
| MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: | \$534,919.00 | C/IVA | |

OBSERVACIONES:

LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA.



Ing. Erik Pérez Álvarez
DIRECTOR DE OBRAS

ING. LUIS EDUARDO RAMOS HERNANDEZ
SUPERVISOR

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLÁN, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)

DATOS GENERALES

Municipio: TIHUATLÁN Localidad: BENITO JUÁREZ (CUAUHTÉMOC) Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2022
 No. de obra: 2022301750502 Período: SEPTIEMBRE Número de estimación: N/A
 Descripción: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CUAUHTEMOC (PRIMERA ETAPA) DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, TIHUATLAN, VER. Fuente de Financiamiento: ORTAFIN 2016 (SENTENCIA) Fecha de revisión: 21/10/2022



Concepto de obra ejecutado:

Obra terminada

Concepto de obra ejecutado:

Pavimento concluido

Observaciones:

OBRA TERMINADA



ING. CESAR AUGUSTO GUZMAN ESPINOSA

Supervisor de Obra Responsable

INGENIERO
Profesión

c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLAN, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2022

| | |
|-----------------------|------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN: | 21/10/2022 |
| MES QUE SE REPORTA | SEPTIEMBRE |

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

| | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|---|
| MUNICIPIO: | TIHUATLAN | LOCALIDAD: | BENITO JUAREZ (CUAUHTEMOC) | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CUAUHTEMOC (PRIMERA ETAPA) DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, TIHUATLAN, VER. |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | FONDO DE FORTALECIMIENTO | No. DE OBRA: | 2022301750502 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-------------|---------------|------------------------------------|----------------|-------|-------------|------|----------|
| CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: | | SI | X | NO | | | | | |
| OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: | | | | | | | | | |
| TIPO DE ZONA: | RURAL URBANA | CLAVE AGEB: | N/A | GRADO DE REZAGO SOCIAL: | | | | | |
| SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: | | SI | NO | MUY ALTO | ALTO | MEDIO | X | BAJO | MUY BAJO |
| SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO | | SI | NO | TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: | | | | | |
| | | SI | NO | DIRECTA | COMPLEMENTARIA | X | RESTRINGIDA | | |
| COORDENADAS DE GEORREFERENCIA | | | | | | | | | |
| LATITUD | 20.535445100 | LONGITUD | -97.569764800 | | | | | | |

| | |
|---|---|
| DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA: | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CUAUHTEMOC (PRIMER ETAPA) EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ, TIHUATLAN, VER. |
|---|---|

| | |
|---|----------------------|
| DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES: | PAVIMENTO CONCLUIDO. |
|---|----------------------|

| No. EST. | MONTO CON IVA | PÓLIZAS CHEQUE | | No. | IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN | AMORTIZADO CON IVA | FACTURAS | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|-----|---------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|----------------|
| | | No. | MONTO | | | | 5 MILLAR | CARGOS ADICIONALES | IMPORTE NETO |
| 1 (UNO) NORMAL | \$1,114,961.00 | 1 | \$775,667.00 | A3 | \$1,114,961.00 | \$0.00 | \$4,805.87 | \$0.00 | \$1,110,155.13 |
| 2(DOS) FINIQUITO | \$437,693.00 | 1 | \$304,498.00 | A | \$437,693.00 | \$0.00 | \$1,886.61 | \$0.00 | \$435,806.39 |
| TOTALES | \$1,552,654.00 | | \$1,080,165.00 | | \$1,552,654.00 | \$0.00 | \$6,692.48 | \$0.00 | \$1,545,961.52 |

| | | |
|---|---|-------------|
| MONTO AUTORIZADO: | \$1,553,531.90 | C/IVA |
| MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: | \$1,553,531.00 | C/IVA |
| VALIDACIÓN DEL PROYECTO: | EXISTE X NO EXISTE | NO APLICA |
| DEPENDENCIA QUE VALIDA: | H. AYUNTAMIENTO | |
| FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: | EXISTE X NO EXISTE | NO APLICA |
| DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: | H. AYUNTAMIENTO | |
| PERMISOS Y CONCESIONES: | EXISTE X NO EXISTE | NO APLICA |
| DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS: | H. AYUNTAMIENTO | |
| TIPO DE LICITACIÓN: | ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA | EXISTE X |

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------|------------|-------------|
| NO. DE CONTRATO: | MTI-IR-FORTAFIN-2016(SENTENCIA) | FECHA: | 20/04/2022 |
| CONTRATISTA: | MARIA MERCEDES GARCIA PEREZ | | |
| RFC: | GAPM900915BR6 | | |
| MONTO CONTRATADO: | \$1,552,655.00 | C/IVA | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | PROGRAMADA | REAL | |
| | INICIO | 01/04/2022 | 21/04/2022 |
| | TÉRMINO | 15/12/2022 | 05/07/2022 |
| | DÍAS | 259 | 76 |
| ANTICIPO: | APLICA | X | NO APLICA |
| | MONTO: | | PORCENTAJE: |
| | FECHA DE PAGO: | | |

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| B) REPORTE | |
| | EXISTE FECHAS |
| MONTO PAGADO EN EL MES: | \$0.00 |
| MONTO PAGADO ACUMULADO: | \$1,552,654.00 |
| FINIQUITO CON IVA: | \$1,552,654.00 18/08/2022 |
| ACTA ENTREGA RECEPCIÓN: | X 18/07/2022 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| AVANCE FISICO REAL | | | | | | | | | | | | |
| AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 97 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| ATRASO (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|----------------|-----------------|--------------|
| TIPO DE FIANZA: | ANTICIPO | CUMPLIMIENTO | VIOS OCULTOS |
| MONTO AFIANZADO: | \$465,796.00 | \$133,849.00 | \$155,265.00 |
| AFIANZADORA: | DORAMA | DORAMA | DORAMA |
| No. DE FIANZA: | 1598991 | 1599003 | 1643018 |
| FECHA: | 21/04/2022 | 21/04/2022 | 30/07/2022 |
| CONVENIO MODIFICATORIO: | EXISTE | IMPORTE/PERIODO | FECHA |
| | NO APLICAN | | |
| MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO MODIFICATORIO + MONTO CONTRATADO) DE OBRA: | \$1,552,655.00 | | C/IVA |

| | |
|----------------|-----------------|
| OBSERVACIONES: | OBRA CONCLUIDA. |
|----------------|-----------------|

Ing. Civil Erik Pérez Álvarez DIRECTOR DE OBRAS
Ing. CESAR AUGUSTO GUZMAN ESPINOSA SUPERVISOR

FORMATO 11

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.




H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLÁN, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Municipio: | TIHUATLÁN | Localidad: | SAN PEDRO MIAHUAPAN | Ejercicio fiscal: | EJERCICIO 2022 |
| No. de obra: | 2022301750503 | Periodo: | SEPTIEMBRE | Número de estimación: | 1 (UNO) FINIQUITO |
| Descripción: | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y AGUSTIN DE ITURBIDE DE LA LOCALIDAD DE | | | Fuente de financiamiento: | ORTAFIN 2016 (SENTENCIA) |
| | | | | Fecha de revisión: | 24/10/2022 |

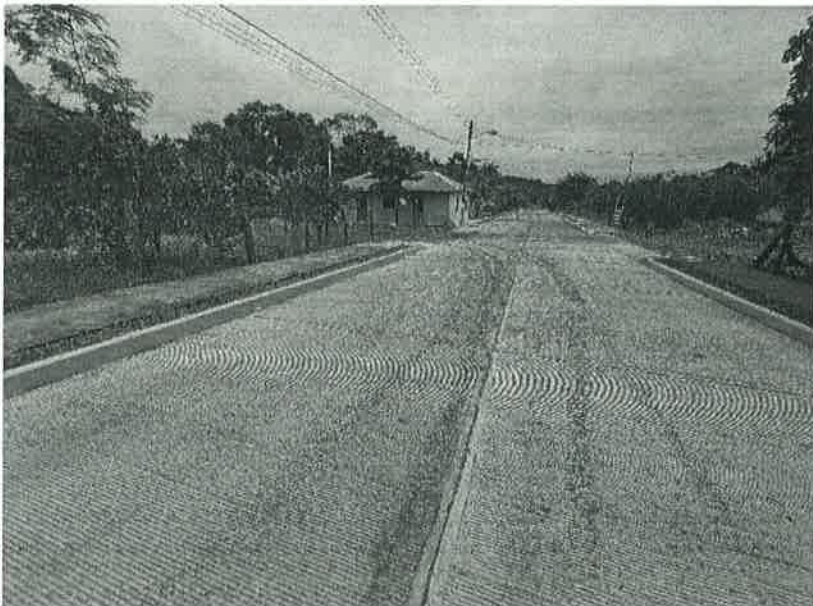

Concepto de obra ejecutado:

Pavimento

Concepto de obra ejecutado:

Pavimento

Observaciones:

LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA



JESUS ALEJANDRO GONZALEZ BONILLA
Supervisor de obra Responsable

SUPERVISOR DE OBRA
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLAN, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2022

| | |
|-----------------------|------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN: | 24/10/2022 |
| MES QUE SE REPORTA | SEPTIEMBRE |

| A) PLANEACION Y DATOS GENERALES | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--|----------------|-------|-------------|------|
| MUNICIPIO: | TIHUATLAN | LOCALIDAD: | SAN PEDRO MIAHUAPAN | | | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | FORTAFIN | No. DE OBRA: | 2022301750503 | | | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y AGUSTIN DE ITURBIDE DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MIAHUAPAN, TIHUATLAN, VER. | | | | |
| Cuenta con Proyecto Ejecutivo: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: GRADO DE REZAGO SOCIAL: | | | | | | | | | | |
| TIPO DE ZONA: | RURAL | CLAVE AGEB: | N/A | | | MUY ALTO | ALTO | MEDIO | X | BAJO |
| SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: | URBANA | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input checked="" type="checkbox"/> | TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: | | | | |
| SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO | | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> | DIRECTA | COMPLEMENTARIA | X | RESTRINGIDA | |
| COORDENADAS DE GEORREFERENCIA | | | | | | | | | | |
| LATITUD | 0.000000000 | | LONGITUD | 0.000000000 | | | | | | |

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
construccion de pavimento hidráulico de resistencia 250kg/cm2 con un agregado max de 40mm, sobre una base de material de banco (cascajo)

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
la obra se encuentra terminada

| C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA* | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|----------------|
| No. EST. | MONTO CON IVA | PÓLIZAS CHEQUE | | FACTURAS | | | | | |
| | | No. | MONTO | No. | IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN | AMORTIZADO CON IVA | 5 MILLAR | CARGOS ADICIONALES | IMPORTE NETO |
| 1 (UNO) FINIQUITO | \$1,437,554.45 | Y189 | \$1,431,538.09 | 4009 | \$1,437,554.45 | \$0.00 | \$6,196.36 | \$0.00 | \$1,431,358.09 |
| TOTALES | \$1,437,554.45 | | \$1,431,538.09 | | \$1,437,554.45 | \$0.00 | \$6,196.36 | \$0.00 | \$1,431,358.09 |

| | | | |
|---|---|---|------------|
| MONTO AUTORIZADO: | \$1,437,554.45 | C/IVA | |
| MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: | \$1,437,917.66 | C/IVA | |
| VALIDACIÓN DEL PROYECTO: | EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input checked="" type="checkbox"/> NO APLICA <input type="checkbox"/> | | |
| DEPENDENCIA QUE VALIDA: | | | |
| FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: | EXISTE <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input type="checkbox"/> | | |
| DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: | AYUNTAMIENTO | | |
| PERMISOS Y CONCESIONES: | EXISTE <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input type="checkbox"/> | | |
| DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS: | AYUNTAMIENTO | | |
| TIPO DE LICITACIÓN: | ADJUDICACIÓN DIRECTA <input type="checkbox"/> INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS <input type="checkbox"/> LICITACIÓN PÚBLICA <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| NO. DE CONTRATO: | ME/08-FORTAFIN-2018-REFERENCIAL/2022/01/175/0501 | FECHA: | |
| CONTRATISTA: | JOSE RODRIGO HERRERA MEZQUIDA | | |
| RFC: | HEMR8609152ZO | | |
| MONTO CONTRATADO: | \$1,437,554.45 | C/IVA | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | PROGRAMADA | REAL | |
| | INICIO | 28/03/2022 | 04/07/2022 |
| | TERMINO | 28/03/2022 | 31/07/2022 |
| ANTICIPO: | DIAS | 1 | 28 |
| | APLICA | NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/> | X |
| MONTO: | | PORCENTAJE: | |
| FECHA DE PAGO: | | | |

| B) REPORTE | | |
|-------------------------|----------------|------------|
| | EXISTE | FECHAS |
| MONTO PAGADO EN EL MES: | \$1,437,554.45 | 01/09/2022 |
| MONTO PAGADO ACUMULADO: | \$1,437,554.45 | 01/09/2022 |
| FINIQUITO CON IVA: | \$1,437,554.45 | 01/09/2022 |
| ACTA ENTREGA RECEPCIÓN: | | |

| AVANCE FISICO REAL | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| ATRASO (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|-----------|-------------------------|------------------------|
| TIPO DE FIANZA: | ANTICIPO | CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS |
| MONTO AFIANZADO: | | \$123,927.00 | \$143,755.00 |
| AFIANZADORA: | | ASEGURADORA INSURGENTES | ASEGURADORA USURGENTES |
| No. DE FIANZA: | | 1451734 | 1451780 |
| FECHA: | | 02/07/2022 | 08/08/2022 |
| CONVENIO MODIFICATORIO: | MONTO | EXISTE | IMPORTE/PERIODO |
| | PLAZO | | INICIAL |
| | NO APLICA | X | FINAL |
| MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO DE OBRA): | | \$1,437,554.45 | C/IVA |

OBSERVACIONES:



Ing. Clotilde Perez Alvarez
DIRECTOR DE OBRAS

ING. JESUS ALEXANDRO GONZALEZ BONILLA
SUPERVISOR

FORMATO 11

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.




H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLÁN, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)


DATOS GENERALES

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Municipio: | TIHUATLÁN | Localidad: | MIGUEL MECATEPEC (MANANTI) | Ejercicio fiscal: | EJERCICIO 2022 |
| No. de obra: | 2022301750505 | Periodo: | SEPTIEMBRE | Número de estimación: | 1 (UNO) FINIQUITO |
| Descripción: | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE TUXPAN ENTRE LA CALLE NAUTLA Y CALLEJON DE LAS FLORES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL MECATEPEC, | | | Fuente de financiamiento: | ORTAFIN 2016 (SENTENCIA) |
| | | | | Fecha de revisión: | 24/10/2022 |

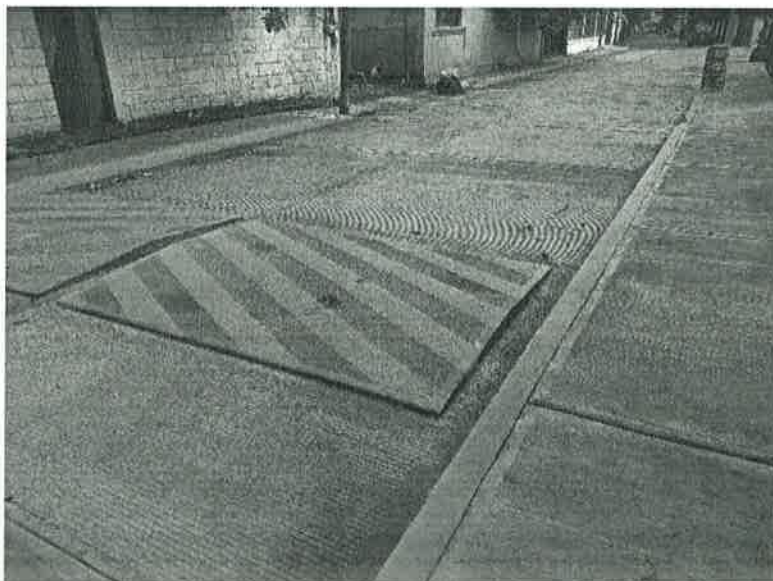

Concepto de obra ejecutado:

Aplicación de pintura en guarniciones.

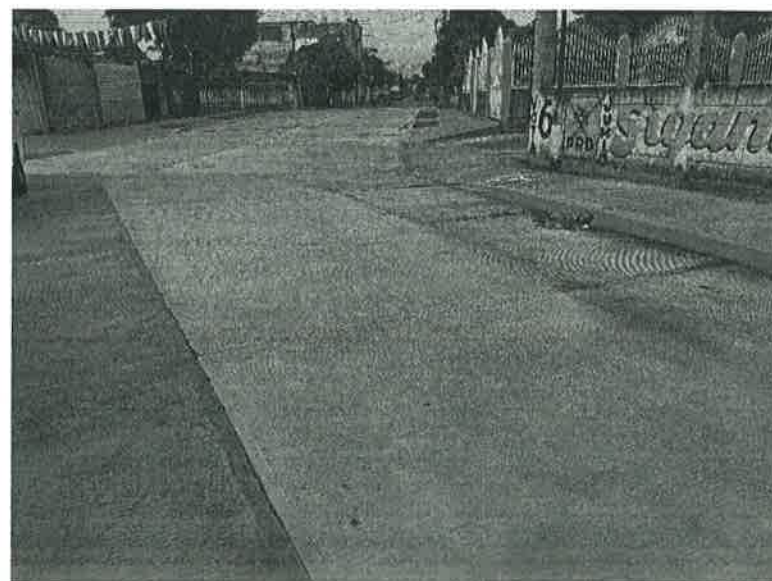

Concepto de obra ejecutado:

Limpieza final de la calle.

Observaciones:

Empty box for observations.



ING. LUIS RICARDO LÓPEZ PÉREZ
Supervisor de obra Responsable

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLAN, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2022

| | |
|------------------------------|------------|
| FECHA DE ELABORACION: | 24/10/2022 |
| MES QUE SE REPORTA | SEPTIEMBRE |

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

| | | |
|--|--|--|
| MUNICIPIO: TIHUATLAN | LOCALIDAD: SAN MIGUEL MECATEPEC (MANANTIAL) | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE TUXPAN ENTRE LA CALLE NAUTLA Y CALLEJON DE LAS FLORES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL MECATEPEC, |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAFIN-2016 (SENTENCIA) | No. DE OBRA: 2022301750505 | |

| | | | | |
|---|-----------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: | | SI | X | NO |
| ANTECEDENTES: | | | | |
| OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: | | GRADO DE REZAGO SOCIAL: | | |
| TIPO DE ZONA: | RURAL URBANA | CLAVE AGEB: | N/A | MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO X |
| SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: | SI | NO | X | |
| SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO | SI | X | NO | |
| TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: | | | | |
| DIRECTA COMPLEMENTARIA X RESTRINGIDA | | | | |
| COORDENADAS DE GEORREFERENCIA | | | | |
| LATITUD | 20.529000300 | LONGITUD | -97.484285300 | |

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
SE REALIZARA LA CONTRUCCION DEL PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE TUXPAN DE LA COMUNIDAD SAN MIGUEL MECATEPEC, CONSIDERANDO CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2 Y PAVIMENTO A BASE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 250 KG/CM2.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
SE REALIZA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 18 CM DE ESPESOR ASI MISMO Y APLICACION DE PINTURA.

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

| No. EST. | MONTO CON IVA | PÓLIZAS CHEQUE | | FACTURAS | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|----------------|
| | | No. | MONTO | No. | IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN | AMORTIZADO CON IVA | 5 MILLAR | CARGOS ADICIONALES | IMPORTE NETO |
| 1 (UNO) FINIQUITO | \$1,368,642.16 | D257 | \$1,362,742.84 | D7CC | \$1,368,642.16 | \$0.00 | \$5,899.32 | \$0.00 | \$1,362,742.84 |
| TOTALES | \$1,368,642.16 | | \$1,362,742.84 | | \$1,368,642.16 | \$0.00 | \$5,899.32 | \$0.00 | \$1,362,742.84 |

| | | | | |
|--|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| MONTO AUTORIZADO: | \$1,260,680.51 | C/IVA | | |
| MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: | \$1,368,750.02 | C/IVA | | |
| VALIDACIÓN DEL PROYECTO: | EXISTE | NO EXISTE | NO APLICA | X |
| DEPENDENCIA QUE VALIDA: | | | | |
| FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: | EXISTE | X | NO EXISTE | NO APLICA |
| DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: | AYUNTAMIENTO | | | |
| PERMISOS Y CONCESIONES: | EXISTE | X | NO EXISTE | NO APLICA |
| DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS: | AYUNTAMIENTO | | | |
| TIPO DE LICITACIÓN: | ADJUDICACIÓN DIRECTA | EXISTE | | |
| | INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS | X | | |
| | LICITACIÓN PÚBLICA | | | |

| | | | |
|------------------------------|----------------------------------|---------------|------------|
| NO. DE CONTRATO: | ORTAFIN-2016(SENTENCIA)/2022/30/ | FECHA: | 01/07/2022 |
| CONTRATISTA: | MARIA MAGDALENA FERNANDEZ ROJAS | | |
| RFC: | FERM761211F38 | | |
| MONTO CONTRATADO: | \$1,368,642.16 | C/IVA | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | PROGRAMADA | REAL | |
| | INICIO | 01/04/2022 | 04/07/2022 |
| | TÉRMINO | 15/12/2022 | 02/09/2022 |
| | DÍAS | 258 | 61 |
| ANTICIPO: | APLICA | NO APLICA | X |
| | MONTO: | PORCENTAJE: | |
| | FECHA DE PAGO: | | |

B) REPORTE

| | EXISTE | FECHAS |
|--------------------------------|----------------|------------|
| MONTO PAGADO EN EL MES: | \$1,368,642.16 | 29/09/2022 |
| MONTO PAGADO ACUMULADO: | \$1,368,642.16 | 29/09/2022 |
| FINIQUITO CON IVA: | \$1,368,642.16 | 29/09/2022 |
| ACTA ENTREGA RECEPCIÓN: | | |

AVANCE FÍSICO REAL

| AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 95 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| ATRASO (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

OBSERVACIONES:

| | | | | |
|--------------------------------|--|--|-----------------------|-------|
| TIPO DE FIANZA: | ANTICIPO | CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS | |
| MONTO AFIANZADO: | | \$117,986.39 | \$136,864.22 | |
| AFIANZADORA: | | TOKIO MARINE HCCS A. DE CV TOKIO MARINE HCC S.A. DE CV | | |
| No. DE FIANZA: | | 47641 | 49941 | |
| FECHA: | | 01/07/2022 | 02/07/2022 | |
| CONVENIO MODIFICATORIO: | MONTO | EXISTE | IMPORTE/PERIODO | FECHA |
| | PLAZO | | INICIAL | FINAL |
| | NO APLICA | X | | |
| | MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: | \$1,368,642.16 | C/IVA | |

Ing. Civil Erik Pérez Álvarez
DIRECTOR DE OBRAS

ING. LUIS RICARDO LÓPEZ PÉREZ
SUPERVISOR

FORMATO 11

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.
