




Ayuntamiento de Tehuatlán, Veracruz

2022-2025



SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL AÑO 2023

En el Municipio de Tehuatlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las quince horas del día **jueves veinte del mes de julio del año dos mil veintitrés**, reunidos en la sala de Cabildo del Palacio Municipal para llevar a efecto Sesión de Cabildo correspondiente a la Administración Pública Municipal 2022-2025, con fundamento en lo dispuesto por los artículos **28, 29, 30, 32, 36 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre**, se lleva a efecto la **Sesión de Cabildo EXTRAORDINARIA**, del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tehuatlán, la cual se integra con la presencia de los ciudadanos, **Leobardo Gómez González**, en su carácter de Presidente Municipal; **Licenciada Lidia de León Gutiérrez**, en su carácter de Sindica Única; **M.V.Z. José Norberto Aguirre Orellan**, Regidor Primero; **C. Mónica Claudio Casados**, Regidora Segunda; **Licenciado Bernardo Aldana Vaquier**, Regidor Tercero; **Licenciada Norma Edith Herrera Viveros**, Regidora Cuarta y **C. Rodrigo Chávez Hernández**, Regidor Quinto, asistidos por la ciudadana **Lic. Mirta Idalia García García**, Secretaria del H. Ayuntamiento quien da fe; a fin de efectuar la sesión de Cabildo en base al siguiente: - - - - -

Residente

Sindica

Regidor 1º.

Regidor 2º.

- **ORDEN DEL DÍA:**
- 1.- Lista de asistencia y en su caso declaración de Quórum Legal.
 - 2.- Aprobación del orden del día.
 - 3.- Informe de parte de la Comisión de Obras Públicas y Comunicaciones, referente a la Obra Pública realizada por parte de la Dirección en el periodo correspondiente al mes de junio del año 2023.
 - 4.- Propuesta para la aprobación del informe de Obra pública realizada en el mes de junio del año 2023, para la presentación ante el Congreso del Estado y el Órgano de Fiscalización Superior en el Estado.
 - 5.- Clausura.

Regidor 3º.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA.

PRIMER PUNTO: - Lista de asistencia y en su caso declaración de Quorum Legal. El Ciudadano **Leobardo Gómez González** Presidente Municipal Constitucional instruye a la Ciudadana Licenciada **Mirta Idalia García García** Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional, a fin de realizar pase de lista de asistencia dando cuenta que se encuentran presentes la totalidad de ediles, por lo que se decreta el **Quórum Legal** para sesionar, en términos del artículo 29 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y en consecuencia se **abre** oficialmente la Sesión de Cabildo; por lo que los acuerdos que se tomen serán válidos y obligan a su cumplimiento; el Ciudadano Presidente ordena a la Secretaria se proceda a **acabar** el segundo punto.

Regidor 5º.


Regidora 1ª.

Información No reservada de acuerdo a la Ley de Transparencia.



Ayuntamiento de Tihuatlán, Veracruz

2022-2025



SEGUNDO PUNTO: - La ciudadana Licenciada **Mirta Idalia García García** Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional, **da lectura a la propuesta del orden día en los términos de la convocatoria, sometiéndolo a consideración de este Cuerpo Edilicio, por lo que se les piden levanten la mano de manera general para la emisión de su voto, y una vez contados los votos se hace mención que se obtuvieron 6 a favor y un voto en contra emitido por el C. Lic. Bernardo Aldana Vaquier Regidor Tercero por lo que es aprobado por Mayoría de los presentes, el orden del día**

Presidente

Sindica

TERCER PUNTO: Corresponde al titular de la **Comisión de Obras Públicas, el edil José Norberto Aguirre Orellan**, dar el Informe de la obra pública realizada por parte de la Dirección en el periodo correspondiente **al mes de junio del año 2023**, para lo cual previamente se hizo circular documental, **de los anexos 09H, 09V, 11 y 12**. Una vez aprobada se deberá presentar ante el Órgano de Fiscalización Superior en el Estado en donde se detallan los aspectos técnicos y financiero de las mismas, estando el **Ingeniero Erik Pérez Álvarez Director de Obras Públicas** presente en la sesión a fin de contestar los requerimientos u observaciones de parte de los integrantes del Honorable Cabildo.-.....

Regidor 1º.

Regidor 2º.


CUARTO PUNTO:- Habiendo concluido el informe de parte de la titular de la comisión respectiva, el ciudadano Presidente **Leobardo Gómez González**, solicita a **los comparecientes manifiesten su conformidad para aprobar el informe de Obra Pública** realizada en el mes de **junio del año 2023**, para que de ser así, se proceda a la presentación ante el Congreso del Estado y el Órgano de Fiscalización Superior en el Estado, los anexos **09H, 09V, 11 y 12**; derivado de ello se pone a consideración del Honorable Cabildo el punto en comentario y se toma el siguiente:

Regidor 3º.

Regidor 4º.

ACUERDO: Se procede a recabar la votación correspondiente por lo que los integrantes del Honorable Cabildo aprueban por **Mayoría de Votos dicho punto**, en virtud de que se obtuvieron 6 votos a favor y uno en contra, emitido por el C. Lic. **Bernardo Aldana Vaquier**. por lo que se **acuerda el informe de Obra Pública del mes de junio del año 2023, de conformidad con los artículos 35 fracciones VI, VII, 39, 40 fracción VI, 50, 73 Ter. Fracción V y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre. Hágase su remisión a la Soberanía Legislativa, Órgano Fiscalización Superior. -Cúmplase.**


Regidor 5º.



QUINTO PUNTO CLAUSURA. -El ciudadano **Leobardo Gómez González** Presidente pregunta a la ciudadana Licenciada **Mirta Idalia García García** Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional, si existe algún otro punto a tratar, la cual responde que no. Por lo anterior se




Ayuntamiento de Tihuatlán, Veracruz 2022-2025



instruye se proceda a la elaboración del acta de cabildo correspondiente para que sea firmada al margen y al calce, se haga la remisión a la Soberanía Legislativa, se ha publicada en la página oficial de la Unidad de Transparencia del Municipio de Tihuatlán, Veracruz, y en su oportunidad sea fijada un extracto de la presente acta en el tablero de avisos de este H. Ayuntamiento, concluyéndose la misma el día de su inicio, en punto de las diecisiete horas con cero minutos. Doy fe. Cúmplase.


C. LEOBARDO GÓMEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. LIC. LIDIA DE LEÓN GUTIÉRREZ
SÍNDICA ÚNICA

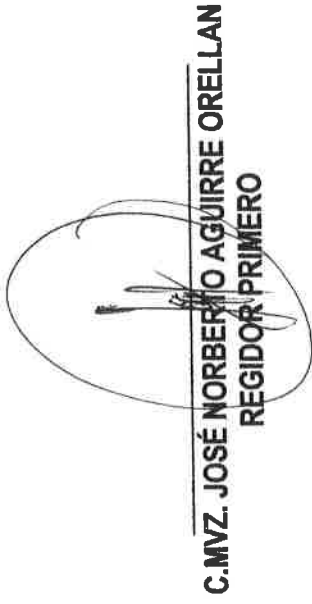
C. MVZ. JOSÉ NORBERTO AGUIRRE ORELLAN
REGIDOR PRIMERO



C. MÓNICA CLAUDIO CASADOS
REGIDORA SEGUNDA

C. LIC. BERNARDO ALDANA VAQUIER
REGIDOR TERCERO


C. LIC. NORMA EDITH HERRERA VIVEROS
REGIDORA CUARTA


C. RODRIGO CHAVEZ HERNÁNDEZ
REGIDOR QUINTO




C. LIC. MIRTA IDALIA GARCÍA GARCÍA.
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.



Anexo al oficio No. EMO/2023/TIHUATLÁN/87005

| Número Obra | Descripción | Formato 09H | Formato 09V | Formato 11 | Formato 12 |
|---------------|--|-------------|-------------|------------|------------|
| 2023301750001 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA DE LA LOCALIDAD TOTOLAPA, SECTOR 5, TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |
| 2023301750002 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD LAS PALMAS, TIHUATLAN VER. | No | No | No | No |
| 2023301750003 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD ENRIQUE RODRIGUEZ CANO (ZAPOTALILLO), TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |
| 2023301750004 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE XALAPA Y MISANTLA DE LA LOCALIDAD DE TOTOLAPA, SECTOR 4, TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |
| 2023301750005 | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DE GUADALUPE DE LA LOCALIDAD ZACATE COLORADO, TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |
| 2023301750006 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA ENTUBADA EN LA CALLE VERACRUZ DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA (LA BOMBA), TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |
| 2023301750007 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE RAFAEL HERNANDEZ OCHOA DE LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA (LA BOMBA) TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |



SELLO DIGITAL:

ZhdP+ExgyrfabBYfVkuP0Bz1e4Yrb0ebRKYikNDa6k/xLPev8X85Q/OP5inHjMS045IusjwoKtn7OKnM8I3os+NKurRnJXpJtxpZNpeMMp0VWU7HolnW4sIingt1KFGU9EI0Id1vxQR2apoprblINyLikuH4uq+uh6LD1I9c0=



Anexo al oficio No. EMO/2023/TIHUATLÁN/87005

| Número Obra | Descripción | Formato 09H | Formato 09V | Formato 11 | Formato 12 |
|---------------|---|-------------|-------------|------------|------------|
| 2023301750008 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ DE LA LOCALIDAD NUEVO PROGRESO (KM 12), TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |
| 2023301750009 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD CHAPOLHUAC, TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |
| 2023301750010 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD LA ESFERA, TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |
| 2023301750011 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES CONSTRUCCIÓN SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD PIEDRA CLAVADA, TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |
| 2023301750012 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MORELOS DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |
| 2023301750013 | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO ALUMBRADO PUBLICO EN EL CAMINO A LA LOCALIDAD CHAPOLHUAC, TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |
| 2023301750014 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA DOS LAGUNAS, TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |
| 2023301750015 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA HACIA EL CUARTEL EN LA CALLE REVOLUCIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLAN, VER. | No | SÍ | SÍ | No |
| 2023301750018 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA TELESECUNDARIA "DIAZ MIRON" CLAVE 30DTV1281M, TOTOLAPA SECTOR 5, TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |



SELLO DIGITAL:

ZhdP+ExgyrfabBYfVkuP0Bz1e4Yrb0ebRKYikNDa6k/xLPev8X85Q/OP5inHjMS04SiusjwoKtn7OKnM8I3os+NKurRnJXpJtxpZnpeMMp0VWU7HolnW4slingt1KFGU9EI0ld1vxQR2apoprblmNylLikuH4uq+uh6LDI19c0=



Anexo al oficio No. EMO/2023/TIHUATLÁN/87005

| Número Obra | Descripción | Formato 09H | Formato 09V | Formato 11 | Formato 12 |
|---------------|--|-------------|-------------|------------|------------|
| 2023301750016 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE EUGENIO RIVERA DE LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA, TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |
| 2023301750017 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA TELESECUNDARIA "DIAZ MIRON" CLAVE 30DTV1281M, TOTOLAPA SECTOR 5, TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |
| 2023301750019 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA PEDRERA, TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |
| 2023301750020 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA AMANECER Y EN LA CALLE "SOFIA BAUTISTA GONZALEZ" DE LA LOCALIDAD GENERAL LÁZARO CÁRDENAS KM 9, TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |
| 2023301750021 | CONSTRUCCIÓN DE AULA(S) EN PREPARATORIA CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL COBAEV 14 CLAVE 30ECB00147O DE LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLAN, VER. | Sí | No | Sí | No |
| 2023301750022 | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS POR SUSTITUCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. JOSE VASCONCELOS" CLAVE 30DPR1159W DE LA LOCALIDAD ACONTITLA, TIHUATLAN, VER. | Sí | No | Sí | No |
| 2023301750023 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PREPARATORIA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PARA EL CBTA N° 163 CLAVE 30DTA0012I DE LA COLONIA AZTECA EN LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLAN, VER. | Sí | No | Sí | No |



SELLO DIGITAL:

ZhdP+ExgyrfabBYfVkuP0Bz1e4Yrb0ebRKYikNDa6k/xLPev8X85Q/OP5inHjMS04SiusjvwoKtn7OKnM8l3os+NKUrRnJXpJtxpZNpeMMp0VWU7HolnW4slingt1KFGU9EI0ld1vxQR2apoprblNyiLikuH4uq+uh6LDII9c0=



Anexo al oficio No. EMO/2023/TIHUATLÁN/87005

| Número Obra | Descripción | Formato 09H | Formato 09V | Formato 11 | Formato 12 |
|---------------|--|-------------|-------------|------------|------------|
| 2023301750025 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA SALVADOR DIAZ MIRÓN CLAVE 30DTV0041Q DE LA LOCALIDAD SAN PEDRO MIAHUAPAN, TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |
| 2023301750026 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA(S) PERIMETRAL(ES) EN ESCUELA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR2415B DE LA LOCALIDAD LA UNION, TIHUATLAN, VER. | Sí | No | Sí | No |
| 2023301750027 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA(S) PERIMETRAL(ES) EN ESCUELA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CLAVE 30DPR4664X EN LA LOCALIDAD DE CHONTLA, TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |
| 2023301750028 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PREPARATORIA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL TELEBACHILLERATO FRANCISCO VILLA CLAVE 30ETH0562D DE LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA, TIHUATLAN, VER. | Sí | No | Sí | No |
| 2023301750029 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR PARA EL TEBAEV PASO DE PITAL CLAVE 30ETH0014Z DE LA LOCALIDAD DE PASO DE PITAL, TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |
| 2023301750030 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR PARA EL TEBAEV PASO DE PITAL CLAVE 30ETH0014Z DE LA LOCALIDAD DE PASO DE PITAL, TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |



SELLO DIGITAL:

ZhdP+ExgyrfabBYfVkuP0Bz1e4Yrb0ebRKYikNDa6k/xLPev8X85Q/OP5inHjMS04SlusjvwoKtn7OKnM8I3os+NKUrRnJXpJtxpZnpeMMp0VWU7HolnW4sllngt1KFGU9EI0ld1vxQR2apoprmbfNyiLikuH4uq+uh6LDII9c0=



Anexo al oficio No. EMO/2023/TIHUATLÁN/87005

| Número Obra | Descripción | Formato 09H | Formato 09V | Formato 11 | Formato 12 |
|---------------|---|-------------|-------------|------------|------------|
| 2023301750031 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINES CLAVE 30EPR2403X DE LA LOCALIDAD PAPTALARILLO, TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |
| 2023301750032 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" CLAVE 30EPR2416A DE LA LOCALIDAD XOCOTLA, TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |
| 2023301750033 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CLAVE 30EPR2411F DE LA LOCALIDAD DE TECOMATE, TIHUATLAN, VER. | Sí | No | Sí | No |
| 2023301750035 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO(S) EN ÁREA(S) DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA" CLAVE 30DPR1181Y DE LA LOCALIDAD DE TECOXTEMPA II, TIHUATLAN, VER | Sí | No | Sí | No |
| 2023301750036 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" CLAVE 30DJN0132S DE LA LOCALIDAD EL PALMAR | No | No | No | No |



SELLO DIGITAL:

ZhdP+ExgyrfabBYfVkuP0Bz1e4Yrb0ebRKYIkNDa6k/xLPev8X85Q/OP5inHJMS04Slusjwvoktn7OKnM8l3os+NKURrnJxpJtxpZnpeMMp0VWU7HolnW4slingt1KFGU9EI0ld1vxQR2apoprblNyiIkuH4uq+uh6LDI19c0=



Anexo al oficio No. EMO/2023/TIHUATLÁN/87005

| Número Obra | Descripción | Formato 09H | Formato 09V | Formato 11 | Formato 12 |
|---------------|---|-------------|-------------|------------|------------|
| 2023301750037 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO(S) EN ÁREA(S) DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA "XICOTENCATL" CLAVE 30DPR5498W DE LA LOCALIDAD LA PASADITA, TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |
| 2023301750038 | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BOULEVARD INDEPENDENCIA Y EJERCITO MEXICANO DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA, TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |
| 2023301750039 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON PAVIMENTO HIDRAULICO A LA LOCALIDAD DE HUIZOTATE, TIHAUTLAN, VER. | No | No | No | No |
| 2023301750040 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON PAVIMENTO HIDRAULICO A LA LOCALIDAD SAN NICOLAS, TIHUATLAN, VER. | Sí | No | Sí | No |
| 2023301750041 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON PAVIMENTO HIDRAULICO A LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, TIHUATLAN, VER. | Sí | No | Sí | No |
| 2023301750042 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES REHABILITACION DE CAMINO RURAL A LA LOCALIDAD OCOTEPEC, TIHUATLAN, VER. | Sí | No | Sí | No |



SELLO DIGITAL:

ZhdP+ExgyrfabBYfVkuP0Bz1e4Yrb0ebRKYikNDa6k/xLPev8X85Q/OP5inHjMS045IusjywoKtn7OKnM8I3os+NKurRnjXpJtxpZNpeMMp0VWU7HolnW4slingt1KFGU9EI0ld1vxQR2apoprblmNylLikuH4uq+uh6LDI19c0=



Anexo al oficio No. EMO/2023/TIHUATLÁN/87005

| Número Obra | Descripción | Formato 09H | Formato 09V | Formato 11 | Formato 12 |
|---------------|--|-------------|-------------|------------|------------|
| 2023301750043 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON PAVIMENTO HIDRAULICO HACIA LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |
| 2023301750044 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN ANGEL, TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |
| 2023301750045 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD AGUA FRIA, TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |
| 2023301750046 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD ANTONIO M. QUIRASCO, TIHUATLAN, VER. | Sí | No | Sí | No |
| 2023301750047 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE ANTONIO M. QUIRASCO | No | No | No | No |
| 2023301750048 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL (SEGUNDA ETAPA) DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, TIHUATLAN, VER | No | No | No | No |



SELLO DIGITAL:

ZhdP+ExgyrfabBYfVkuP0Bz1e4Yrb0ebRKYIkNDa6k/xLPev8X85Q/OP5inHjMS04SlusjvwoKtn7OKnM8!3os+NKurnRnJxptxpZnpeMMp0VWU7HoinW4slingt1KFGU9EI0ld1vxQR2apoprblNyiLikuH4uq+uh6LDI!9c0=



Anexo al oficio No. EMO/2023/TIHUATLÁN/87005

| Número Obra | Descripción | Formato 09H | Formato 09V | Formato 11 | Formato 12 |
|---------------|---|-------------|-------------|------------|------------|
| 2023301750049 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |
| 2023301750050 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE VERACRUZ ENTRE LAS CALLES VICTOR SALAS Y POZA RICA DE LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA LA BOMBA, TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |
| 2023301750052 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE REVOLUCION Y CALLE JOSE MARIA MORELOS DE LA LOCALIDAD JILIAPA I, TIHUATLAN, VER. | Sí | No | Sí | No |
| 2023301750053 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS DE LA LOCALIDAD LA CONCEPCION, TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |
| 2023301750054 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD CONSTITUCION, TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |
| 2023301750055 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA VERACRUZ, TIHUATLAN VER. | No | No | No | No |



SELLO DIGITAL:

ZhdP+ExgyrfabBYfVkuP0Bz1e4Yrb0ebRKYIkNDa6k/xLPev8X85Q/OP5inHjMS04SlusjwoKtn7OKnM8l3os+NKURrnJXpJtxpZNpeMMp0VWU7HolnW4slingt1KFGU9EI0ld1vxQR2apoprblNyiLikuH4uq+uh6LDI19c0=



Anexo al oficio No. EMO/2023/TIHUATLÁN/87005

| Número Obra | Descripción | Formato 09H | Formato 09V | Formato 11 | Formato 12 |
|---------------|---|-------------|-------------|------------|------------|
| 2023301750056 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA DE LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS, TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |
| 2023301750057 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRALICO DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS CALLES CLEOFAS MARTINEZ Y PRIMERO DE MAYO DE LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS KM 6, TIHUATAN, VER. | No | No | No | No |
| 2023301750058 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DE LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA (LOS MICOS), TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |
| 2023301750059 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE TAJIN ENTRE LA CALLE BENITO Y LINDERO DE LA LOCALIDAD MESA CERRADA, TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |
| 2023301750060 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL CALLEJON MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE VERACRUZ Y LINDERO (SECTOR MEXICO) DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA, TIHUATLAN, VER. | Sí | No | Sí | No |



SELLO DIGITAL:

ZhdP+ExgyrfabBYfVkuP0Bz1e4Yrb0ebRKYikNDa6k/xLPev8X85Q/OP5inHjMS04S1usjwoktn7OKnM8l3os+NKUrRnJXpJbpxZNpeMMp0VWU7HolnW4slingt1KFGU9EI0ld1vxQR2apoprblNylIkuH4uq+uh6LDlI9c0=



Anexo al oficio No. EMO/2023/TIHUATLÁN/87005

| Número Obra | Descripción | Formato 09H | Formato 09V | Formato 11 | Formato 12 |
|---------------|---|-------------|-------------|------------|------------|
| 2023301750061 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE 12 DE OCTUBRE DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA, TIHUATLAN, VER. | Sí | No | Sí | No |
| 2023301750062 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL ACCESO AL CAZONES II DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA, TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |
| 2023301750063 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RAMON CARACAS LARA, TIHUATLAN, VER. | Sí | No | Sí | No |
| 2023301750064 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO Y BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD RANCHO ALEGRE, TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |
| 2023301750065 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PAPAGAYOS DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL MECATEPEC, TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |
| 2023301750067 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL TERRERO, TIHUATLAN, VER. | Sí | No | Sí | No |



SELLO DIGITAL:

ZhdP+ExgyrfabBYfVkuP0Bz1e4Yrb0ebRKYikNDa6k/xLPev8X85Q/OP5inHjMS04SlusjwoKtn7OKnM8I3os+NKURrnJXpJtxpZnpeMMp0VWU7HoinW4slingt1KFGU9EI0ld1vxQR2apoprblNyLiKuH4uq+uh6LDII9c0=



Anexo al oficio No. EMO/2023/TIHUATLÁN/87005

| Número Obra | Descripción | Formato 09H | Formato 09V | Formato 11 | Formato 12 |
|---------------|--|-------------|-------------|------------|------------|
| 2023301750068 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE SANTA MARTHA DE LA COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLAN, VER. | Sí | No | Sí | No |
| 2023301750069 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PEDRO INFANTE EN LA COLONIA LOMAS DEL PARAISO DE LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |
| 2023301750070 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE LERDO DE TEJADA Y MOCTEZUMA DE LA COLONIA CENTRO, TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |
| 2023301750071 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y TABASCO DE LA COLONIA UNIDAD NACIONAL, TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |
| 2023301750072 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE SAUCES EN LA COLONIA FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLAN, ER. | No | No | No | No |



SELLO DIGITAL:

ZhdP+ExgyrfabBYfVkuP0Bz1e4Yrb0ebRKYikNDa6k/xLPev8X85Q/OP5inHjMS04SiusjvwoKtn7OKnM8I3os+NKurRnJXpJtxpZNpeMMp0VWU7HolnW4slingt1KFGU9EI0ld1vxQR2apoprblmNyiLikuh4uq+uh6LDII9c0=



Anexo al oficio No. EMO/2023/TIHUATLÁN/87005

| Número Obra | Descripción | Formato 09H | Formato 09V | Formato 11 | Formato 12 |
|---------------|---|-------------|-------------|------------|------------|
| 2023301750073 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE XALAPA (SECTOR 4) EN LA LOCALIDAD TOTOLAPA, TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |
| 2023301750074 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE POZO 102 (SEGUNDA ETAPA) DE LA LOCALIDAD DE ZACATE COLORADO, TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |
| 2023301750075 | REHABILITACIÓN DE REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |
| 2023301750076 | REHABILITACIÓN DE REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE XICOTENCATL ENTRE BOULEVARD AMERICAS Y PUENTE EN LA LOCALIDAD DE TOTOLAPA, SECTOR 5, TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |
| 2023301750077 | CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE , TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |
| 2023301750078 | CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD LA REFORMA, TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |

EMO/2023/TIHUATLÁN/87005



SELLO DIGITAL:

ZhdP+ExgyrfabBYfVkuPOBz1e4Yrb0ebRKYikNDa6k/xLPev8X85Q/OP5inHjMS04SiusjvwoKtn7OKnM8I3os+NKurRnJXpJtxpZNpeMMp0VWU7HolnW4slingt1KFGU9EI0ld1vxQR2apoprbmNylIkuH4uq+uh6LDII9c0=



Anexo al oficio No. EMO/2023/TIHUATLÁN/87005

| Número Obra | Descripción | Formato 09H | Formato 09V | Formato 11 | Formato 12 |
|---------------|--|-------------|-------------|------------|------------|
| 2023301750079 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES EN LA LOCALIDAD SANTA INES, TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |
| 2023301750080 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CALLEJÓN IGUALDAD DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA, TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |
| 2023301750081 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LINDERO, TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |
| 2023301750082 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD LA ANTIGUA, TIHUATLAN, VER. | Sí | No | Sí | No |
| 2023301750083 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PASO DE PITAL, TIHUATLAN, VER. | Sí | No | Sí | No |
| 2023301750084 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA NACIONAL, TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |
| 2023301750085 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES BENITO JUAREZ, FRANCISCO I. MADERO, 5 DE FEBRERO Y 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD POZA AZUL DE LOS REYES, TIHUATLAN, VER. | Sí | No | Sí | No |



SELLO DIGITAL:

ZhdP+ExgyrfabBYfVkuPOBz1e4Yrb0ebRKYikNDa6k/xLPev8X85Q/OP5inHjMS045IusjvwoKtn7OKnM8I3os+NKurRnJXpJtxpZnpeMMp0VWU7HolnW4slingt1KFGU9EI0ld1vxQR2apoprblmNyiLikuh4uq+uh6LDI9c0=



Anexo al oficio No. EMO/2023/TIHUATLÁN/87005

| Número Obra | Descripción | Formato 09H | Formato 09V | Formato 11 | Formato 12 |
|---------------|---|-------------|-------------|------------|------------|
| 2023301750086 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |
| 2023301750087 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DE LA LOCALIDAD LA LOMA, TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |
| 2023301750088 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LOS PINOS, TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |
| 2023301750089 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD ZIPATLAN, TIHUATLAN, VER. | Sí | No | Sí | No |
| 2023301750090 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO, EMILIANO ZAPATA E INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD JILIAPA II, TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |
| 2023301750091 | SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS | No | No | No | No |
| 2023301750092 | CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO KM 17, TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |
| 2023301750093 | CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE ACONTITLA, TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |
| 2023301750094 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE(S) PÚBLICO(S) CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN LA LOCALIDAD DE MESA CERRADA, TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |



SELLO DIGITAL:

ZhdP+ExgyrfabBYfVkuP0Bz1e4Yrb0ebRKYIkNDa6k/xLPev8X85Q/OP5inHjMS04S1usjwoKtn7OKnM8I3os+NKurRnJXpJtxpZNpeMMp0VWU7HolnW4slingt1KFGU9EI0ld1vxQR2apoprblNylLikuH4uq+uh6LDI9c0=



Anexo al oficio No. EMO/2023/TIHUATLÁN/87005

| Número Obra | Descripción | Formato 09H | Formato 09V | Formato 11 | Formato 12 |
|---------------|---|-------------|-------------|------------|------------|
| 2023301750095 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO, CORREGIDORA Y BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD LA LOMA , TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |
| 2023301750096 | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN, EN TIHUATLAN VER. | No | No | No | No |
| 2023301750097 | AMPLIACIÓN DE TECHADO CONSTRUCCIÓN DE ESTRADO Y BAÑOS PARA EL DOMO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |
| 2023301750099 | REHABILITACIÓN DE TECHADO (S) REHABILITACIÓN DE TECHADO EN SALÓN DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO, TIHUATLAN, VER. | No | No | No | No |
| 2023301750100 | CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE PASO LA UNO I, TIHUATLAN, VER. | Sí | No | Sí | No |
| 2023301750101 | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y SANITARIOS PARA LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE RODRIGUEZ CANO CLAVE 30DPR1179I DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL MECATEPEC, TIHUATLAN, VER | No | No | No | No |
| 2023301750051 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE LAS CALLES MONTES DE OCA Y LIBERTAD DE LA LOCALIDAD DE PLANDE AYALA, TIHUATLAN, VER | Sí | No | Sí | No |



SELLO DIGITAL:

ZhdP+ExgyrfabBYfVkuPOBz1e4Yrb0ebRKYiKNda6k/xLPev8X85Q/OP5inHjMS04SlusjvwoKtn7OKnM8l3os+NkurRnJXpJtxpZNpeMMp0VWU7HolnW4slingt1KFGU9EI0ld1vxQR2apoprblNyiLikuH4uq+uh6LDI19c0=



Anexo al oficio No. EMO/2023/TIHUATLÁN/87005

| Número Obra | Descripción | Formato 09H | Formato 09V | Formato 11 | Formato 12 |
|---------------|---|-------------|-------------|------------|------------|
| 2023301750024 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA(S) PERIMETRAL(ES) EN ESCUELA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30DPR1182X DE LA LOCALIDAD DE URSULO GALVAN, TIHUATAN, VER. | Sí | No | Sí | No |
| 2023301750034 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO RAMIREZ" TURNO MATUTINO CLAVE 30DPR2023P DE LA LOCLAIDAD DE PLAN DE AYALA, TIHUATLAN, VER. | Sí | No | Sí | No |

EMO/2023/TIHUATLÁN/87005



SELLO DIGITAL:

ZhdP+ExgyrfabBYfVkuP0Bz1e4Yrb0ebRKYikNDa6k/xLPev8X85Q/OP5inHjMS04SlusjwoKtn7OKnM8l3os+NKurRnJXpJtxpZnpeMMp0VWU7HolnW4slingt1KFGU9EI0ld1vxQR2apoprBMIYiLikuH4uq+uh6LDlI9c0=




H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLÁN, VER.

E FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

| | | | | | |
|--------------|---|------------|-----------|---------------------------|----------------|
| Municipio: | TIHUATLÁN | Localidad: | TIHUATLÁN | Ejercicio fiscal: | EJERCICIO 2023 |
| No. de obra: | 2023301750015 | Periodo: | JUNIO | Número de estimación: | N/A |
| Descripción: | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA HACIA EL CUARTEL EN LA CALLE REVOLUCIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLAN, VER. | | | Fuente de financiamiento: | FAISMUN |
| | | | | Fecha de revisión: | 24/07/2023 |

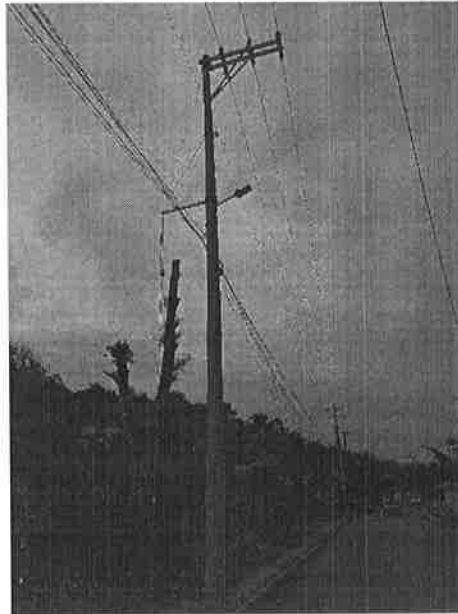

Concepto de obra ejecutado:

Poste, estructura, conductor



Concepto de obra ejecutado:

Retenida, luminaria

Observaciones:

OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA.



César Augusto Guzmán Espinosa

Supervisor de Obras

ING.

Profesión

- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLAN, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
EJERCICIO 2023

FECHA DE ELABORACION:
24/07/2023
MES QUE SE REPORTA
JUNIO

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO: TIHUATLAN **LOCALIDAD:** TIHUATLAN **DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:** AMPLIACION DE ELECTRIFICACION AMPLIACION DE RED ELECTRICA HACIA EL CUARTEL EN LA CALLE REVOLUCION DE LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLAN, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES **No. DE OBRA:** 2023301750015

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO

OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:

TIPO DE ZONA: RURAL URBANA X

CLAVE AGE: 0597

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO

SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI X NO

GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO X MUY BAJO

TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: DIRECTA X COMPLEMENTARIA RESTRINGIDA

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA: LATITUD 0.00000000 LONGITUD 0.00000000

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

AMPLIACION DE RED ELECTRICA HACIA EL CUARTEL EN LA CALLE REVOLUCION DE LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLAN, VER.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR Y LUMINARIAS.

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

| No. EST. | MONTO CON IVA | PÓLIZAS CHEQUE | | FACTURAS | | | | | IMPORTE NETO |
|----------|---------------|----------------|--------|----------|---------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------|
| | | No. | MONTO | No. | IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACION | AMORTIZADO CON IVA | 5 MILLAR | CARGOS ADICIONALES | |
| TOTALES | \$0.00 | | \$0.00 | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

MONTO AUTORIZADO: \$310,458.28 C/IVA

MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: \$311,957.00 C/IVA

VALIDACIÓN DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE X NO APLICA

DEPENDENCIA QUE VALIDA:

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE X NO EXISTE NO APLICA

DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: CFE

PERMISOS Y CONCESIONES: EXISTE X NO EXISTE NO APLICA

DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS: H. AYUNTAMIENTO

TIPO DE LICITACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA X
 INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS
 LICITACIÓN PÚBLICA

NO. DE CONTRATO: MTI-AD-FAISMUN/2023/30/175/0015 **FECHA:** 12/05/2023

CONTRATISTA: REBECA VIRGINIA BALCAZAR RICO

RFC: BARR870507192

MONTO CONTRATADO: \$310,458.00 C/IVA

PROGRAMADA: REAL

PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO 15/05/2023 15/05/2023

TÉRMINO 10/06/2023 10/06/2023

DÍAS 27 27

APLICA: NO APLICA X

ANTICIPO: MONTO \$0.00 PORCENTAJE: 0.00

FECHA DE PAGO: 24/07/2023

B) REPORTE

| | EXISTE | FECHAS |
|--------------------------------|--------|------------|
| MONTO PAGADO EN EL MES: | \$0.00 | |
| MONTO PAGADO ACUMULADO: | \$0.00 | |
| FINIQUITO CON IVA: | \$0.00 | |
| ACTA ENTREGA RECEPCIÓN: | X | 21/06/2023 |

AVANCE FÍSICO REAL

| AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATRASO (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TIPO DE FIANZA: ANTICIPO

MONTO AFIANZADO: \$26,763.00

AFIANZADORA: SOFIMEX

No. DE FIANZA: 2798255

FECHA: 12/05/2023

CONVENIO MODIFICATORIO: MONTO EXISTE IMPORTE/PERIODO FECHA

PLAZO INICIAL FINAL

NO APLICA

MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: \$310,458.00 C/IVA

OBSERVACIONES:

OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA.

Ing. Civil Erik Pérez Álvarez **2023**
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Civil Agustín Guzmán Espinosa
SUPERVISOR DE OBRAS

AYUNTAMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

FORMATO 11

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.




H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLÁN, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------|-----------|----------------------------------|----------------|
| Municipio: | TIHUATLÁN | Localidad: | TIHUATLÁN | Ejercicio fiscal: | EJERCICIO 2023 |
| No. de obra: | 2023301750021 | Periodo: | JUNIO | Número de estimación: | N/A |
| Descripción: | CONSTRUCCIÓN DE AULA(S) EN PREPARATORIA CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL COBAEV 14 CLAVE 30ECB001470 DE LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLAN, VER. | | | Fuente de financiamiento: | FAISMUN |
| | | | | Fecha de revisión: | 24/07/2023 |

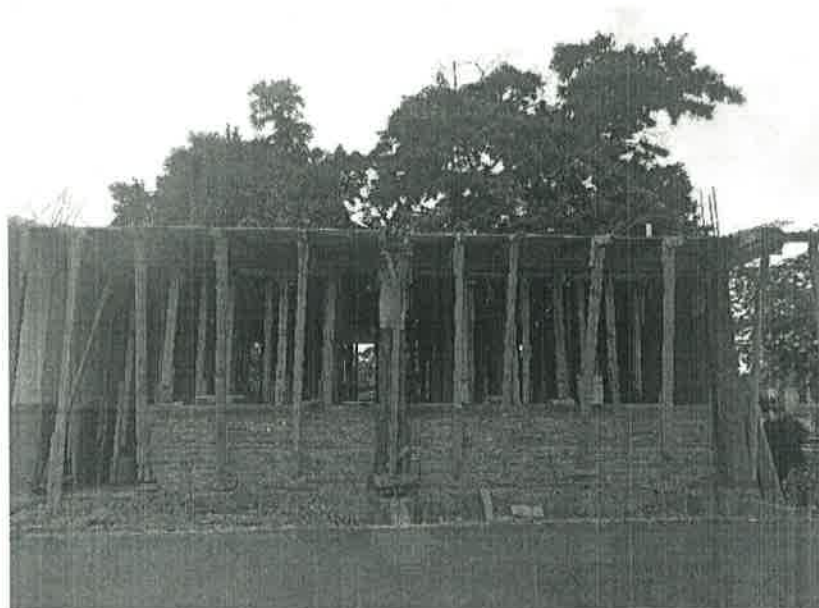

Concepto de obra ejecutado: En la fotografía se aprecia el habilitado de cimbra para construcción de losa de concreto armado.



Concepto de obra ejecutado: En la fotografía se aprecia la construcción de columnas de concreto armado.

Observaciones:

OBRA EN PROCESO.



Uriel
Uriel Mariano Vargas Salas
Supervisor de Obras

ING.
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLAN, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FECHA DE ELABORACION:
24/07/2023
MES QUE SE REPORTA
JUNIO

EJERCICIO 2023

| A) PLANEACION Y DATOS GENERALES | | | |
|---------------------------------|-----------|--------------|---|
| MUNICIPIO: | TIHUATLAN | LOCALIDAD: | TIHUATLAN |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | FAISMUN | No. DE OBRA: | 2023301750021 |
| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: | | | CONSTRUCCIÓN DE AULA(S) EN PREPARATORIA CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL COBAEV 14 CLAVE 30ECB001470 DE LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLAN, VER |

| ANTECEDENTES: | | | |
|------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: | SI | X | NO |
| OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: | | | |
| TIPO DE ZONA: | RURAL | CLAVE AGEB: | 0421 |
| SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: | URBANA | X | |
| SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO | SI | X | NO |
| GRADO DE REZAGO SOCIAL: | | | |
| MUY ALTO | ALTO | MEDIO | BAJO X MUY BAJO |
| TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: | | | |
| DIRECTA | X | COMPLEMENTARIA | RESTRINGIDA |
| COORDENADAS DE GEORREFERENCIA | | | |
| LATITUD | 0.000000000 | LONGITUD | 0.000000000 |

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

1 ANEXO

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

LA OBRA MUESTRA EL AVANCE EN LA CONSTRUCCION DE MUROS DE TABIQUE Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO.

| C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA* | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|----------------|--------|----------|---------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------|--------|
| No. EST. | MONTO CON IVA | POLIZAS CHEQUE | | FACTURAS | | | | | | |
| | | No. | MONTO | No. | IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN | AMORTIZADO CON IVA | 5 MILLAR | CARGOS ADICIONALES | IMPORTE NETO | |
| TOTALES | \$0.00 | | \$0.00 | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

| | | |
|---|-------------------------------|-------------|
| MONTO AUTORIZADO: | \$800,367.88 | C/IVA |
| MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: | \$800,538.76 | C/IVA |
| VALIDACIÓN DEL PROYECTO: | EXISTE X NO EXISTE | NO APLICA |
| DEPENDENCIA QUE VALIDA: | SEV | |
| FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: | EXISTE X NO EXISTE | NO APLICA |
| DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: | SEV | |
| PERMISOS Y CONCESIONES: | EXISTE NO EXISTE | NO APLICA X |
| DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS: | | EXISTE X |
| TIPO DE LICITACIÓN: | ADJUDICACIÓN DIRECTA | |
| | INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS | |
| | licitación pública | |

| | | | |
|-----------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| NO. DE CONTRATO: | MH-AD-TAISMUN/2023/30175/0021 | FECHA: | 08/06/2023 |
| CONTRATISTA: | ERASTO VIAN ELIZALDE | | |
| RFC: | VIEE890630613 | | |
| MONTO CONTRATADO: | \$800,367.88 | C/IVA | |
| | PROGRAMADA | REAL | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO 12/06/2023 | 12/06/2023 | |
| | TÉRMINO 12/07/2023 | | |
| | DÍAS 31 | 19 | |
| ANTICIPO: | APLICA NO APLICA | X | |
| | MONTO: \$0.00 | PORCENTAJE: 0.00 | |
| | FECHA DE PAGO: | 24/07/2023 | |

| B) REPORTE | | |
|-------------------------|--------|------------|
| | EXISTE | FECHAS |
| MONTO PAGADO EN EL MES: | \$0.00 | 30/06/2023 |
| MONTO PAGADO ACUMULADO: | \$0.00 | 30/06/2023 |
| FINIQUITO CON IVA: | \$0.00 | |
| ACTA ENTREGA RECEPCIÓN: | | |

| AVANCE FÍSICO REAL | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATRASO (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|-----------|-----------------------------------|-----------------|
| TIPO DE FIANZA: | ANTICIPO | CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS |
| MONTO AFIANZADO: | | \$68,997.23 | |
| AFIANZADORA: | | DORAMA INSTITUCIÓN DE SEGUROS S.A | |
| No. DE FIANZA: | | 23A31388 | |
| FECHA: | | 08/06/2023 | |
| CONVENIO MODIFICATORIO: | MONTO: | EXISTE | IMPORTE/PERIODO |
| | PLAZO: | | INICIAL FINAL |
| | NO APLICA | X | |
| MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: | | \$800,367.88 | |

OBSERVACIONES:

OBRA EN PROCESO.

Ing. Civil Erik Pérez Alvarez DIRECTOR DE OBRAS
Ing. Uriel Mariano Vargas Salas SUPERVISOR DE OBRAS

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

FORMATO 11






H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLÁN, VER.

RE FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------|-----------|----------------------------------|----------------|
| Municipio: | TIHUATLÁN | Localidad: | ACONTITLA | Ejercicio fiscal: | EJERCICIO 2023 |
| No. de obra: | 2023301750022 | Periodo: | JUNIO | Número de estimación: | N/A |
| Descripción: | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS POR SUSTITUCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. JOSE VASCONCELOS" CLAVE 30DPR1159W | | | Fuente de financiamiento: | FAISMUN |
| | | | | Fecha de revisión: | 24/07/2023 |

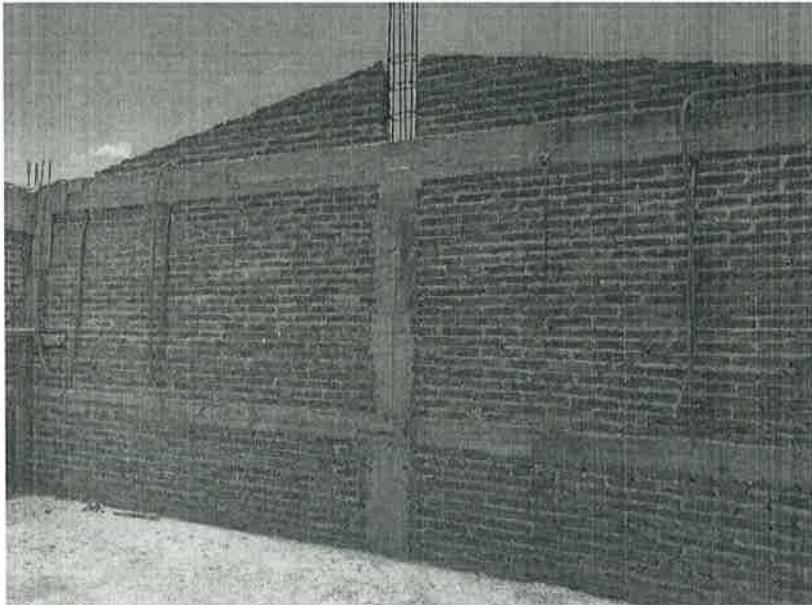

MUROS DE TABIQUE DE LA REGION

Concepto de obra ejecutado:



LOSA DE CONCRETO ARMADA

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty dashed box for observations.



Juan Manuel Romero Cuevas
Supervisor de Obras
 ARQ
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLAN, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
EJERCICIO 2023

FECHA DE ELABORACIÓN:
24/07/2023
MES QUE SE REPORTE
JUNIO

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO: TIHUATLAN LOCALIDAD: ACONTITLA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS POR SUSTITUCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. JOSE VASCONCELOS" CLAVE 30DPR1159W DE LA LOCALIDAD ACONTITLA, TIHUATLAN, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FAISMUN No. DE OBRA: 2023301750022

| CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: | | SI | X | NO |
|--------------------------------|---------|------------|-----|--------------------------------------|
| OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: | | | | |
| TIPO DE ZONA: | RURAL X | CLAVE AGE: | N/A | GRADO DE REZAGO SOCIAL: |
| SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: | SI X NO | | | MUY ALTO ALTO MEDIO X BAJO MUY BAJO |
| SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO | SI X NO | | | TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: |
| | | | | DIRECTA X COMPLEMENTARIA RESTRINGIDA |

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA
LATITUD 0.00000000 LONGITUD 0.00000000

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
DOS AULAS DE DOS AGUAS CIMENTACION CORRIDA MUROS DE TABIQUE ROJO DE LA REGION CASTILLOS Y CADENAS ASI COMO LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
TRABAJOS DE ACABADOS

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

| No. EST. | MONTO CON IVA | PÓLIZAS CHEQUE | | FACTURAS | | | | | |
|----------|---------------|----------------|--------|----------|---------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------|
| | | No. | MONTO | No. | IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN | AMORTIZADO CON IVA | 5 MILLAR | CARGOS ADICIONALES | IMPORTE NETO |
| TOTALES | \$0.00 | | \$0.00 | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

MONTO AUTORIZADO: \$1,194,472.06 C/IVA
 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: \$1,203,000.00 C/IVA
 VALIDACIÓN DEL PROYECTO: EXISTE X NO EXISTE NO APLICA
 DEPENDENCIA QUE VALIDA: SEV
 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE X NO EXISTE NO APLICA
 DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: SEV
 PERMISOS Y CONCESIONES: EXISTE X NO EXISTE NO APLICA
 DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS: H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLAN EXISTE
 TIPO DE LICITACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA X

NO. DE CONTRATO: MTI-IR-FAISMUN-DF /2023/30/175/0022 FECHA: 12/05/2023
 CONTRATISTA: GUILLERMO HERNANDEZ CRUZ
 RFC: HECG740902866
 MONTO CONTRATADO: \$1,194,472.06 C/IVA
 PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO PROGRAMADA REAL
 TÉRMINO 15/05/2023 15/05/2023
 DÍAS 15/07/2023
 62 17
 APLICA X NO APLICA
 ANTICIPO: MONTO: \$358,341.60 PORCENTAJE: 30.00
 FECHA DE PAGO: 12/05/2023

B) REPORTE

| | EXISTE | FECHAS |
|-------------------------|--------|------------|
| MONTO PAGADO EN EL MES: | \$0.00 | 30/06/2023 |
| MONTO PAGADO ACUMULADO: | \$0.00 | 30/06/2023 |
| FINIQUITO CON IVA: | \$0.00 | |
| ACTA ENTREGA RECEPCIÓN: | | |

AVANCE FÍSICO REAL

| AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | DCT | NOV | DIC |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATRASO (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

OBSERVACIONES:

Observaciones area: (Seal of the Ayuntamiento de Tihuatlan visible)

TIPO DE FIANZA: ANTICIPO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS
 MONTO AFIANZADO: \$358,341.00 \$102,971.00
 AFIANZADORA: DORAMA DORAMA
 No. DE FIANZA: 1782851 1782879
 FECHA: 12/05/2023 12/05/2023
 CONVENIO MODIFICATORIO: MONTO PLAZO INICIAL FINAL
 NO APLICA X
 MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: \$1,194,472.06 C/IVA

Ing. Civil Erik Pérez Álvarez
DIRECTOR DE OBRAS

Arq. Juan Manuel Romero Cuevas
SUPERVISOR DE OBRAS

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja



H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLÁN, VER.

RE FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------|-----------|----------------------------------|----------------|
| Municipio: | TIHUATLÁN | Localidad: | TIHUATLÁN | Ejercicio fiscal: | EJERCICIO 2023 |
| No. de obra: | 2023301750023 | Periodo: | JUNIO | Número de estimación: | N/A |
| Descripción: | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PREPARATORIA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PARA EL CBTA N° 163 CLAVE 30DTA0012I DE LA COLONIA AZTECA EN LA | | | Fuente de financiamiento: | FAISMUN |
| | | | | Fecha de revisión: | 24/07/2023 |



Concepto de obra ejecutado:

En la fotografía se aprecia la construcción de muro de block aparente.



Concepto de obra ejecutado:

En la fotografía se aprecia la construcción de castillos de concreto armado.

Observaciones:

OBRA CULMINADA



Uriel Mariano Vargas Salas
 Uriel Mariano Vargas Salas
Supervisor de Obras

ING.
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLAN, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FECHA DE ELABORACION:
24/07/2023
MES QUE SE REPORTA
JUNIO

EJERCICIO 2023

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

| | | | | | |
|---------------------------|-----------|--------------|---------------|-------------------------|---|
| MUNICIPIO: | TIHUATLÁN | LOCALIDAD: | TIHUATLÁN | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PREPARATORIA CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL PARA EL CBTA N° 163 CLAVE 30DTA00321 DE LA COLONIA AZTECA EN LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLAN, VER. |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | FAISMUN | No. DE OBRA: | 2023301750023 | | |

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI NO

OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:

TIPO DE ZONA: RURAL URBANA

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI NO

SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI NO

CLAVE AGE: 0277

MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO

TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: DIRECTA COMPLEMENTARIA RESTRINGIDA

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA: LATITUD 0.00000000 LONGITUD 0.00000000

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

1 ANEXO, SE CONSTRUIRAN 284 41 ML DE BARRA PERIMETRAL.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

OBRA CULMINADA.

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

| No. EST. | MONTO CON IVA | PÓLIZAS CHEQUE | | No. | IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN | AMORTIZADO CON IVA | FACTURAS | | | IMPORTE NETO |
|----------|---------------|----------------|--------|-----|---------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|--------|--------------|
| | | No. | MONTO | | | | 5 MILLAR | CARGOS ADICIONALES | | |
| TOTALES | \$0.00 | | \$0.00 | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

MONTO AUTORIZADO: \$1,091,193.24 C/IVA

MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: \$1,092,174.86 C/IVA

VALIDACIÓN DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE NO APLICA

DEPENDENCIA QUE VALIDA: EXISTE NO EXISTE NO APLICA

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE NO APLICA

DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: EXISTE NO EXISTE NO APLICA

PERMISOS Y CONCESIONES: EXISTE NO EXISTE NO APLICA

DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS: H. AYUNTAMIENTO, TIHUATLAN, VER. EXISTE

TIPO DE LICITACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA

NO. DE CONTRATO: A014D-FAISMUN/2023/30175/0023 FECHA: 18/05/2023

CONTRATISTA: CARLOS AGUILAR PALESTINA

RFC: ALUPC910325Q58

MONTO CONTRATADO: \$1,091,193.24 C/IVA

PROGRAMADA REAL

PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO 22/05/2023 22/05/2023

TERMINO 28/06/2023 28/06/2023

DÍAS 38 38

APLICA NO APLICA

ANTICIPO: MONTO: \$0.00 PORCENTAJE: 0.00

FECHA DE PAGO: 24/07/2023

B) REPORTE

| | EXISTE | FECHAS |
|-------------------------|--------|------------|
| MONTO PAGADO EN EL MES: | \$0.00 | 30/06/2023 |
| MONTO PAGADO ACUMULADO: | \$0.00 | 30/06/2023 |
| FINIQUITO CON IVA: | \$0.00 | |
| ACTA ENTREGA RECEPCIÓN: | | |

AVANCE FÍSICO REAL

| AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATRASO (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TIPO DE FIANZA: ANTICIPO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS

MONTO AFIANZADO: \$94,068.38 \$109,119.32

AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS LIBERTY FIANZAS

No. DE FIANZA: 24319690000 24319690002

FECHA: 18/05/2023 28/06/2023

EXISTE IMPORTE/PERIODO FECHA

CONVENIO MODIFICATORIO: MONTO INICIAL FINAL

PLAZO NO APLICA

MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: \$1,091,193.24 C/IVA

OBSERVACIONES:

LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA.

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

Ing. Civil Erik Pérez Álvarez
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Uriel Mariano Vargas Salas
SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLÁN, VER.

RE FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------|
| Municipio: | TIHUATLÁN | Localidad: | ÚRSULO GALVÁN | Ejercicio fiscal: | EJERCICIO 2023 |
| No. de obra: | 2023301750024 | Periodo: | JUNIO | Número de estimación: | N/A |
| Descripción: | CONSTRUCCIÓN DE BARDA(S) PERIMETRAL(ES) EN ESCUELA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE | | | Fuente de financiamiento: | FAISMUN |
| | | | | Fecha de revisión: | 24/07/2023 |



Concepto de obra ejecutado:

CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO ARMADO



Concepto de obra ejecutado:

MURO DE TABIQUE ROJO

Observaciones:

Empty dashed box for observations.



(Handwritten signature)
 Juan Manuel Romero Cuevas
Supervisor de Obras
 ARQ
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



**H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLAN, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
EJERCICIO 2023**

FECHA DE ELABORACION:
24/07/2023
MES QUE SE REPORTA
JUNIO

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO: TIHUATLAN **LOCALIDAD:** URSULO GALVAN **DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:** CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30DP1182X DE LA LOCALIDAD DE URSULO GALVAN TIHUATLAN VER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FAISMUN **No. DE OBRA:** 2023301750024

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO

OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: **GRADO DE REZAGO SOCIAL:**

TIPO DE ZONA: RURAL X URBANA **CLAVE AGE:** N/A MUY ALTO ALTO MEDIO X BAJO MUY BAJO

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO **TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:**

SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI X NO DIRECTA X COMPLEMENTARIA RESTRINGIDA

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA
LATITUD: 0.000000000 **LONGITUD:** 0.000000000

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
LA OBRA CONSTA EN EL CERCADO PERIMETRAL UTILIZANDO DOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EN UNO DE LOS CUALES SON 163.00 ML CON EL CUAL LLEVA ZAPATAS AISLADAS, DADO DE CONCRETO, CADENA DE DESPLANTE, MURO DE TABIQUE, REPISON, CASTILLO Y MALLA CICLON EL OTRO DE 142.13 ML COM MUERTOS DE CONCRETO TUBERIA GALVANIZADA Y MALLA DE TELA CICLON DE 2.50 ALTURA

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
SE DA INICIO EN LA OBRA CON CIMENTACION CON ZAPATAS AISLADAS DADOS DE CONCRETO CADENAS DE DESPLANTE CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

| No. EST. | MONTO CON IVA | PÓLIZAS CHEQUE | | FACTURAS | | | | | IMPORTE NETO |
|----------|---------------|----------------|--------|----------|---------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------|
| | | No. | MONTO | No. | IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN | AMORTIZADO CON IVA | 5 MILLAR | CARGOS ADICIONALES | |
| TOTALES | \$0.00 | | \$0.00 | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

MONTO AUTORIZADO: \$741,080.19 C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: \$741,956.00 C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE VALIDA: EXISTE NO EXISTE NO APLICA X
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: EXISTE X NO EXISTE NO APLICA
PERMISOS Y CONCESIONES: EXISTE X NO EXISTE NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS: H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLAN
TIPO DE LICITACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA X

NO. DE CONTRATO: MTI-AD-FAISMUN/2023/30/175/0024 **FECHA:** 08/06/2023
CONTRATISTA: IRAZEMA AMADA JIMENEZ MALDONADO
RFC: JIM1800212FD3
MONTO CONTRATADO: \$741,080.19 C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO PROGRAMADA 12/06/2023 REAL 12/06/2023
TÉRMINO 31/07/2023
DÍAS 50 19
APLICACIÓN: APLICA NO APLICA X
ANTICIPO: MONTO: \$0.00 PORCENTAJE: 0.00
FECHA DE PAGO: 24/07/2023

B) REPORTE

| | EXISTE | FECHAS |
|-------------------------|--------|------------|
| MONTO PAGADO EN EL MES: | \$0.00 | 30/06/2023 |
| MONTO PAGADO ACUMULADO: | \$0.00 | 30/06/2023 |
| FINIQUITO CON IVA: | \$0.00 | |
| ACTA ENTREGA RECEPCIÓN: | | |

AVANCE FÍSICO REAL

| AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATRASO (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TIPO DE FIANZA: ANTICIPO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO: \$184,615.00
AFIANZADORA: ASERTA SA DE CV
No. DE FIANZA: 3616-23707-5
FECHA: 08/06/2023
CONVENIO MODIFICATORIO: MONTO EXISTE IMPORTE/PERIODO FECHA
PLAZO INICIAL FINAL
NO APLICA X
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: \$741,080.19 C/IVA

OBSERVACIONES:

Ing. Civil Erik Pérez Álvarez DIRECTOR DE OBRAS
Arq. Juan Manuel Romero Cuevas SUPERVISOR DE OBRAS



*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja

**H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLÁN, VER.****RE FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS****DATOS GENERALES**

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------|----------|----------------------------------|----------------|
| Municipio: | TIHUATLÁN | Localidad: | LA UNIÓN | Ejercicio fiscal: | EJERCICIO 2023 |
| No. de obra: | 2023301750026 | Periodo: | JUNIO | Número de estimación: | N/A |
| Descripción: | CONSTRUCCIÓN DE BARDA(S) PERIMETRAL(ES) EN ESCUELA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR2415B DE LA | | | Fuente de financiamiento: | FAISMUN |
| | | | | Fecha de revisión: | 24/07/2023 |



Concepto de obra ejecutado: Construcción de castillos de concreto armado de sección de 20x20 CM esquinas chaflaneadas

Concepto de obra ejecutado:



Construcción de muros perimetrales a base de tabique rojo en acabado aparente en ambos lados.

Observaciones:

LA EMPRESA NO PRESENTA ESTIMACIONES PARCIALES.



Luis Edgar Ramos Hernández
Supervisor de Obras

ING.

Profesión del Supervisor

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLAN, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2023

| | |
|-----------------------|------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN: | 24/07/2023 |
| MES QUE SE REPORTA | JUNIO |

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

| | | | | | |
|---------------------------|-----------|--------------|---------------|-------------------------|--|
| MUNICIPIO: | TIHUATLÁN | LOCALIDAD: | LA UNIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE BARDA(S) PERIMETRAL(ES) EN ESCUELA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR2415B DE LA LOCALIDAD LA UNION, TIHUATLAN, VER. |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | FAISMUN | No. DE OBRA: | 2023301750026 | | |

ANTECEDENTES:

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|---|--------|------------------------------------|-------------|----------------|-------------|------|----------|
| CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: | SI | X | NO | GRADO DE REZAGO SOCIAL: | | | | | |
| OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: | | | | MUY ALTO | ALTO | MEDIO | X | BAJO | MUY BAJO |
| TIPO DE ZONA: | RURAL | X | URBANA | CLAVE AGE: | N/A | | | | |
| SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: | SI | X | NO | TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: | | | | | |
| SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO | SI | X | NO | DIRECTA | X | COMPLEMENTARIA | RESTRINGIDA | | |
| COORDENADAS DE GEORREFERENCIA | | | | | | | | | |
| LATITUD | 0.000000000 | | | LONGITUD | 0.000000000 | | | | |

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

SE CONSTRUIRAN 202.23 ML DE BARDA PERIMETRAL A BASE DE ZAPATAS AISLADAS, CADENAS DE DESPANTE DE 20X30 CM Y MUROS DE TABIQUE ROJO EN ACABADO APARENTE ASI COMO CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO DE 20X20.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

SE PRESENTA EL 90% DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA CON LA CONSTRUCCION DE MURO DE TABIQUE TOJO EN ACABADO APARENTE, CADENAS DE CERRAMIENTO DE 20X20 CM Y CASTILLOS DE LA MISMA SECCION, TELA CICLON DE 1.50M.

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

| No. EST. | MONTO CON IVA | PÓLIZAS CHEQUE | | FACTURAS | | | | | IMPORTE NETO |
|----------|---------------|----------------|--------|----------|---------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------|
| | | No. | MONTO | No. | IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN | AMORTIZADO CON IVA | 5 MILLAR | CARGOS ADICIONALES | |
| TOTALES | \$0.00 | | \$0.00 | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

| | | | | |
|---|-------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|
| MONTO AUTORIZADO: | \$861,640.00 | C/IVA | | |
| MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: | \$861,640.00 | C/IVA | | |
| VALIDACIÓN DEL PROYECTO: | EXISTE | NO EXISTE | NO APLICA | X |
| DEPENDENCIA QUE VALIDA: | | | | |
| FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: | EXISTE | NO EXISTE | NO APLICA | X |
| DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: | | | | |
| PERMISOS Y CONCESIONES: | EXISTE | X | NO EXISTE | NO APLICA |
| DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS: | | | | H. AYUNTAMIENTO TIHUATLAN, VER. |
| TIPO DE LICITACIÓN: | ADJUDICACIÓN DIRECTA | | | EXISTE |
| | INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS | | | X |
| | LICITACIÓN PÚBLICA | | | |

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------|
| NO. DE CONTRATO: | MTI-AD FAISMUN/2023/30/175/0026 | FECHA: | 12/05/2023 |
| CONTRATISTA: | IRMA GONZALEZ LUNA | | |
| RF: | GOL731011G91 | | |
| MONTO CONTRATADO: | \$913,328.35 | REAL | C/IVA |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO | 15/05/2023 | 15/05/2023 |
| | TÉRMINO | 15/07/2023 | |
| | DÍAS | 62 | 17 |
| ANTICIPO: | APLICA MONTO: | X \$273,998.50 | NO APLICA PORCENTAJE: 30.00 |
| | FECHA DE PAGO: | | |

B) REPORTE

| | | | |
|-------------------------|--------|--------|------------|
| MONTO PAGADO EN EL MES: | EXISTE | \$0.00 | FECHAS |
| MONTO PAGADO ACUMULADO: | \$0.00 | | 30/06/2023 |
| FINIQUITO CON IVA: | \$0.00 | | |
| ACTA ENTREGA RECEPCIÓN: | | | |

AVANCE FISICO REAL

| AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATRASO (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

OBSERVACIONES:

LA EMPRESA NO PRESENTA ESTIMACIONES PARCIALES HASTA ESTA FECHA



| | | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| TIPO DE FIANZA: | ANTICIPO | CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS |
| MONTO AFIANZADO: | \$273,998.51 | \$78,735.20 | |
| AFIANZADORA: | TOKIO MARINE HCC MEXICO | TOKIO MARINE HCC MEXICO | |
| | COMPANIA AFIANZADORA, S.A. DE C.V. | COMPANIA AFIANZADORA, S.A. DE C.V. | |
| No. DE FIANZA: | 067090-00000 | 067092-00000 | |
| FECHA: | 12/05/2023 | 12/05/2023 | |
| CONVENIO MODIFICATORIO: | MONTO | EXISTE | IMPORTE/PERIODO |
| | PLAZO | NO APLICA | FECHA |
| MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: | | \$913,328.35 | C/IVA |

Ing. Erik Pérez Álvarez
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Luis Edgar Riquelme
SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

*En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.




H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLÁN, VER.


RE FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------|-----------------|----------------------------------|----------------|
| Municipio: | TIHUATLÁN | Localidad: | FRANCISCO VILLA | Ejercicio fiscal: | EJERCICIO 2023 |
| No. de obra: | 2023301750028 | Periodo: | JUNIO | Número de estimación: | |
| Descripción: | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PREPARATORIA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL TELEBACHILLERATO FRANCISCO VILLA CLAVE 30ETH0562D DE LA | | | Fuente de financiamiento: | FAISMUN |
| | | | | Fecha de revisión: | 24/07/2023 |

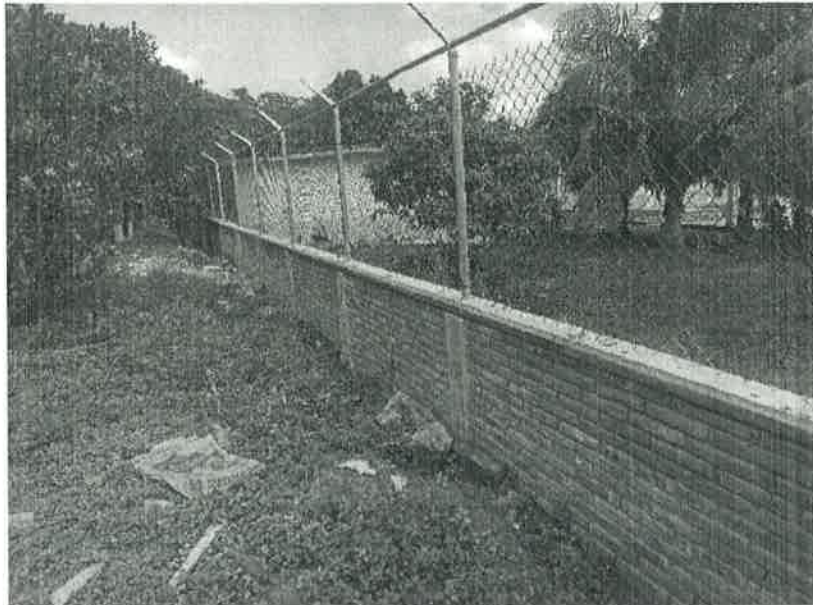

Concepto de obra ejecutado: En la foto se observa la construcción de barda perimetral a base de muro de tabique rojo

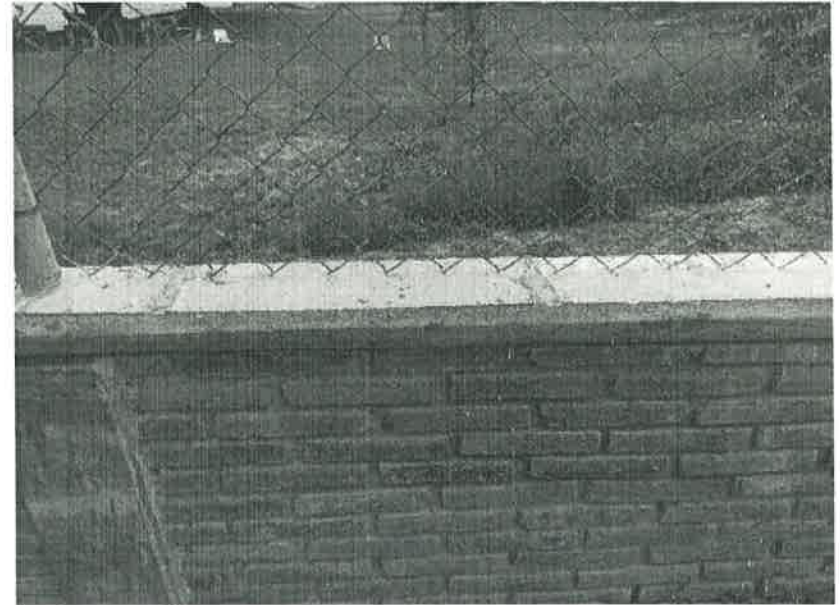

Concepto de obra ejecutado: Construcción de repison

Observaciones:

LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA



Diara Guadalupe Ríos García

Supervisor de Obras

ING.

Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



**H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLAN, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**

FECHA DE ELABORACION:
24/07/2023
MES QUE SE REPORTA
JUNIO

EJERCICIO 2023

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

| | | |
|--|-----------------------------------|--|
| MUNICIPIO: TIHUATLÁN | LOCALIDAD: FRANCISCO VILLA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PREPARATORIA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL TELEBACHILLERATO FRANCISCO VILLA CLAVE 30ETH0562D DE LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA, TIHUATLAN, VER |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FAISMUN | No. DE OBRA: 2023301750028 | |

ANTECEDENTES:

| | |
|--|--|
| CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | GRADO DE REZAGO SOCIAL: |
| OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: | MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO <input checked="" type="checkbox"/> MUY BAJO |
| TIPO DE ZONA: RURAL <input checked="" type="checkbox"/> URBANA | TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: |
| CLAVE AGE: N/A | DIRECTA <input checked="" type="checkbox"/> COMPLEMENTARIA RESTRINGIDA |
| SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | |
| SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | |
| COORDENADAS DE GEORREFERENCIA | |
| LATITUD: 0.000000000 | LONGITUD: 0.000000000 |

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

1 ANEXO

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

LAS ACTIVIDADES QUE SE REFLEJAN SON LA CONSTRUCCION DE MUROS EN LOS PRIMEROS TRAMOS.

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

| No. EST. | MONTO CON IVA | PÓLIZAS CHEQUE | | FACTURAS | | | | | | |
|----------|---------------|----------------|--------|----------|---------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------|--------|
| | | No. | MONTO | No. | IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN | AMORTIZADO CON IVA | 5 MILLAR | CARGOS ADICIONALES | IMPORTE NETO | |
| TOTALES | \$0.00 | | \$0.00 | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

| | | |
|--|--|--|
| MONTO AUTORIZADO: | \$768,323.92 | C/IVA |
| MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: | \$768,835.62 | C/IVA |
| VALIDACIÓN DEL PROYECTO: | EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input type="checkbox"/> | X |
| DEPENDENCIA QUE VALIDA: | | |
| FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: | EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input type="checkbox"/> | X |
| DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: | | |
| PERMISOS Y CONCESIONES: | EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input checked="" type="checkbox"/> NO APLICA <input type="checkbox"/> | |
| DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS: | | EXISTE <input checked="" type="checkbox"/> |
| TIPO DE LICITACIÓN: | ADJUDICACIÓN DIRECTA <input type="checkbox"/> INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS <input type="checkbox"/> LICITACIÓN PÚBLICA <input type="checkbox"/> | |

| | | | |
|------------------------------|---|---------------|------------------|
| NO. DE CONTRATO: | MTI-AD-FAISMUN/2023/30/175/0028 | FECHA: | 12/05/2023 |
| CONTRATISTA: | GAMALIEL JIMENEZ MALDONADO | | |
| RFC: | JIMG770505KL8 | | |
| MONTO CONTRATADO: | \$768,323.92 | C/IVA | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | PROGRAMADA | REAL | |
| | INICIO | 15/05/2023 | 15/05/2023 |
| | TÉRMINO | 30/06/2023 | 30/06/2023 |
| | DÍAS | 47 | 47 |
| ANTICIPO: | APLICA <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/> | | X |
| | MONTO: | \$0.00 | PORCENTAJE: 0.00 |
| | FECHA DE PAGO: | 24/07/2023 | |

B) REPORTE

| | | |
|--------------------------------|--------|--------|
| | EXISTE | FECHAS |
| MONTO PAGADO EN EL MES: | \$0.00 | |
| MONTO PAGADO ACUMULADO: | \$0.00 | |
| FINIQUITO CON IVA: | \$0.00 | |
| ACTA ENTREGA RECEPCIÓN: | | |

AVANCE FÍSICO REAL

| AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATRASO (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

OBSERVACIONES:

OBRA EN CONSTRUCCIONM AVANCE FISICO DEL 100 %.

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja



Ing. Civil Erik Pérez Álvarez
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Diana Guadalupe Rodríguez García
SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

**H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLÁN, VER.****RE FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS****DATOS GENERALES**

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------|----------|----------------------------------|----------------|
| Municipio: | TIHUATLÁN | Localidad: | TECOMATE | Ejercicio fiscal: | EJERCICIO 2023 |
| No. de obra: | 2023301750033 | Periodo: | JUNIO | Número de estimación: | |
| Descripción: | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CLAVE 30EPR2411F DE LA | | | Fuente de financiamiento: | FAISMUN |
| | | | | Fecha de revisión: | 24/07/2023 |



Concepto de obra ejecutado:

Colocacion de cimbra común para losa



Concepto de obra ejecutado:

Construcción de Muros de tabique rojo

Observaciones:

LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO SIN PROBLEMA ALGUNO



Diana Guadalupe Ríos García

Supervisor de Obras

ING.

Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLAN, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

| | |
|-----------------------|------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN: | 24/07/2023 |
| MES QUE SE REPORTA | JUNIO |

EJERCICIO 2023

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

| | | | | | |
|---------------------------|-----------|--------------|---------------|-------------------------|--|
| MUNICIPIO: | TIHUATLAN | LOCALIDAD: | TECOMATE | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CLAVE 30EPR2411F DE LA LOCALIDAD DE TECOMATE, TIHUATLAN, VER |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | FAISMUN | No. DE OBRA: | 2023301750033 | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|------------|----------|----------------|---|-------------|
| ANTECEDENTES: | | | | | |
| CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: | SI | X | NO | | |
| OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: | | | | | |
| TIPO DE ZONA: | RURAL | X | URBANA | | |
| SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: | SI | X | NO | | |
| SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO | SI | X | NO | | |
| CLAVE AGE: | | N/A | | | |
| GRADO DE REZAGO SOCIAL: | | | | | |
| | MUY ALTO | ALTO | MEDIO | X | BAJO |
| | | | | | MUY BAJO |
| TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: | | | | | |
| | DIRECTA | X | COMPLEMENTARIA | | RESTRINGIDA |
| COORDENADAS DE GEORREFERENCIA | | | | | |
| LATITUD | 0.00000000 | LONGITUD | 0.00000000 | | |

| | |
|---|--------------------------|
| DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA: | 1 ANEXO COMEDOR ESCOLAR. |
|---|--------------------------|

| | |
|---|---|
| DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES: | LA OBRA MUESTRA COMO ACTIVIDADES PRINCIPALES LA CONSTRUCCION DE LA LOSA ASI COMO TAMBIEN LA CONSTRUCCION DE MUROS |
|---|---|

| C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA* | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|----------------|--------|----------|---------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------|--------|
| No. EST. | MONTO CON IVA | PÓLIZAS CHEQUE | | FACTURAS | | | | | | |
| | | No. | MONTO | No. | IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN | AMORTIZADO CON IVA | 5 MILLAR | CARGOS ADICIONALES | IMPORTE NETO | |
| | | | | | | | | | | |
| TOTALES | \$0.00 | | \$0.00 | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

| | | |
|---|---|----------|
| MONTO AUTORIZADO: | \$1,402,825.25 | C/IVA |
| MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: | \$1,403,849.12 | C/IVA |
| VALIDACIÓN DEL PROYECTO: | EXISTE NO EXISTE NO APLICA | X |
| DEPENDENCIA QUE VALIDA: | | |
| FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: | EXISTE NO EXISTE NO APLICA | X |
| DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: | | |
| PERMISOS Y CONCESIONES: | EXISTE X NO EXISTE NO APLICA | |
| DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS: | H. AYUNTAMIENTO | |
| TIPO DE LICITACIÓN: | ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MÍNOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA | EXISTE X |

| | | | |
|-----------------------|--|----------------------------|------------|
| NO. DE CONTRATO: | MTI-IR-FAISMUN/2023/30/175/033 | FECHA: | 19/05/2023 |
| CONTRATISTA: | CORPORATIVO CONSTRUCTOR DANIMAR SA DE CV | | |
| RFC: | CCD170706F47 | | |
| MONTO CONTRATADO: | \$1,402,825.25 | C/IVA | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO 22/05/2023 TÉRMINO 07/07/2023 | REAL 22/05/2023 | |
| | DÍAS 47 | 10 | |
| ANTICIPO: | APLICA MONTOS: \$0.00 | NO APLICA PORCENTAJE: 0.00 | |
| | FECHA DE PAGO: | 24/07/2023 | |

| B) REPORTE | | |
|-------------------------|--------|--------|
| MONTO PAGADO EN EL MES: | EXISTE | FECHAS |
| | \$0.00 | |
| MONTO PAGADO ACUMULADO: | \$0.00 | |
| FINIQUITO CON IVA: | \$0.00 | |
| ACTA ENTREGA RECEPCIÓN: | | |

| AVANCE FÍSICO REAL | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATRASO (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|--------------|----------------------|----------------|
| TIPO DE FIANZA: | ANTICIPO | CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS |
| MONTO AFIANZADO: | | \$120,933.21 | |
| AFIANZADORA: | | INSTITUCION DE GARAN | |
| No. DE FIANZA: | | 23A26855 | |
| FECHA: | | 19/05/2023 | |
| CONVENIO MODIFICATORIO: | MONTO EXISTE | IMPORTE/PERIODO | FECHA |
| | PLAZO | INICIAL FINAL | |
| | NO APLICA X | | |
| MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: | | \$1,402,825.25 | C/IVA |

OBSERVACIONES:

OBRA EN CONSTRUCCION.



Ing. Civil Erik Pérez Álvarez
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Diana Guadalupe García
SUPERVISOR DE OBRAS

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLÁN, VER.

RE FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS


DATOS GENERALES

| | | |
|---|---------------------------------|--|
| Municipio: TIHUATLÁN | Localidad: PLAN DE AYALA | Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2023 |
| No. de obra: 2023301750034 | Periodo: JUNIO | Número de estimación: N/A |
| Descripción: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO RAMIREZ" TURNO MATUTINO CLAVE 30DPR2023P DE LA | | Fuente de financiamiento: FAISMUN |
| | | Fecha de revisión: 22/07/2023 |



Concepto de obra ejecutado:

Construcción de muro de tabique rojo de 14 CM.

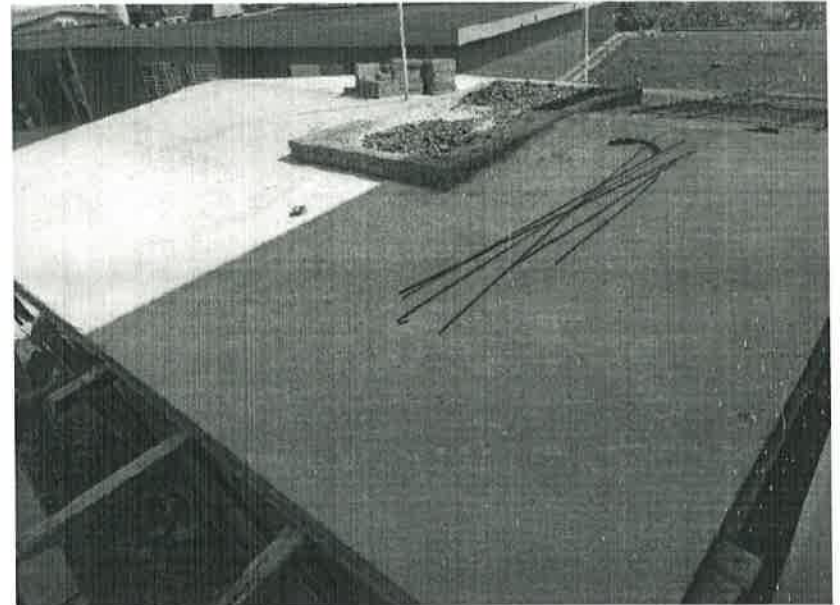

Concepto de obra ejecutado:

Construcción de losa de concreto armado de 10 CM de espesor.

Observaciones:

Empty box for observations.




 Luis Ricardo López Pérez
Supervisor de Obras

ING.
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



**H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLAN, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**

| |
|--|
| FECHA DE ELABORACION: 22/07/2023 |
| MES QUE SE REPORTA JUNIO |

EJERCICIO 2023

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

| | | |
|--|-----------------------------------|--|
| MUNICIPIO: TIHUATLAN | LOCALIDAD: PLAN DE AYALA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO RAMIREZ" TURNO MATUTINO CLAVE 30DPR2023P DE LA LOCLIDAD DE PLAN DE AYALA, TIHUATLAN, VER |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FAISMUN | No. DE OBRA: 2023301750034 | |

| ANTECEDENTES: | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|----------|---|-------|-----------------------------|----------|---|--|--|
| CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI <input checked="" type="checkbox"/> X NO <input type="checkbox"/> | | | GRADO DE REZAGO SOCIAL: | | | | | | |
| OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: | | | TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: | | | | | | |
| TIPO DE ZONA: RURAL URBANA X | CLAVE AGEB: 0347 | MUY ALTO | ALTO | MEDIO | BAJO | MUY BAJO | X | | |
| SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI <input checked="" type="checkbox"/> X NO <input type="checkbox"/> | | | TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: | | | | | | |
| SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO SI <input checked="" type="checkbox"/> X NO <input type="checkbox"/> | | | DIRECTA X COMPLEMENTARIA RESTRINGIDA | | | | | | |
| COORDENADAS DE GEORREFERENCIA | | | | | | | | | |
| LATITUD 0.000000000 | | | | | LONGITUD 0.000000000 | | | | |

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
Se realizara la construccion de sanitarios en la escuela primaria Ignacio Ramirez de la localidad Plan de Ayala a base de zapatas aisladas de 0.80 x 0.80 x 0.15 cm de concreto armado DE F'C=200 KG/CM2, muros de tabique de barro rojo recocido común de 14 cm y losa de concreto armado f'c= 200 kg/cm2 de 0.10 m de espesor.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
SE REALIZA CONSTRUCCION DE MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO COMUN DE 14 CM. DE ESPESOR, POSTERIORMENTE SE REALIZA CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO F'C= 200 KG/CM2 DE 0.10 m DE ESPESOR REFORZADA CON VS 3/8" DE DIAM

| C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA* | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|----------------|--------|----------|---------------------------------------|--------------------|----------|--------------|
| No. EST. | MONTO CON IVA | PÓLIZAS CHEQUE | | FACTURAS | | | | IMPORTE NETO |
| | | No. | MONTO | No. | IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACION | AMORTIZADO CON IVA | 5 MILLAR | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTALES | \$0.00 | | \$0.00 | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

| | | |
|--|---|----------|
| MONTO AUTORIZADO: | \$612,811.26 | C/IVA |
| MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: | \$614,540.00 | C/IVA |
| VALIDACIÓN DEL PROYECTO: | EXISTE NO EXISTE NO APLICA | X |
| DEPENDENCIA QUE VALIDA: | | |
| FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: | EXISTE NO EXISTE NO APLICA | X |
| DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: | | |
| PERMISOS Y CONCESIONES: | EXISTE X NO EXISTE NO APLICA | |
| DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS: | AYUNTAMIENTO | |
| TIPO DE LICITACIÓN: | ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA | EXISTE X |

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|
| NO. DE CONTRATO: | MTI-AD-FAISMUN/2023/30/175/0034 | FECHA: | 15/05/2023 |
| CONTRATISTA: | ANDRÉS CASTILLO MORGADO | | |
| RFC: | CAMA760502FCO | | |
| MONTO CONTRATADO: | \$612,811.26 | | C/IVA |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO | PROGRAMADA | REAL |
| | TÉRMINO | 17/05/2023 | 17/05/2023 |
| | DÍAS | 15/07/2023 | 15 |
| ANTICIPO: | APLICA | X | NO APLICA |
| | MONTO: | \$183,843.37 | PORCENTAJE: 30.00 |
| | FECHA DE PAGO: | 60 | |

| B) REPORTE | | |
|--------------------------------|--------|--------|
| | EXISTE | FECHAS |
| MONTO PAGADO EN EL MES: | \$0.00 | |
| MONTO PAGADO ACUMULADO: | \$0.00 | |
| FINIQUITO CON IVA: | \$0.00 | |
| ACTA ENTREGA RECEPCIÓN: | | |

| AVANCE FÍSICO REAL | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATRASO (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| TIPO DE FIANZA: | ANTICIPO | CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS |
| MONTO AFIANZADO: | \$183,843.38 | \$52,828.55 | |
| AFIANZADORA: | ASERTA, S.A. DE C.V. | ASERTA, S.A. DE C.V. | |
| No. DE FIANZA: | 3616-23233-1 | 3616-23234-0 | |
| FECHA: | 15/05/2023 | 15/05/2023 | |
| CONVENIO MODIFICATORIO: | MONTO | EXISTE | IMPORTE/PERIODO |
| | PLAZO | NO APLICA X | FECHA |
| MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: | \$612,811.26 | | C/IVA |



Ing. Civil Erik Pérez Álvarez
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Luis Ricardo Lopez Pérez
SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLÁN, VER.




RE FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------|------------|----------------------------------|----------------|
| Municipio: | TIHUATLÁN | Localidad: | TECOXTEMPA | Ejercicio fiscal: | EJERCICIO 2023 |
| No. de obra: | 2023301750035 | Periodo: | JUNIO | Número de estimación: | N/A |
| Descripción: | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO(S) EN ÁREA(S) DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA | | | Fuente de financiamiento: | FAISMUN |
| | | | | Fecha de revisión: | 24/07/2023 |



Concepto de obra ejecutado: Construcción de cancha de concreto simple de 10 CM de espesor con malla electrosoldada.

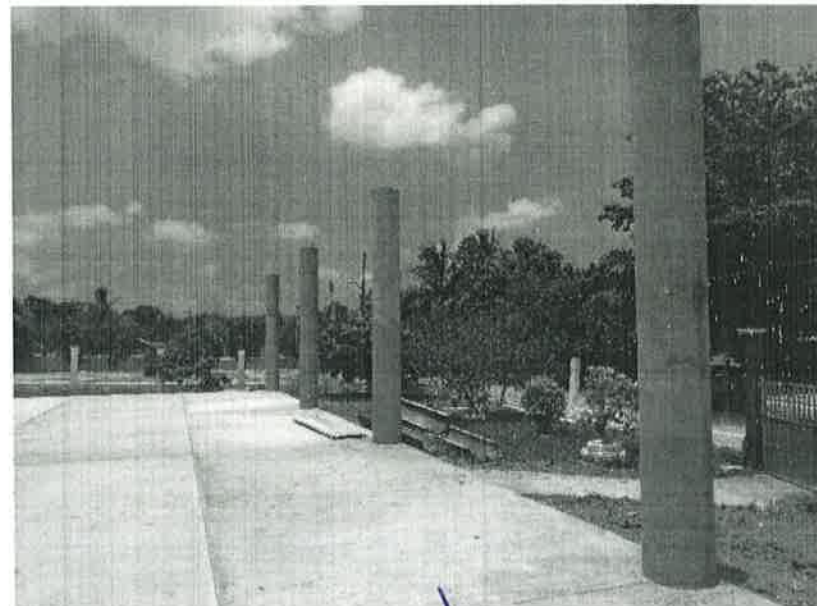

Concepto de obra ejecutado: Construcción de columnas de concreto armado $f_c = 200 \text{ Kg/cm}^2$ de 45 CM de diámetro.

Observaciones:

NINGUNA



Luis Edgar Ramos Hernández
Supervisor de Obras

ING.
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLAN, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2023

FECHA DE ELABORACION:
24/07/2023
MES QUE SE REPORTA
JUNIO

| A) PLANEACION Y DATOS GENERALES | | | |
|---|-----------|-------------------------|---------------|
| MUNICIPIO: | TIHUATLÁN | LOCALIDAD: | TECOXTEMPA |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | FAISMUN | No. DE OBRA: | 2023301750035 |
| | | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: | |
| CONSTRUCCIÓN DE TECHADO(S) EN ÁREA(S) DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA" CLAVE 30DPR1181Y DE LA LOCALIDAD DE TECOXTEMPA II, TIHUATLAN, VER | | | |

| ANTECEDENTES: | | | |
|--------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------|
| CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: | SI | X | NO |
| OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: | | | |
| TIPO DE ZONA: | RURAL X | CLAVE AGEB: | N/A |
| SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: | SI X NO | MUY ALTO | ALTO MEDIO X BAJO MUY BAJO |
| SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO | SI X NO | TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: | |
| | | DIRECTA X | COMPLEMENTARIA RESTRINGIDA |
| COORDENADAS DE GEORREFERENCIA | | | |
| LATITUD | 0.00000000 | LONGITUD | 0.00000000 |

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

SE CONSTRUIRA UN TECHADO CON CUBIERTA METALICA EN LAMINA PINTRO ALUM CAL. 22 DE 12 CM DE PERALTE ROLADA EN FRIJO EN EL SITIO DE LA OBRA, SISTEMA ATORNILLABLE, CANCHA DE CONCRETO SIMPLE DE 10CM DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLADA, Y COLUMNAS DE 45 CM DE DIAMETRO DESPLANTADAS CON ZAPATAS AISLADAS DE 1.40X1.40X0.25.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

SE PRESENTA EL 60% DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA CON LA CONSTRUCCION DE ZAPATAS AISLADAS DE 1.40X1.40X0.25, ARMADO Y COLADO DE COLUMNAS DE 45CM DE DIAMETRO, ASI COMO EL COLADO DE FIRME PARA CANCHA DE CONCRETO SIMPLE DE 10CM DE ESPESOR.

| C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA* | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|----------------|--------|-----|---------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|--------|--------------|
| No. EST. | MONTO CON IVA | POLIZAS CHEQUE | | No. | IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN | AMORTIZADO CON IVA | FACTURAS | | | IMPORTE NETO |
| | | No. | MONTO | | | | 5 MILLAR | CARGOS ADICIONALES | | |
| TOTALES | \$0.00 | | \$0.00 | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

| | | |
|---|---|-------------|
| MONTO AUTORIZADO: | \$1,724,039.32 | C/IVA |
| MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: | \$1,940,750.00 | C/IVA |
| VALIDACIÓN DEL PROYECTO: | EXISTE NO EXISTE | NO APLICA X |
| DEPENDENCIA QUE VALIDA: | | |
| FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: | EXISTE NO EXISTE | NO APLICA X |
| DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: | | |
| PERMISOS Y CONCESIONES: | EXISTE NO EXISTE | NO APLICA X |
| DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS: | | EXISTE |
| TIPO DE LICITACIÓN: | ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA | X |

| | | | |
|-----------------------|--|---------------------------|------------|
| NO. DE CONTRATO: | MTI-IR-FAISMUN/2023/30/175/0035 | FECHA: | 30/05/2023 |
| CONTRATISTA: | CORPORATIVO CONSTRUCTOR DANIMAR SA DE CV | | |
| RFC: | CCD170706F47 | | |
| MONTO CONTRATADO: | \$1,724,039.32 | | C/IVA |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | PROGRAMADA | REAL | |
| | INICIO 01/06/2023 | 01/06/2023 | |
| | TÉRMINO 24/07/2023 | | |
| | DÍAS 54 | 30 | |
| ANTICIPO: | APLICA MONTO: \$0.00 | NO APLICA PORCENTAJE 0.00 | X |
| | FECHA DE PAGO: | 24/07/2023 | |

| B) REPORTE | | |
|-------------------------|--------|------------|
| | EXISTE | FECHAS |
| MONTO PAGADO EN EL MES: | \$0.00 | |
| MONTO PAGADO ACUMULADO: | \$0.00 | 30/06/2023 |
| FINIQUITO CON IVA: | \$0.00 | |
| ACTA ENTREGA RECEPCIÓN: | | |

| AVANCE FÍSICO REAL | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATRASO (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|-------------|--------------------------------------|----------------|
| TIPO DE FIANZA: | ANTICIPO | CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS |
| MONTO AFIANZADO: | | \$148,624.08 | |
| AFIANZADORA: | | DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA | |
| No. DE FIANZA: | | 23A29909 | |
| FECHA: | EXISTE | 30/05/2023 | FECHA |
| | | IMPORTE PERIODO | |
| CONVENIO MODIFICATORIO: | MONTO PLAZO | INICIAL FINAL | |
| | NO APLICA X | | |
| MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: | | \$1,724,039.32 | C/IVA |

OBSERVACIONES:

NINGUNA



Ing. Erik Pérez Álvarez
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Luis Edgar Ríos Hernández
SUPERVISOR DE OBRAS

*En caso de requerir más folios en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja



H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLÁN, VER.

REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------|-------------|----------------------------------|----------------|
| Municipio: | TIHUATLÁN | Localidad: | SAN NICOLÁS | Ejercicio fiscal: | EJERCICIO 2023 |
| No. de obra: | 2023301750040 | Periodo: | JUNIO | Número de estimación: | N/A |
| Descripción: | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON PAVIMENTO HIDRAULICO A LA LOCALIDAD SAN NICOLAS, TIHUATLAN, VER. | | | Fuente de financiamiento: | FAISMUN |
| | | | | Fecha de revisión: | 24/07/2023 |



Concepto de obra ejecutado: Tendido y compactacion de material de banco



Concepto de obra ejecutado: Corte de talud

Renato Sebastián Zamora Rosado

Supervisor de Obras

ING.

Profesión del Supervisor

Observaciones:
LA ESTIMACION 1(UNO)NORMAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISION Y PAGO



- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLAN, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
EJERCICIO 2023

FECHA DE ELABORACION:
24/07/2023
MES QUE SE REPORTA
JUNIO

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

| | | |
|--|-----------------------------------|--|
| MUNICIPIO: TIHUATLAN | LOCALIDAD: SAN NICOLAS | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON PAVIMENTO HIDRAULICO A LA LOCALIDAD SAN NICOLAS, TIHUATLAN, VER. |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FAISMUN | No. DE OBRA: 2023301750040 | |

| | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---|--------------------------------------|---|
| CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: | | SI | NO | X |
| OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: | | | | |
| TIPO DE ZONA: | RURAL X URBANA | CLAVE AGE: | N/A | |
| SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: | SI X NO | TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: | DIRECTA X COMPLEMENTARIA RESTRINGIDA | |
| SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO | SI X NO | | | |
| COORDENADAS DE GEORREFERENCIA | | | | |
| LATITUD | 0.000000000 | LONGITUD | 0.000000000 | |

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
 SE REALIZARA UN PAVIMENTO HIDRAULICO CON UNA LONGITUD DE 490ML X 6M DE ANCHO UN TOTAL DE 2,940 M2

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
 SE HA REALIZADO UN 35% DE LA OBRA DONDE SE PREPARO TODA LA TERRACERIA DEL TRAMO A REALIZAR CON EL AFINE Y COMPACTACION DEL AREA CON EL MATERIAL DE BANCO , ASI COMO CORTE DE TALUD EN ALGUNOS TRAMOS DEL CAMINO

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

| No. EST. | MONTO CON IVA | PÓLIZAS CHEQUE | | FACTURAS | | | | | | |
|----------|---------------|----------------|--------|----------|---------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------|--------|
| | | No. | MONTO | No. | IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACION | AMORTIZADO CON IVA | 5 MILLAR | CARGOS ADICIONALES | IMPORTE NETO | |
| TOTALES | \$0.00 | | \$0.00 | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

| | | |
|--|---|----------|
| MONTO AUTORIZADO: | \$3,449,472.08 | C/IVA |
| MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: | \$3,450,916.38 | C/IVA |
| VALIDACIÓN DEL PROYECTO: | EXISTE NO EXISTE NO APLICA | X |
| DEPENDENCIA QUE VALIDA: | | |
| FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: | EXISTE NO EXISTE NO APLICA | X |
| DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: | | |
| PERMISOS Y CONCESIONES: | EXISTE X NO EXISTE NO APLICA | |
| DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS: | H. AYUNTAMIENTO, TIHUATLAN, VER. | |
| TIPO DE LICITACIÓN: | ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA | EXISTE X |

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------|---------------|------------|
| NO. DE CONTRATO: | MTH-IR-FAISMUN/2023/30/175/0040 | FECHA: | 30/05/2023 |
| CONTRATISTA: | IRAZEMA AMADA JIMENEZ MALDONADO | | |
| RF: | JIMI800212FD3 | | |
| MONTO CONTRATADO: | \$3,449,472.08 | C/IVA | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO PROGRAMADA 01/06/2023 | REAL | 01/06/2023 |
| | TÉRMINO 20/08/2023 | | |
| | DÍAS 81 | | 30 |
| ANTICIPO: | APLICA MONTOS: \$0.00 | NO APLICA | X |
| | FECHA DE PAGO: | 24/07/2023 | 0.00 |

B) REPORTE

| | | |
|--------------------------------|--------|------------|
| | EXISTE | FECHAS |
| MONTO PAGADO EN EL MES: | \$0.00 | |
| MONTO PAGADO ACUMULADO: | \$0.00 | 30/06/2023 |
| FINIQUITO CON IVA: | \$0.00 | |
| ACTA ENTREGA RECEPCIÓN: | | |

AVANCE FÍSICO REAL

| AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATRASO (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

OBSERVACIONES:
 LA ESTIMACION 1(UNO) NORMAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISION Y PAGO

| | | | | | |
|--|----------------|--|-----------------|------------------------|--|
| TIPO DE FIANZA: | ANTICIPO | CUMPLIMIENTO: | \$297,368.28 | VICIOS OCULTOS: | |
| MONTO AFIANZADO: | | AFIANZADORA: ASERTA, S.A DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA | | | |
| No. DE FIANZA: | | 3368250 | | | |
| FECHA: | | 30/05/2023 | | | |
| | MONTO | EXISTE | IMPORTE/PERIODO | FECHA | |
| CONVENIO MODIFICATORIO: | PLAZO | INICIAL | FINAL | | |
| | NO APLICA | X | | | |
| MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: | \$3,449,472.08 | C/IVA | | | |



Ing. Civil Erik Pérez Álvarez
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Renato Rosado Zamora Rosado
SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.




H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLÁN, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|
| Municipio: | TIHUATLÁN | Localidad: | PUENTE DEL MUERTO | Ejercicio fiscal: | EJERCICIO 2023 |
| No. de obra: | 2023301750041 | Periodo: | JUNIO | Número de estimación: | 1(UNO) NORMAL |
| Descripción: | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON PAVIMENTO HIDRAULICO A LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, TIHUATLAN, VER. | | | Fuente de financiamiento: | FAISMUN |
| | | | | Fecha de revisión: | 24/07/2023 |

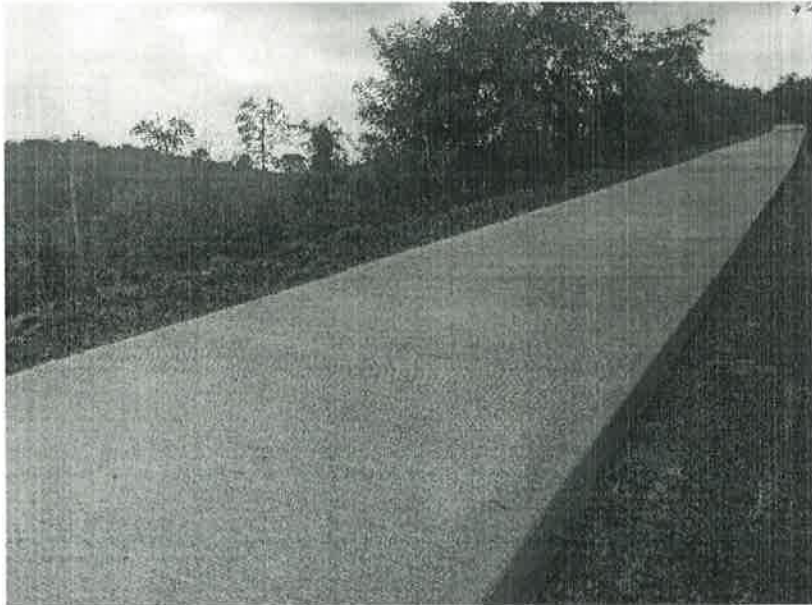

Concepto de obra ejecutado: Pavimento de concreto hidraulico fc=250kg//cm2



Concepto de obra ejecutado: Colocación de barra de amarre con varilla corrugada

Observaciones:

NINGUNA

Renato Sebastián Zamora Rosado

Supervisor de Obras

ING.

Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis





H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLAN, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
EJERCICIO 2023

FECHA DE ELABORACION:
24/07/2023
MES QUE SE REPORTA
JUNIO

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO: TIHUATLAN **LOCALIDAD:** PUENTE DEL MUERTO **DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:** REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON PAVIMENTO HIDRAULICO A LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, TIHUATLAN, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FAISMUN **No. DE OBRA:** 2023301750041

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO

OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: **GRADO DE REZAGO SOCIAL:**

TIPO DE ZONA: RURAL X URBANA **CLAVE AGEB:** N/A **MUY ALTO** **ALTO** X **MEDIO** **BAJO** **MUY BAJO**

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO **TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:**

SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI X NO **DIRECTA** X **COMPLEMENTARIA** **RESTRINGIDA**

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA

LATITUD: 0.000000000 **LONGITUD:** 0.000000000

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

LA OBRA A REALIZAR SE HARA UN PAVIMENTO HIDRAULICO DE 490 ML Y 3185M2 DE CONCRETO HIDRULICO

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

LA OBRA SE ENCUENTRA A UN 60% CON EL SUMINISTRO DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA ,TERMIANDO ASI LA PRIMERA ALA DEL CAMINO RURAL

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

| No. EST. | MONTO CON IVA | PÓLIZAS CHEQUE | | FACTURAS | | | | | |
|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| | | No. | MONTO | No. | IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN | AMORTIZADO CON IVA | 5 MILLAR | CARGOS ADICIONALES | IMPORTE NETO |
| 1(UNO) NORMAL | \$2,121,430.81 | 02 | \$2,112,286.71 | 519BD821 | \$2,121,430.81 | \$0.00 | \$9,144.10 | \$0.00 | \$2,112,286.71 |
| TOTALES | \$2,121,430.81 | | \$2,112,286.71 | | \$2,121,430.81 | \$0.00 | \$9,144.10 | \$0.00 | \$2,112,286.71 |

MONTO AUTORIZADO: \$3,383,733.41 C/IVA

MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: \$3,385,259.08 C/IVA

VALIDACIÓN DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE NO APLICA X

DEPENDENCIA QUE VALIDA: NO APLICA

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE NO APLICA X

DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: NO APLICA

PERMISOS Y CONCESIONES: EXISTE X NO EXISTE NO APLICA

DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS: H. AYUNTAMIENTO, TIHUATLAN, VER. EXISTE

TIPO DE LICITACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA X

NO. DE CONTRATO: MTI-IR-FAISMUN/2023/30/175/0041 **FECHA:** 08/05/2023

CONTRATISTA: IRAZEMA AMADA JIMENEZ MALDONADO

RFC: JIMI800212FD3

MONTO CONTRATADO: \$3,383,733.41 C/IVA

PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO PROGRAMADA REAL 10/05/2023 10/05/2023

ANTICIPO: TÉRMINO DÍAS 31/07/2023 83 22

APLICA MONTO: \$0.00 NO APLICA X PORCENTAJE: 0.00

FECHA DE PAGO: 24/07/2023

B) REPORTE

| | EXISTE | FECHAS |
|--------------------------------|----------------|------------|
| MONTO PAGADO EN EL MES: | \$2,121,430.81 | 30/06/2023 |
| MONTO PAGADO ACUMULADO: | \$2,121,430.81 | 30/06/2023 |
| FINIQUITO CON IVA: | \$0.00 | |
| ACTA ENTREGA RECEPCIÓN: | | |

AVANCE FÍSICO REAL

| AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATRASO (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

OBSERVACIONES:

NINGUNA

TIPO DE FIANZA: ANTICIPO

MONTO AFIANZADO: \$291,701.15

AFIANZADORA: ASERTA, S.A DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA

No. DE FIANZA: 3616-23396-9

FECHA: 08/05/2023

CONVENIO MODIFICATORIO: MONTO EXISTE IMPORTE/PERIODO FECHA

PLAZO: INICIAL FINAL

NO APLICA X

MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: \$3,383,733.41 C/IVA

Ing. Civil Erik Pérez Álvarez
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Renato Zamora Rosado
SUPERVISOR DE OBRAS



FORMATO 11

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLÁN, VER.

REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

| | | |
|---|----------------------------|--|
| Municipio: TIHUATLÁN | Localidad: OCOTEPEC | Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2023 |
| No. de obra: 2023301750042 | Periodo: JUNIO | Número de estimación: |
| Descripción: REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES REHABILITACION DE CAMINO RURAL A LA LOCALIDAD OCOTEPEC, TIHUATLAN, VER. | | Fuente de financiamiento: FAISMUN |
| | | Fecha de revisión: 24/07/2023 |



Concepto de obra ejecutado:

Rehabilitación de camino



Concepto de obra ejecutado:

Material de banco

Observaciones:

LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO SIN PROBLEMA ALGUNO



Diana Ríos García
Diana Guadalupe Ríos García

Supervisor de Obras

ING.

Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLÁN, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS


DATOS GENERALES

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------|---------------------|----------------------------------|----------------|
| Municipio: | TIHUATLÁN | Localidad: | ANTONIO M. QUIRASCO | Ejercicio fiscal: | EJERCICIO 2023 |
| No. de obra: | 2023301750046 | Periodo: | JUNIO | Número de estimación: | N/A |
| Descripción: | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD ANTONIO M. QUIRASCO, TIHUATLAN, VER. | | | Fuente de financiamiento: | FAISMUN |
| | | | | Fecha de revisión: | 24/07/2023 |



Concepto de obra ejecutado:

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO

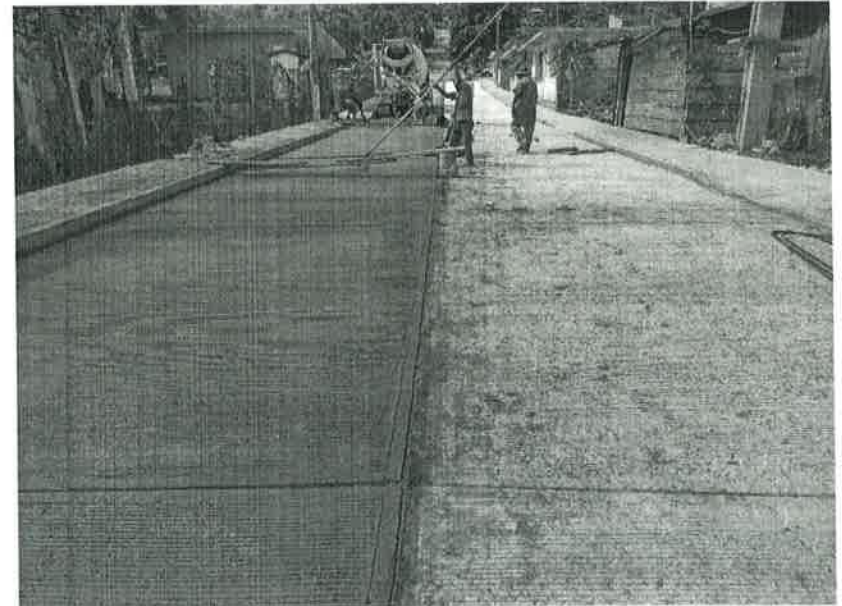

Concepto de obra ejecutado:

PAVIMENTO DE 18 CM DE ESPESOR

Observaciones:

Empty dashed box for observations.



Juan Manuel Romero Cuevas
Supervisor de Obras

ARQ.
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLÁN, VER.

RE FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

| | | |
|---|---------------------------------|--|
| Municipio: TIHUATLÁN | Localidad: PLAN DE AYALA | Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2023 |
| No. de obra: 2023301750051 | Periodo: JUNIO | Número de estimación: N/A |
| Descripción: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE LAS CALLES MONTES DE OCA Y LIBERTAD DE LA | | Fuente de financiamiento: FAISMUN |
| | | Fecha de revisión: 22/07/2023 |



Concepto de obra ejecutado:

Construcción de muro de piedra braza



Concepto de obra ejecutado:

Construcción de muro armado

Observaciones:

Empty box for observations.




 Luis Ricardo Lopez Pérez
Supervisor de Obras

ING.
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfís


**H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLÁN, VER.****RE FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS****DATOS GENERALES**

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------|-----------|----------------------------------|----------------|
| Municipio: | TIHUATLÁN | Localidad: | JILIAPA I | Ejercicio fiscal: | EJERCICIO 2023 |
| No. de obra: | 2023301750052 | Periodo: | JUNIO | Número de estimación: | N/A |
| Descripción: | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE REVOLUCION Y CALLE JOSE MARIA MORELOS DE LA LOCALIDAD JILIAPA I, | | | Fuente de financiamiento: | FAISMUN |
| | | | | Fecha de revisión: | 24/07/2023 |



Concepto de obra ejecutado:

Construcción de tope con concreto $fc=250 \text{ kg/cm}^2$

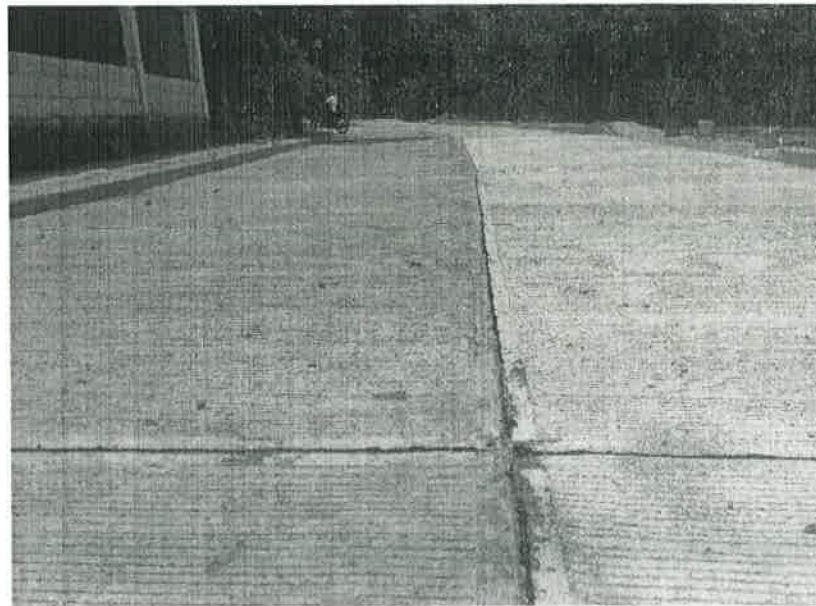

Concepto de obra ejecutado:

Suministro y colocación de sello para Calafateo

Observaciones:

LA ESTIMACION 1(UNO) FINIQUITO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO Y REVISION



Renato Sebastián Zamora Rosado

Supervisor de Obras

ING.

Profesión del Supervisor

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLÁN, VER.

RE FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------|
| Municipio: | TIHUATLÁN | Localidad: | PLAN DE AYALA | Ejercicio fiscal: | EJERCICIO 2023 |
| No. de obra: | 2023301750060 | Periodo: | JUNIO | Número de estimación: | N/A |
| Descripción: | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL CALLEJON MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE VERACRUZ Y LINDERO (SECTOR MEXICO) DE | | | Fuente de financiamiento: | FAISMUN |
| | | | | Fecha de revisión: | 24/07/2023 |



Concepto de obra ejecutado: Cimbrado para construcción de guarnición de concreto simple de sección 15 x 20 x 50 cm.



Concepto de obra ejecutado: Contrucción de guarnición de concreto simple de sección 15 x 20 x 50 cm

Observaciones:

Empty dashed box for observations.



[Signature]
Luis Ricardo López Pérez
Supervisor de Obras

ING.
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLAN, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
EJERCICIO 2023

FECHA DE ELABORACIÓN:
24/07/2023
MES QUE SE REPORTA
JUNIO

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

| | | |
|--|-----------------------------------|--|
| MUNICIPIO: TIHUATLAN | LOCALIDAD: PLAN DE AYALA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL CALLEJON MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE VERACRUZ Y LINDERO (SECTOR MEXICO) DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA, TIHUATLAN, VER. |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FAISMUN | No. DE OBRA: 2023301750060 | |

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: | | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: | | GRADO DE REZAGO SOCIAL: |
| TIPO DE ZONA: RURAL URBANA X | CLAVE AGE: 0525 | MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO X |
| SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: |
| SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | DIRECTA COMPLEMENTARIA X RESTRINGIDA |
| COORDENADAS DE GEORREFERENCIA | | |
| LATITUD 0.00000000 | LONGITUD 0.00000000 | |

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
 SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL CALLEJON MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA MIEDIANTE CONCRETO HIDRAULICO DE 18 CM DE ESPESOR DE UN F'C= 250 KG/CM2 ASI TAMBIEN SE CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE DE SECCION 15 X 20 X 50 CM.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
 SE REALIZA LA CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE SECCION 15X20X50 CMS Y UN F'C= 150 KG/CM2.

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

| No. EST. | MONTO CON IVA | PÓLIZAS CHEQUE | | FACTURAS | | | | | IMPORTE NETO |
|----------|---------------|----------------|--------|----------|---------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------|
| | | No. | MONTO | No. | IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN | AMORTIZADO CON IVA | 5 MILLAR | CARGOS ADICIONALES | |
| TOTALES | \$0.00 | | \$0.00 | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

| | | |
|--|---|--------------|
| MONTO AUTORIZADO: | \$416,187.90 | C/IVA |
| MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: | \$417,104.00 | C/IVA |
| VALIDACIÓN DEL PROYECTO: | EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input checked="" type="checkbox"/> | NO APLICA |
| DEPENDENCIA QUE VALIDA: | | |
| FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: | EXISTE <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> | NO APLICA |
| DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: | | AYUNTAMIENTO |
| PERMISOS Y CONCESIONES: | EXISTE <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> | NO APLICA |
| DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS: | | AYUNTAMIENTO |
| TIPO DE LICITACIÓN: | ADJUDICACIÓN DIRECTA <input type="checkbox"/> INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS <input type="checkbox"/> LICITACIÓN PÚBLICA <input checked="" type="checkbox"/> | |

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------|---|------------|
| NO. DE CONTRATO: | MTI-AD-FAISMUN/2023/30/175/0060 | FECHA: | 22/06/2023 |
| CONTRATISTA: | MARIA MAGDALENA FERNANDEZ ROJAS | | |
| RFC: | FERM761211F38 | | |
| MONTO CONTRATADO: | \$416,187.90 | C/IVA | |
| | PROGRAMADA | REAL | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO 26/06/2023 | TÉRMINO 29/06/2023 | |
| | DÍAS 45 | | 2 |
| ANTICIPO: | APLICA <input type="checkbox"/> | NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | MONTO: \$0.00 | PORCENTAJE: 0.00 | |
| | FECHA DE PAGO: | | 24/07/2023 |

B) REPORTE

| | | |
|--------------------------------|--------|--------|
| | EXISTE | FECHAS |
| MONTO PAGADO EN EL MES: | \$0.00 | |
| MONTO PAGADO ACUMULADO: | \$0.00 | |
| FINIQUITO CON IVA: | \$0.00 | |
| ACTA ENTREGA RECEPCIÓN: | | |

AVANCE FISICO REAL

| AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATRASO (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|--|---|-----------------|----------------|
| TIPO DE FIANZA: | ANTICIPO | CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS |
| MONTO AFIANZADO: | | \$35,878.27 | |
| AFIANZADORA: | | DORAMA S A | |
| NO. DE FIANZA: | | 1804130 | |
| FECHA: | | 22/06/2023 | |
| | EXISTE | IMPORTE/PERIODO | FECHA |
| CONVENIO MODIFICATORIO: | MONTO <input type="checkbox"/> | INICIAL | FINAL |
| | PLAZO <input type="checkbox"/> | | |
| | NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: | | \$416,187.90 | C/IVA |



Ing. Civil Erik Pérez Álvarez
DIRECTOR DE OBRAS

Arq. Luis Ricardo López Pérez
SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

*En caso de requerir más filas en el apartado del estado financiero utilizar otra hoja.

H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLÁN, VER.




RE FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------|
| Municipio: | TIHUATLÁN | Localidad: | PLAN DE AYALA | Ejercicio fiscal: | EJERCICIO 2023 |
| No. de obra: | 2023301750061 | Periodo: | JUNIO | Número de estimación: | N/A |
| Descripción: | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE 12 DE OCTUBRE DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA, TIHUATLAN, VER. | | | Fuente de financiamiento: | FAISMUN |
| | | | | Fecha de revisión: | 22/07/2023 |



Concepto de obra ejecutado: Construcción de base compactada con material suministrado.

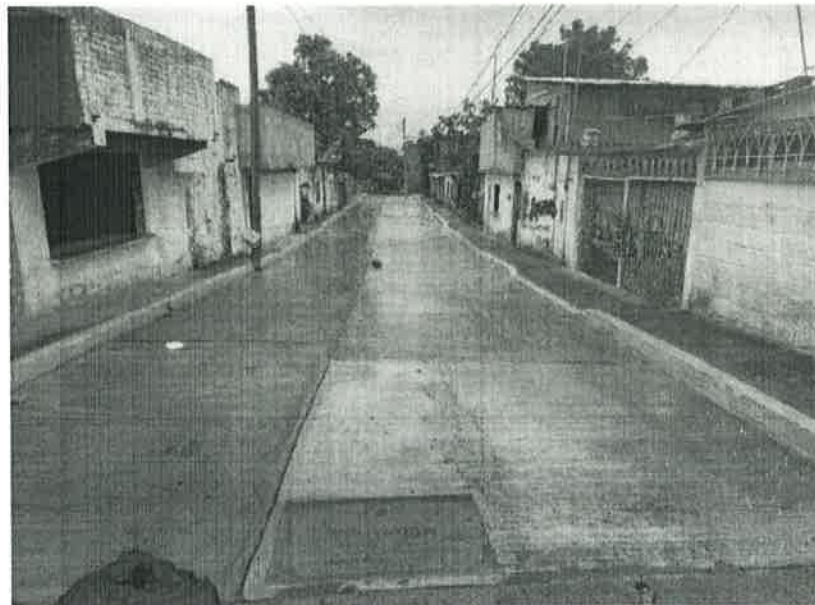

Concepto de obra ejecutado: Construcción de pavimento hidráulico de 18 CM de espesor

Observaciones:



[Signature]
 Luis Ricardo López Pérez
Supervisor de Obras

Ing.
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis




H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLÁN, VER.

RE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------|
| Municipio: | TIHUATLÁN | Localidad: | RAMIRO SÁNCHEZ ORTEGA | Ejercicio fiscal: | EJERCICIO 2023 |
| No. de obra: | 2023301750063 | Periodo: | JUNIO | Número de estimación: | NO APLICA |
| Descripción: | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RAMON CARACAS LARA, TIHUATLAN, VER. | | | Fuente de financiamiento: | FAISMUN |
| | | | | Fecha de revisión: | 24/07/2023 |

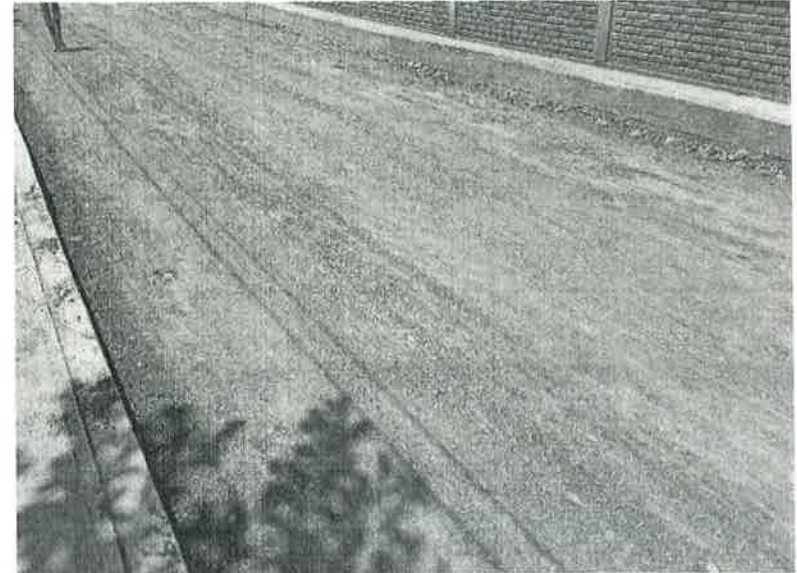

Concepto de obra ejecutado:

Se colaron banquetas

Concepto de obra ejecutado:

Preparación de base

Observaciones:

SE TERMINARON LAS GUARNICIONES Y BANQUETAS Y SE EMPEZO A TRABAJAR EN LA BASE.

Jesús Alejandro González Bonilla

Supervisor de Obras

ING.

Profesión del Supervisor



- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



**H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLAN, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**

EJERCICIO 2023

| |
|--|
| FECHA DE ELABORACION: 24/07/2023 |
| MES QUE SE REPORTA JUNIO |

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

| | | |
|--|--|---|
| MUNICIPIO: TIHUATLAN | LOCALIDAD: RAMÓN CARACAS LARA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RAMON CARACAS LARA, TIHUATLAN, VER |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FAISMUN | No. DE OBRA: 2023301750063 | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO |
| CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> | | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES: SE REALIZÓ EL TRAZO Y LA NIVELACIÓN DEL TERRENO, SE CIMBRARON Y COLARON LAS GUARNICIONES Y BANQUETAS. |
| OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: | CLAVE AGEB: N/A | GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO <input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BAJO <input type="checkbox"/> MUY BAJO <input type="checkbox"/> |
| TIPO DE ZONA: RURAL <input checked="" type="checkbox"/> URBANA <input type="checkbox"/> | SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: DIRECTA <input type="checkbox"/> COMPLEMENTARIA <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> RESTRINGIDA <input type="checkbox"/> |
| SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | | |
| COORDENADAS DE GEORREFERENCIA | | |
| LATITUD: 20.629067900 | LONGITUD: -97.597583100 | |

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

| No. EST. | MONTO CON IVA | PÓLIZAS CHEQUE | | FACTURAS | | | | | IMPORTE NETO |
|----------------|---------------|----------------|--------|----------|---------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------|
| | | No. | MONTO | No. | IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN | AMORTIZADO CON IVA | 5 MILLAR | CARGOS ADICIONALES | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTALES | \$0.00 | | \$0.00 | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

| | | |
|--|---|-------|
| MONTO AUTORIZADO: | \$2,127,440.00 | C/IVA |
| MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: | \$2,128,215.00 | C/IVA |
| VALIDACIÓN DEL PROYECTO: | EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input checked="" type="checkbox"/> NO APLICA <input type="checkbox"/> | |
| DEPENDENCIA QUE VALIDA: | | |
| FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: | EXISTE <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input type="checkbox"/> | |
| DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: | EL AYUNTAMIENTO DE TIHUATLAN | |
| PERMISOS Y CONCESIONES: | EXISTE <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input type="checkbox"/> | |
| DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS: | EL AYUNTAMIENTO DE TIHUATLAN | |
| TIPO DE LICITACIÓN: | ADJUDICACIÓN DIRECTA <input type="checkbox"/> INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS <input checked="" type="checkbox"/> LICITACIÓN PÚBLICA <input type="checkbox"/> | |

| | | | |
|------------------------------|--|---|------------------|
| NO. DE CONTRATO: | MTI-IR-FAISMUN/2023/30/175/0063 | FECHA: | 20/05/2023 |
| CONTRATISTA: | AMALIA GARCIA GONZALEZ | | |
| RFC: | GAGA870522FHA | | |
| MONTO CONTRATADO: | \$2,127,440.00 | | C/IVA |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO 22/05/2023 TÉRMINO 31/07/2023 DÍAS 71 | REAL 22/05/2023 | 10 |
| ANTICIPO: | APLICA <input type="checkbox"/> MONTO: \$0.00 | NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/> | PERCENTAJE: 0.00 |
| | FECHA DE PAGO: | | 24/07/2023 |

| B) REPORTE | | |
|--------------------------------|--------|--------|
| | EXISTE | FECHAS |
| MONTO PAGADO EN EL MES: | \$0.00 | |
| MONTO PAGADO ACUMULADO: | \$0.00 | |
| FINIQUITO CON IVA: | \$0.00 | |
| ACTA ENTREGA RECEPCIÓN: | | |

| AVANCE | AVANCE FÍSICO REAL | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATRASO (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|---|---------------------------------|---|
| TIPO DE FIANZA: | ANTIPO | CUMPLIMIENTO: | VIOS OCULTOS |
| MONTO AFIANZADO: | | \$183,400.00 | |
| AFIANZADORA: | | SOFIMEX SA | |
| No. DE FIANZA: | | 2805324 | |
| FECHA: | | 20/05/2023 | |
| CONVENIO MODIFICATORIO: | MONTO <input type="checkbox"/> PLAZO <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/> | EXISTE <input type="checkbox"/> | IMPORTE/PERIODO <input type="checkbox"/> FECHA <input type="checkbox"/> |
| | | INICIAL | FINAL |
| MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: | | \$2,127,440.00 | C/IVA |

OBSERVACIONES:



Ing. Civil Erik Pérez Álvarez
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Jesús Alejandro González Bonilla
SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.




H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLÁN, VER.

RE FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

| | | |
|--|------------------------------|--|
| Municipio: TIHUATLÁN | Localidad: EL TERRERO | Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2023 |
| No. de obra: 2023301750067 | Periodo: JUNIO | Número de estimación: |
| Descripción: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL TERRERO, TIHUATLAN, VER. | | Fuente de financiamiento: FAISMUN |
| | | Fecha de revisión: 24/07/2023 |

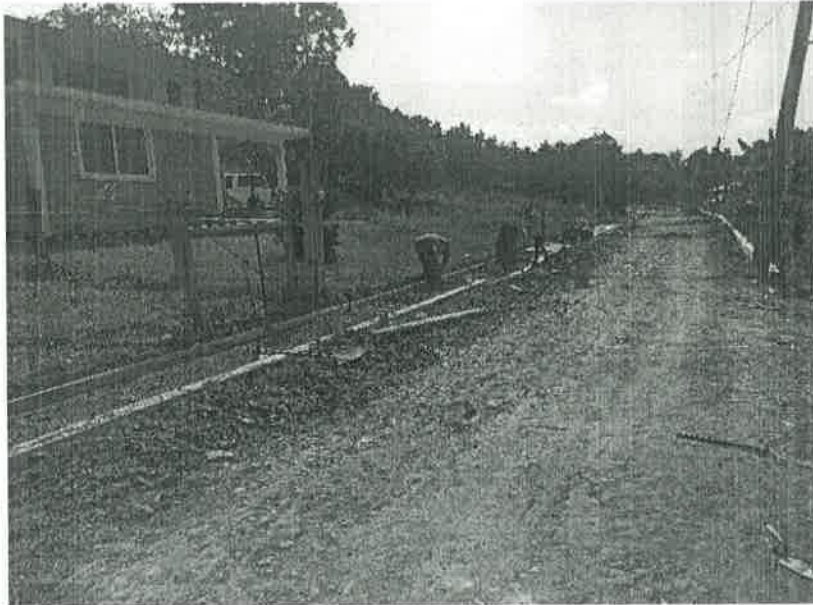

Concepto de obra ejecutado:

Elaboración de banquetas de concreto simple



Concepto de obra ejecutado:

Construcción de garnición de sección 20 *15*50 cm

Observaciones:

LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO SIN PROBLEMA ALGUNO



Diana Guadalupe Ríos García

Diana Guadalupe Ríos García

Supervisor de Obras

ING.

Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLAN, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
EJERCICIO 2023

FECHA DE ELABORACIÓN:
 24/07/2023
MES QUE SE REPORTA
 JUNIO

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|---|--|
| MUNICIPIO: TIHUATLAN | | LOCALIDAD: EL TERRERO | | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL TERRERO, TIHUATLAN, VER. | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FAISMUN | | No. DE OBRA: 2023301750067 | | | |

| | | | | | |
|---|----------------|-----------------|------------|-------------|----------|
| ANTECEDENTES: | | | | | |
| CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: | | SI | X | NO | |
| OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: | | | | | |
| TIPO DE ZONA: | | RURAL | X | URBANA | |
| CLAVE AGE: | | N/A | | | |
| GRADO DE REZAGO SOCIAL: | | | | | |
| MUY ALTO | ALTO | MEDIO | X | BAJO | MUY BAJO |
| TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: | | | | | |
| DIRECTA | COMPLEMENTARIA | X | | RESTRINGIDA | |
| COORDENADAS DE GEORREFERENCIA | | | | | |
| LATITUD | 0.00000000 | LONGITUD | 0.00000000 | | |

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

construcción de 1445.21 m2 de pavimento hidráulico

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

la obra presenta un avance del 45%

| C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA* | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|----------------|--------|----------|---------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------|--------|
| No. EST. | MONTO CON IVA | PÓLIZAS CHEQUE | | FACTURAS | | | | | | |
| | | No. | MONTO | No. | IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN | AMORTIZADO CON IVA | 5 MILLAR | CARGOS ADICIONALES | IMPORTE NETO | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| TOTALES | \$0.00 | | \$0.00 | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

| | | |
|--|---|---------------------------------|
| MONTO AUTORIZADO: | \$2,198,123.90 | C/IVA |
| MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: | \$2,199,279.00 | C/IVA |
| VALIDACIÓN DEL PROYECTO: | EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input checked="" type="checkbox"/> NO APLICA <input type="checkbox"/> | |
| DEPENDENCIA QUE VALIDA: | | |
| FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: | EXISTE <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input type="checkbox"/> | |
| DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: | AYUNTAMIENTO | |
| PERMISOS Y CONCESIONES: | EXISTE <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input type="checkbox"/> | |
| DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS: | H. AYUNTAMIENTO | EXISTE <input type="checkbox"/> |
| TIPO DE LICITACIÓN: | ADJUDICACIÓN DIRECTA <input type="checkbox"/> INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS <input type="checkbox"/> LICITACIÓN PÚBLICA <input checked="" type="checkbox"/> | |

| | | | |
|------------------------------|---|---------------|------------|
| NO. DE CONTRATO: | MTI-IR-FAISMUN/2023/10/175/0067 | FECHA: | 29/05/2023 |
| CONTRATISTA: | HERLEN GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV | | |
| RFC: | HGC1501229J3 | | |
| MONTO CONTRATADO: | \$2,198,123.90 | C/IVA | |
| | PROGRAMADA | REAL | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO 01/06/2023 | | 01/06/2023 |
| | TÉRMINO 31/07/2023 | | |
| | DÍAS 61 | | 30 |
| ANTICIPO: | APLICA <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | MONTO: \$0.00 | PORCENTAJE: | 0.00 |
| | FECHA DE PAGO: | | 24/07/2023 |

| B) REPORTE | | |
|--------------------------------|--------|--------|
| | EXISTE | FECHAS |
| MONTO PAGADO EN EL MES: | \$0.00 | |
| MONTO PAGADO ACUMULADO: | \$0.00 | |
| FINIQUITO CON IVA: | \$0.00 | |
| ACTA ENTREGA RECEPCIÓN: | | |

| AVANCE FÍSICO REAL | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATRASO (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

OBSERVACIONES:

LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO



Ing. Civil Erik Pérez Álvarez
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Diana Guadalupe Torres García
SUPERVISOR DE OBRAS

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja


H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLÁN, VER.




RE FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------|-----------|----------------------------------|----------------|
| Municipio: | TIHUATLÁN | Localidad: | TIHUATLÁN | Ejercicio fiscal: | EJERCICIO 2023 |
| No. de obra: | 2023301750068 | Periodo: | JUNIO | Número de estimación: | 1 (UNO) NORMAL |
| Descripción: | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE SANTA MARTHA DE LA COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA CABECERA | | | Fuente de financiamiento: | FAISMUN |
| | | | | Fecha de revisión: | 24/07/2023 |

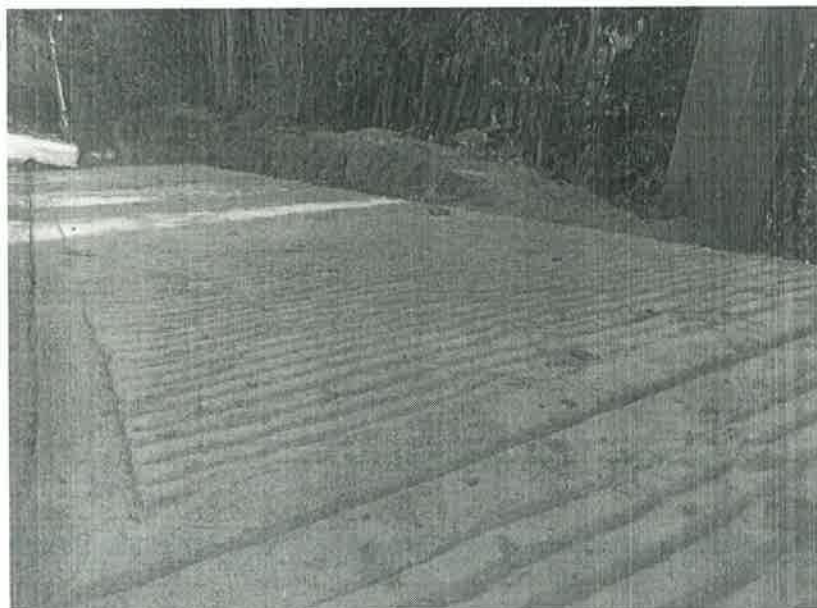

Concepto de obra ejecutado: La fotografía muestra la construcción de banqueta el punto indicado

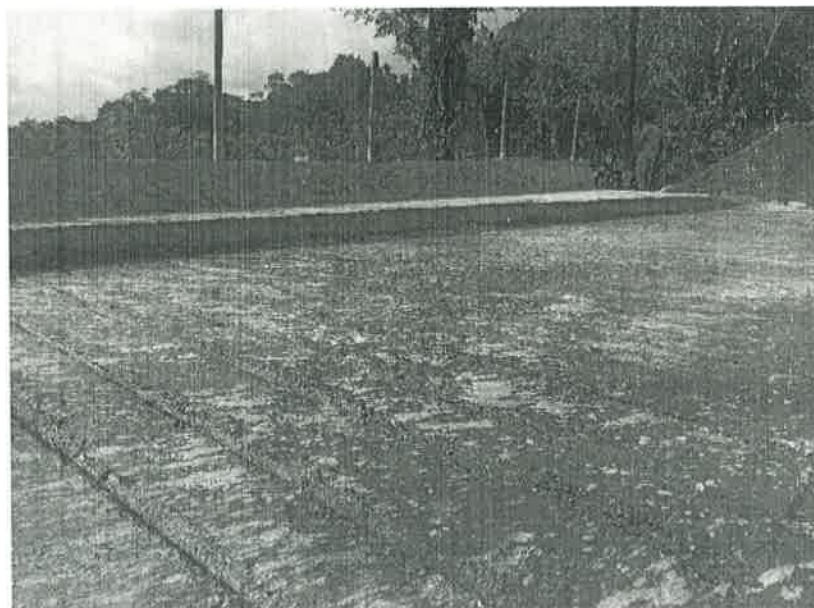

Concepto de obra ejecutado: La fotografía muestra la construcción de pavimento de concreto hidráulico en el punto indicado.

Observaciones:

OBRA CULMINADA.



Uriel Mariano Vargas Salas
Uriel Mariano Vargas Salas
Supervisor de Obras

ING.
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLAN, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FECHA DE ELABORACION:
24/07/2023
MES QUE SE REPORTA
JUNIO

EJERCICIO 2023

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

| | | | | | |
|---------------------------|-----------|--------------|---------------|-------------------------|---|
| MUNICIPIO: | TIHUATLAN | LOCALIDAD: | TIHUATLAN | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE SANTA MARTHA DE LA COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLAN, VER. |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | FAISMUN | No. DE OBRA: | 2023301750068 | | |

ANTECEDENTES:

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|----------|------------|-------------|------|----------|------|-------|------|---|----------|
| CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: | SI | X | NO | | | | | | | | |
| OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: | | | | | | | | | | | |
| TIPO DE ZONA: | RURAL | | | CLAVE AGEB: | 0582 | MUY ALTO | ALTO | MEDIO | BAJO | X | MUY BAJO |
| SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: | | | | SI | X | NO | | | | | |
| SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO | | | | SI | X | NO | | | | | |
| COORDENADAS DE GEORREFERENCIA | | | | | | | | | | | |
| LATITUD | 0.00000000 | LONGITUD | 0.00000000 | | | | | | | | |

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

476 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA.

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

| No. EST. | MONTO CON IVA | POLIZAS CHEQUE | | FACTURAS | | | | | |
|--------------|---------------|----------------|--------------|----------|---------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------|
| | | No. | MONTO | No. | IMPORTE GABA MONTO CON IVA ESTIMACION | AMORTIZADO CON IVA | 5 MILLAR | CARGOS ADICIONALES | IMPORTE NETO |
| (LINO) NORMA | \$570,467.35 | 78584 | \$568,008.44 | 45876 | \$570,467.35 | \$0.00 | \$2,458.91 | \$0.00 | \$568,008.44 |
| TOTALES | \$570,467.35 | | \$568,008.44 | | \$570,467.35 | \$0.00 | \$2,458.91 | \$0.00 | \$568,008.44 |

| | | |
|---|---|-------|
| MONTO AUTORIZADO: | \$1,444,010.80 | C/IVA |
| MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: | \$1,445,191.36 | C/IVA |
| VALIDACIÓN DEL PROYECTO: | EXISTE NO EXISTE X NO APLICA | |
| DEPENDENCIA QUE VALIDA: | | |
| FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: | EXISTE X NO EXISTE NO APLICA | |
| DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: | H. AYUNTAMIENTO, TIHUATLAN, VER. | |
| PERMISOS Y CONCESIONES: | EXISTE X NO EXISTE NO APLICA | |
| DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS: | H. AYUNTAMIENTO, TIHUATLAN, VER. | |
| TIPO DE LICITACIÓN: | ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA | X |

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------|-------------|------------------|
| NO. DE CONTRATO: | MTL08-FAISMUN/2023/10/175/0068 | FECHA: | 12/05/2023 |
| CONTRATISTA: | ELDA CECILIA FLORES JUAREZ | | |
| RFC: | FOJE751122RW5 | | |
| MONTO CONTRATADO: | \$1,444,010.80 | C/IVA | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | PROGRAMADA | REAL | |
| | INICIO | 15/05/2023 | 15/05/2023 |
| | TÉRMINO | 30/06/2023 | 30/06/2023 |
| | DÍAS | 47 | 47 |
| ANTICIPO: | APLICA MONTO: \$0.00 | NO APLICA X | PORCENTAJE: 0.00 |
| | FECHA DE PAGO: | | 24/07/2023 |

B) REPORTE

| | | |
|-------------------------|--------------|------------|
| | EXISTE | FECHAS |
| MONTO PAGADO EN EL MES: | \$570,467.35 | 30/06/2023 |
| MONTO PAGADO ACUMULADO: | \$570,467.35 | 30/06/2023 |
| FINIQUITO CON IVA: | \$0.00 | |
| ACTA ENTREGA RECEPCIÓN: | | |

AVANCE FÍSICO REAL

| AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATRASO (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|--------------|--|--|
| TIPO DE FIANZA: | ANTICIPO | CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS |
| MONTO AFIANZADO: | | \$124,483.69 | \$144,401.08 |
| AFIANZADORA: | | Aseguradora Inaugurantes SA de CV Grupo Financiero Aeria | Aseguradora Inaugurantes SA de CV Grupo Financiero Aeria |
| No. DE FIANZA: | | 3616-23171-0 | 3616-23171-1 |
| FECHA: | | 12/05/2023 | 30/06/2023 |
| CONVENIO MODIFICATORIO: | MONTO EXISTE | IMPORTE/PERIODO | FECHA |
| | PLAZO | INICIAL | FINAL |
| | NO APLICA X | | |
| MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: | | \$1,444,010.80 | C/IVA |

OBSERVACIONES:

LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA.

Ing. Civil Erik Pérez Álvarez
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Uriel Mariano Vargas Salas
SUPERVISOR DE OBRAS

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLÁN, VER.

RE FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------|------------|----------------------------------|----------------|
| Municipio: | TIHUATLÁN | Localidad: | LA ANTIGUA | Ejercicio fiscal: | EJERCICIO 2023 |
| No. de obra: | 2023301750082 | Periodo: | JUNIO | Número de estimación: | N/A |
| Descripción: | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD LA ANTIGUA, TIHUATLAN, VER. | | | Fuente de financiamiento: | FAISMUN |
| | | | | Fecha de revisión: | 24/07/2023 |



Concepto de obra ejecutado:

BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE



Concepto de obra ejecutado:

ACABADO EN BANQUETAS

Observaciones:

Empty dashed box for observations.



[Handwritten Signature]
 Juan Manuel Romero Cuevas
Supervisor de Obras

ARQ
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLAN, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
EJERCICIO 2023

| |
|------------------------------|
| FECHA DE ELABORACION: |
| 24/07/2023 |
| MES QUE SE REPORTA |
| JUNIO |

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

| | | |
|--|-----------------------------------|--|
| MUNICIPIO: TIHUATLAN | LOCALIDAD: LA ANTIGUA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD LA ANTIGUA, TIHUATLAN, VER |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FAISMUN | No. DE OBRA: 2023301750082 | |

| | | | | | | |
|---|--|---|----------------|-------|-------------|----------|
| CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | | ANTECEDENTES: | | | | |
| OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: | | GRADO DE REZAGO SOCIAL: | | | | |
| TIPO DE ZONA: RURAL X URBANA | CLAVE AGE: N/A | MUY ALTO | ALTO | MEDIO | BAJO | MUY BAJO |
| SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: | | | | |
| | | DIRECTA | COMPLEMENTARIA | X | RESTRINGIDA | |
| COORDENADAS DE GEORREFERENCIA | | | | | | |
| LATITUD: 0.000000000 | LONGITUD: 0.000000000 | | | | | |

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
OBRA CONSISTE EN GUARNICION Y BANQUETA, LAS CUALES SON DE CONCRETO SIMPLE DE 20 CM DE BASE 15 CM DE CORONA Y 50 CM DE ALTURA RESPECTIVAMENTE, BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR LAS METAS DE 416 ML

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

TRABAJO DE GUARNICIONES EN EL TRAMO ASI COMO BANQUETAS

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

| No. EST. | MONTO CON IVA | PÓLIZAS CHEQUE | | FACTURAS | | | | | |
|----------------|---------------|----------------|--------|----------|---------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------|
| | | No. | MONTO | No. | IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACION | AMORTIZADO CON IVA | 5 MILLAR | CARGOS ADICIONALES | IMPORTE NETO |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTALES | \$0.00 | | \$0.00 | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

| | | |
|--|---|----------|
| MONTO AUTORIZADO: | \$652,548.87 | C/IVA |
| MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: | \$653,874.00 | C/IVA |
| VALIDACIÓN DEL PROYECTO: | EXISTE NO EXISTE NO APLICA | X |
| DEPENDENCIA QUE VALIDA: | | X |
| FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: | EXISTE NO EXISTE NO APLICA | X |
| DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: | | X |
| PERMISOS Y CONCESIONES: | EXISTE X NO EXISTE NO APLICA | X |
| DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS: | H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLAN | |
| TIPO DE LICITACIÓN: | ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA | EXISTE X |

| | | | |
|------------------------------|--|--|------------|
| NO. DE CONTRATO: | MTI-AD-FAISMUN-DF/2023/30/175/0082 | FECHA: | 19/06/2023 |
| CONTRATISTA: | MARIA MAGDALENA FERNANDEZ ROJAS | | |
| RF: | FERM761211F38 | | |
| MONTO CONTRATADO: | \$652,548.87 | C/IVA | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 19/06/2023 TÉRMINO: 31/07/2023 DÍAS: 43 | PROGRAMADA: REAL REAL: 19/06/2023 | 12 |
| ANTICIPO: | APLICA: NO APLICA MONTO: \$0.00 FECHA DE PAGO: 24/07/2023 | NO APLICA: X PORCENTAJE: 0.00 | X |

| B) REPORTE | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| | EXISTE | FECHAS |
| MONTO PAGADO EN EL MES: | \$0.00 | 30/06/2023 |
| MONTO PAGADO ACUMULADO: | \$0.00 | 30/06/2023 |
| FINIQUITO CON IVA: | \$0.00 | |
| ACTA ENTREGA RECEPCIÓN: | | |

| AVANCE FÍSICO REAL | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATRASO (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|--|-------------------|-----------------|--------------|
| TIPO DE FIANZA: | ANTICIPO | CUMPLIMIENTO | VIOS OCULTOS |
| MONTO AFIANZADO: | | \$56,254.21 | |
| AFIANZADORA: | | DORAMA | |
| No. DE FIANZA: | | 1804140 | |
| FECHA: | | 16/06/2023 | |
| | EXISTE | IMPORTE/PERIODO | FECHA |
| CONVENIO MODIFICATORIO: | MONTO NO APLICA X | INICIAL | FINAL |
| MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: | | \$652,548.87 | C/IVA |

Ing. Civil Erik Pérez Álvarez
DIRECTOR DE OBRAS

Arq. Juan Manuel Romero Cuevas
SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLÁN, VER.

RE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------|----------------|----------------------------------|----------------|
| Municipio: | TIHUATLÁN | Localidad: | PASO DEL PITAL | Ejercicio fiscal: | EJERCICIO 2023 |
| No. de obra: | 2023301750083 | Periodo: | JUNIO | Número de estimación: | N/A |
| Descripción: | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PASO DE PITAL, TIHUATLAN, VER. | | | Fuente de financiamiento: | FAISMUN |
| | | | | Fecha de revisión: | 24/07/2023 |



Concepto de obra ejecutado: CIMBRA EN GUARNICIONES



Concepto de obra ejecutado: GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE

Observaciones:

Empty dashed box for observations.



[Handwritten Signature]
 Juan Manuel Romero Cuevas
Supervisor de Obras
 ARQ
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLAN, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2023

FECHA DE ELABORACION:
24/07/2023
MES QUE SE REPORTA
JUNIO

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

| | | | | | |
|---------------------------|-----------|--------------|----------------|-------------------------|--|
| MUNICIPIO: | TIHUATLAN | LOCALIDAD: | PASO DEL PITAL | DESCRIPCION DE LA OBRA: | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PASO DE PITAL, TIHUATLAN, VER. |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | FAISMUN | No. DE OBRA: | 2023301750083 | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------|
| Cuenta con Proyecto Ejecutivo: | | | SI | X | NO |
| OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: | | | | | |
| TIPO DE ZONA: | RURAL X | URBANA | CLAVE AGEB: | N/A | |
| SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: | SI X NO | SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO | SI X NO | GRADO DE REZAGO SOCIAL: | |
| | | | | MUY ALTO | ALTO MEDIO BAJO X MUY BAJO |
| TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: | | | | | |
| | | | | DIRECTA | COMPLEMENTARIA X RESTRINGIDA |
| COORDENADAS DE GEORREFERENCIA | | | | | |
| LATITUD | 0.000000000 | | LONGITUD | 0.000000000 | |

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 1150.00 M2

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:
ELABORACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

| No. EST. | MONTO CON IVA | POLIZAS CHEQUE | | FACTURAS | | | | | | |
|----------|---------------|----------------|--------|----------|---------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------|--------|
| | | No. | MONTO | No. | IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACION | AMORTIZADO CON IVA | 5 MILLAR | CARGOS ADICIONALES | IMPORTE NETO | |
| TOTALES | | | \$0.00 | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

| | | |
|---|---|----------|
| MONTO AUTORIZADO: | \$1,499,218.31 | C/IVA |
| MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: | \$1,499,596.00 | C/IVA |
| VALIDACION DEL PROYECTO: | EXISTE NO EXISTE NO APLICA | X |
| DEPENDENCIA QUE VALIDA: | | |
| FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: | EXISTE NO EXISTE NO APLICA | X |
| DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: | | |
| PERMISOS Y CONCESIONES: | EXISTE X NO EXISTE NO APLICA | |
| DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS: | H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLAN | |
| TIPO DE LICITACION: | ADJUDICACION DIRECTA INVITACION A MENOS 3 PERSONAS LICITACION PUBLICA | EXISTE X |

| | | | |
|-----------------------|------------------------------------|--------------|-------------------|
| NO. DE CONTRATO: | MTI-IR-FAISMUN-DF/2023/30/175/0083 | FECHA: | 19/05/2023 |
| CONTRATISTA: | GUSTAVO ERNESTO DE LA HOZ ZUGASTI | | |
| RFC: | HOZG66062JB3 | | |
| MONTO CONTRATADO: | \$1,499,218.31 | C/IVA | |
| PERIODO DE EJECUCION: | INICIO | PROGRAMADA | REAL |
| | TERMINO | 22/05/2023 | 22/05/2023 |
| | DIAS | 31/07/2023 | |
| | | 71 | 40 |
| ANTICIPO: | APLICA | X NO APLICA | |
| | MONTO: | \$449,615.57 | PORCENTAJE: 29.99 |
| | FECHA DE PAGO: | | |

| B) REPORTE | | |
|-------------------------|--------|------------|
| | EXISTE | FECHAS |
| MONTO PAGADO EN EL MES: | \$0.00 | 30/06/2023 |
| MONTO PAGADO ACUMULADO: | \$0.00 | 30/06/2023 |
| FINIQUITO CON IVA: | \$0.00 | |
| ACTA ENTREGA RECEPCION: | | |

| AVANCE FISICO REAL | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATRASO (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|-------------------------|---|-----------------|-----------------|
| TIPO DE FIANZA: | ANTICIPO | CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS |
| MONTO AFIANZADO: | \$449,765.00 | \$129,242.00 | |
| AFIANZADORA: | ASERTA SA DE CV | ASERTA SA DE CV | |
| No. DE FIANZA: | 3616-23297-9 | 3616-232.96 | |
| FECHA: | 19/05/2023 | 19/05/2023 | |
| CONVENIO MODIFICATORIO: | MONTO | EXISTE | IMPORTE/PERIODO |
| | PLAZO | | FECHA |
| | NO APLICA X | | |
| | MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: | \$1,499,218.31 | C/IVA |

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



Ing. Civil Erik Pérez Álvarez
DIRECTOR DE OBRAS
Arq. Juan Manuel Romero Cuevas
SUPERVISOR DE OBRAS



H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLÁN, VER.

RE FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------|------------------------|----------------------------------|----------------|
| Municipio: | TIHUATLÁN | Localidad: | POZA AZUL DE LOS REYES | Ejercicio fiscal: | EJERCICIO 2023 |
| No. de obra: | 2023301750085 | Periodo: | JUNIO | Número de estimación: | NO APLICA |
| Descripción: | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES BENITO JUAREZ, FRANCISCO I. MADERO, 5 DE FEBRERO Y 5 DE MAYO DE | | | Fuente de financiamiento: | FAISMUN |
| | | | | Fecha de revisión: | 24/07/2023 |



Concepto de obra ejecutado:

Guarniciones

Concepto de obra ejecutado:

Excavación

Observaciones:

SE INICIARON TRABAJOS, DE TRAZO, NIVELACION, CIMBRA Y SE COLARON LOS PRIMEROS TRAMOS DE GUARNICIONES.



Jesús Alejandro González Bonilla

Supervisor de Obras

ING.
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLAN, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
EJERCICIO 2023

FECHA DE ELABORACION:
24/07/2023
MES QUE SE REPORTA
JUNIO

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------------|------------------------|--|--|
| MUNICIPIO: | TIHUATLAN | LOCALIDAD: | POZA AZUL DE LOS REYES | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES BENITO JUAREZ, FRANCISCO MADERO, S DE FEBRERO Y S DE MAYO DE LA LOCALIDAD POZA AZUL DE LOS REYES, TIHUATLAN, VER |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | FAISMUN | No. DE OBRA: | 2023301750085 | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA: | |
| ANTECEDENTES: | | | | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES: | |
| CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: | | | | | |
| OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: | | | | | |
| TIPO DE ZONA: | | | | | |
| SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: | | | | | |
| SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO | | | | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES: | |
| COORDENADAS DE GEORREFERENCIA | | | | | |
| LATITUD | | | | | |
| LONGITUD | | | | | |
| GRADO DE REZAGO SOCIAL: | | | | | |
| TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: | | | | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES: | |
| DIRECTA | | | | | |
| COMPLEMENTARIA | | | | | |
| RESTRINGIDA | | | | | |
| CONVENIO MODIFICATORIO: | | | | | |

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

| No. EST. | MONTO CON IVA | PÓLIZAS CHEQUE | | FACTURAS | | | | | IMPORTE NETO |
|----------|---------------|----------------|--------|----------|---------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------|
| | | No. | MONTO | No. | IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACION | AMORTIZADO CON IVA | 5 MILLAR | CARGOS ADICIONALES | |
| TOTALES | \$0.00 | | \$0.00 | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| MONTO AUTORIZADO: | \$1,885,035.45 | C/IVA |
| MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: | \$1,857,145.00 | C/IVA |
| VALIDACIÓN DEL PROYECTO: | EXISTE NO EXISTE NO APLICA | X |
| DEPENDENCIA QUE VALIDA: | | |
| FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: | EXISTE NO EXISTE NO APLICA | X |
| DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: | | |
| PERMISOS Y CONCESIONES: | EXISTE X NO EXISTE NO APLICA | |
| DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS: | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIHUATLAN | EXISTE |
| TIPO DE LICITACIÓN: | ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA | X |
| NO. DE CONTRATO: | MTI-IR-FAISMUN/2023/30/1/5/0085 | FECHA: 22/06/2023 |
| CONTRATISTA: | MARIA MERCEDES GARCIA PEREZ | |
| RFC: | GAPM900915BR6 | |
| MONTO CONTRATADO: | \$1,855,035.45 | C/IVA |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO 26/06/2023 | PROGRAMADA REAL 26/06/2023 |
| | TÉRMINO 04/08/2023 | |
| | DÍAS 40 | 5 |
| ANTICIPO: | APLICA MONTO: \$556,510.63 | NO APLICA PORCENTAJE: 30.00 |
| | FECHA DE PAGO: | 23/06/2023 |

| B) REPORTE | | |
|--------------------------------|--------|--------|
| | EXISTE | FECHAS |
| MONTO PAGADO EN EL MES: | \$0.00 | |
| MONTO PAGADO ACUMULADO: | \$0.00 | |
| FINIQUITO CON IVA: | \$0.00 | |
| ACTA ENTREGA RECEPCIÓN: | | |

| AVANCE FÍSICO REAL | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATRASO (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|----------------|-----------------|----------------|
| TIPO DE FIANZA: | ANTICIPO | CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS |
| MONTO AFIANZADO: | \$556,510.63 | \$159,916.85 | |
| AFIANZADORA: | DORAMA | | |
| No. DE FIANZA: | 1799500 | 1799501 | |
| FECHA: | 22/06/2023 | 22/06/2023 | |
| | EXISTE | IMPORTE/PERIODO | FECHA |
| CONVENIO MODIFICATORIO: | MONTO | INICIAL | FINAL |
| | PLAZO | | |
| | NO APLICA X | | |
| MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: | \$1,855,035.45 | C/IVA | |

OBSERVACIONES:

SE INICIARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION ASI COMO CIMBRADO



Ing. Civil Erik Pérez Álvarez
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Jesús Alejandro González Bonilla
SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

*En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

**H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLÁN, VER.****RE FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS****DATOS GENERALES**

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------|----------|----------------------------------|----------------|
| Municipio: | TIHUATLÁN | Localidad: | ZIPATLÁN | Ejercicio fiscal: | EJERCICIO 2023 |
| No. de obra: | 2023301750089 | Periodo: | JUNIO | Número de estimación: | N/A |
| Descripción: | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD ZIPATLAN, TIHUATLAN, VER. | | | Fuente de financiamiento: | FAISMUN |
| | | | | Fecha de revisión: | 24/07/2023 |



Concepto de obra ejecutado:

Construcción de guarniciones y banquetas de concreto simple $f_c = 150 \text{ Kg/cm}^2$



Concepto de obra ejecutado:

Construcción de banquetas de concreto simple de 10 CM de espesor

Observaciones:

LA ESTIMACION NORMAL SE EN ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISION.



Luis Edgar Ramos Hernández
Supervisor de Obras

ING.

Profesión del Supervisor

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLAN, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2023

| | |
|-----------------------|------------|
| FECHA DE ELABORACION: | 24/07/2023 |
| MES QUE SE REPORTA | JUNIO |

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

| | | | | | |
|---------------------------|-----------|--------------|---------------|-------------------------|--|
| MUNICIPIO: | TIHUATLÁN | LOCALIDAD: | ZIPATLÁN | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD ZIPATLAN, TIHUATLAN, VER. |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | FAISMUN | No. DE OBRA: | 2023301750089 | | |

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO

OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: SI X NO

TIPO DE ZONA: RURAL X URBANA

CLAVE AGEB: N/A

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO

SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI X NO

GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO ALTO MEDIO X BAJO MUY BAJO

TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: DIRECTA COMPLEMENTARIA X RESTRINGIDA

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA
LATITUD: 0.000000000 LONGITUD: 0.000000000

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

SE CONSTRUIRAN 707.10 ML DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE FC=150 KG/CM2 CON GUARNICIONES DE SECCION 20X15X50 CON ACABADO TEXTURIZADO EN BANQUETAS Y PINTURA AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

SE PRESENTA EL 50% DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA CON LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE Y RELLENO DE PRODUCTO DE EXCAVACIONES COMPACTADO CON BAILARINA.

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

| No. EST. | MONTO CON IVA | PÓLIZAS CHEQUE | | FACTURAS | | | | | IMPORTE NETO |
|----------|---------------|----------------|--------|----------|---------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------|
| | | No. | MONTO | No. | IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN | AMORTIZADO CON IVA | 5 MILLAR | CARGOS ADICIONALES | |
| TOTALES | \$0.00 | | \$0.00 | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

| | | |
|---|---|---|
| MONTO AUTORIZADO: | \$874,292.46 | C/IVA |
| MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: | \$874,925.00 | C/IVA |
| VALIDACIÓN DEL PROYECTO: | EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> | NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/> X |
| DEPENDENCIA QUE VALIDA: | EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> | NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/> X |
| FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: | EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> | NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/> X |
| DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: | EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> | NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/> X |
| PERMISOS Y CONCESIONES: | EXISTE <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> | NO APLICA <input type="checkbox"/> |
| DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS: | H. AYUNTAMIENTO TIHUATLAN, VER. | |
| TIPO DE LICITACIÓN: | ADJUDICACIÓN DIRECTA <input checked="" type="checkbox"/> X INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA | |

| | | | |
|-----------------------|--|--------------|-------------------|
| NO. DE CONTRATO: | MTI-AD-FAISMUN/2023/30/175/0089 | FECHA: | 03/06/2023 |
| CONTRATISTA: | RIGOBERTO ORTIZ TRINIDAD | | |
| RFC: | OITR770915DLO | | |
| MONTO CONTRATADO: | \$874,292.46 | C/IVA | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | PROGRAMADA | REAL | |
| | INICIO | 15/05/2023 | 15/05/2023 |
| | TÉRMINO | 15/07/2023 | |
| | DÍAS | 62 | 47 |
| ANTICIPO: | APLICA <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> NO APLICA <input type="checkbox"/> | | |
| | MONTO: | \$262,287.73 | PORCENTAJE: 30.00 |
| | FECHA DE PAGO: | 15/06/2023 | |

B) REPORTE

| | | |
|-------------------------|--------|------------|
| | EXISTE | FECHAS |
| MONTO PAGADO EN EL MES: | \$0.00 | |
| MONTO PAGADO ACUMULADO: | \$0.00 | 30/06/2023 |
| FINQUITO CON IVA: | \$0.00 | |
| ACTA ENTREGA RECEPCIÓN: | | |

AVANCE FÍSICO REAL

| AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATRASO (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|--|---|----------------|
| TIPO DE FIANZA: | ANTICIPO | CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS |
| MONTO AFIANZADO: | \$262,287.74 | \$75,370.04 | |
| AFIANZADORA: | ASEGURADORA ASERTA, S A DE C V | ASEGURADORA ASERTA, S A DE C V | |
| No. DE FIANZA: | 3616-23501-3 | 3616-23489-0 | |
| FECHA: | 03/06/2023 | 03/06/2023 | |
| CONVENIO MODIFICATORIO: | MONTO <input type="checkbox"/> PLAZO <input checked="" type="checkbox"/> X | EXISTE <input type="checkbox"/> IMPORTE/PERIODO | FECHA |
| | NO APLICA <input type="checkbox"/> | INICIAL | FINAL |
| MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: | \$874,292.46 | C/IVA | |

OBSERVACIONES:

LA EMPRESA PRESENTA ESTIMACION NORMAL Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISION.



Ing. Erik Pérez Álvarez
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Luis Edmundo Ramos Hernández
SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

*En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLÁN, VER.




RE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

| | | |
|---|-------------------------------|--|
| Municipio: TIHUATLÁN | Localidad: PASO LA UNO | Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2023 |
| No. de obra: 2023301750100 | Periodo: JUNIO | Número de estimación: N/A |
| Descripción: CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE PASO LA UNO I, TIHUATLAN, VER. | | Fuente de financiamiento: FAISMUN |
| | | Fecha de revisión: 24/07/2023 |



Concepto de obra ejecutado: Suministro y colocacion de trabe tipo Warren de 45 CM de peralte a base de ángulos.

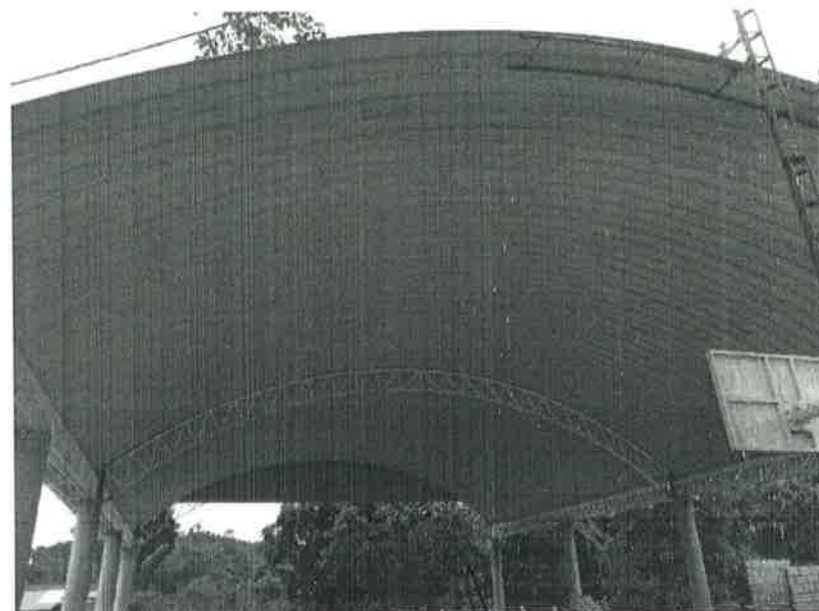

Concepto de obra ejecutado: Suministro y colocacion de lámina rolada en sitio cal. 22 autosoportante

Observaciones:

LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION.



Luis Edgar Ramos Hernández
Supervisor de Obras

ING.

Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLAN, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

FECHA DE ELABORACIÓN:
24/07/2023
MES QUE SE REPORTA
JUNIO

EJERCICIO 2023

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

| | | | | | |
|---------------------------|-----------|--------------|---------------|-------------------------|---|
| MUNICIPIO: | TIHUATLÁN | LOCALIDAD: | PASO LA UNO | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE PASO LA UNO 1, TIHUATLAN, VER. |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | FAISMUN | No. DE OBRA: | 2023301750100 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|------------|-------------|----|--|--|--|--|--|
| Cuenta con Proyecto Ejecutivo: | | SI | X | NO | | | | | |
| OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: | | | | | | | | | |
| TIPO DE ZONA: | RURAL X URBANA | CLAVE AGE: | N/A | | | | | | |
| SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: | SI X NO | | | | | | | | |
| SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO | SI X NO | | | | | | | | |
| COORDENADAS DE GEORREFERENCIA | | | | | | | | | |
| LATITUD | 0.000000000 | LONGITUD | 0.000000000 | | | | | | |

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
SE CONSTRUIRAN 419.84 M2 DE CUBIERTA METALICA A BASE DE LAMINA CAL. 12 ROLADA EN SITIO Y SOPORTES EN COLUMNAS DE 45 CM DE DIAMETRO DE CONCRETO ARMADO ASI COMO SANITARIOS CON MUROS, CIMENTACION Y LOSA DE CONCRETO.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
SE PRESENTA EL 75% DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA CON LA CONSTRUCCION DE COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO DE 45 CM DE DIAMETRO Y CON LA COLOCACION DE TRABES WARREN Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA LA COLOCACION DE LA CUBIERTA A BASE DE LAMINA CAL. 22.

| No. EST. | MONTO CON IVA | PÓLIZAS CHEQUE | | FACTURAS | | | | | | |
|----------|---------------|----------------|--------|----------|---------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------|--------|
| | | No. | MONTO | No. | IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACION | AMORTIZADO CON IVA | 5 MILLAR | CARGOS ADICIONALES | IMPORTE NETO | |
| TOTALES | \$0.00 | | \$0.00 | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

| | | | |
|---|---|---------------------------------|-------------|
| MONTO AUTORIZADO: | | \$1,828,523.00 | C/IVA |
| MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: | | \$1,828,523.00 | C/IVA |
| VALIDACIÓN DEL PROYECTO: | EXISTE | NO EXISTE | NO APLICA X |
| DEPENDENCIA QUE VALIDA: | | | |
| FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: | EXISTE | NO EXISTE | NO APLICA X |
| DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: | | | |
| PERMISOS Y CONCESIONES: | EXISTE X | NO EXISTE | NO APLICA |
| DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS: | | H. AYUNTAMIENTO TIHUATLAN, VER. | EXISTE |
| TIPO DE LICITACIÓN: | ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA | | X |

| | | | |
|-----------------------|--|--------------------------------|------------|
| NO. DE CONTRATO: | MTI-IR-FAISMUN/2023/30/175/0100 | FECHA: | 12/05/2023 |
| CONTRATISTA: | MARIA MERCEDES GARCIA PEREZ | | |
| RFC: | GAPM900915BR6 | | |
| MONTO CONTRATADO: | \$1,632,802.45 | | C/IVA |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO PROGRAMADA REAL 15/05/2023 15/05/2023 TÉRMINO 15/07/2023 DÍAS 62 17 | | |
| ANTICIPO: | APLICA X MONTO: \$489,840.73 | NO APLICA PORCENTAJE: 30.00 | |
| | FECHA DE PAGO: | | |

| B) REPORTE | | |
|-------------------------|--------|------------|
| | EXISTE | FECHAS |
| MONTO PAGADO EN EL MES: | \$0.00 | |
| MONTO PAGADO ACUMULADO: | \$0.00 | 30/06/2023 |
| FINIQUITO CON IVA: | \$0.00 | |
| ACTA ENTREGA RECEPCIÓN: | | |

| AVANCE FISICO REAL | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATRASO (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|--|--|----------------|
| TIPO DE FIANZA: | ANTICIPO | CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS |
| MONTO AFIANZADO: | \$489,840.73 | \$140,758.83 | |
| AFIANZADORA: | DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. | DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. | |
| No. DE FIANZA: | 1787880 | 1787885 | |
| FECHA: | 12/05/2023 | 12/05/2023 | |
| CONVENIO MODIFICATORIO: | MONTO EXISTE PLAZO NO APLICA X | IMPORTE/PERIODO INICIAL FINAL | FECHA |
| MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: | | \$1,632,802.45 | C/IVA |

OBSERVACIONES:
LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y LA EMPRESA NO PRESENTA ESTIMACIONES



Ing. Erik Pérez Álvarez
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Luis Edgar Rosales
SUPERVISOR DE OBRAS

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja
