



Ayuntamiento de Tihuatlán, Veracruz 2022-2025



SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL AÑO 2023

En el Municipio de Tihuatlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las quince horas del día **jueves veinte del mes de julio** del año dos mil veintitrés, reunidos en la sala de Cabildo del Palacio Municipal para llevar a efecto Sesión de Cabildo correspondiente a la Administración Pública Municipal 2022-2025, con fundamento en lo dispuesto por los artículos **28, 29, 30, 32, 36 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre**, se lleva a efecto la **Sesión de Cabildo EXTRAORDINARIA, del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tihuatlán**, la cual se integra con la presencia de los ciudadanos, **Leobardo Gómez González**, en su carácter de **Presidente Municipal**; **Licenciada Lidia de León Gutiérrez**, en su carácter de **Síndica Única**; **M.V.Z. José Norberto Aguirre Orellan**, Regidor Primero; **C. Mónica Claudio Casados**, Regidora Segunda; **Licenciado Bernardo Aldana Vaquier**, Regidor Tercero; **Licenciada Norma Edith Herrera Viveros**, Regidora Cuarta y **C. Rodrigo Chávez Hernández**, Regidor Quinto, asistidos por la ciudadana **Lic. Mirta Idalia García García**, Secretaria del H. Ayuntamiento quien da fe; a fin de efectuar la sesión de Cabildo en base al siguiente: - - - - -

Lidia de León Gutiérrez
Presidente

Mónica Claudio Casados
Sindica

José Norberto Aguirre Orellan
Regidor 1º.

Bernardo Aldana Vaquier
Regidor 2º.

Norma Edith Herrera Viveros
Regidor 3º.


Rodrigo Chávez Hernández
Regidor 5º.

- **ORDEN DEL DÍA:** -----
- 1.- Lista de asistencia y en su caso declaración de Quórum Legal.
 - 2.- Aprobación del orden del día.
 - 3.- Informe de parte de la **Comisión de Obras Públicas y Comunicaciones**, referente a la **Obra Pública realizada por parte de la Dirección en el periodo correspondiente al mes de junio del año 2023**.
 - 4.- Propuesta para la aprobación del informe de Obra pública realizada en el mes de junio del año 2023, para la presentación ante el Congreso del Estado y el Órgano de Fiscalización Superior en el Estado.
 - 5.- Clausura.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA.

PRIMER PUNTO: - Lista de asistencia y en su caso declaración de Quorum Legal. El Ciudadano **Leobardo Gómez González** Presidente Municipal Constitucional instruye a la Ciudadana **Licenciada Mirta Idalia García García** Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional, a fin de realizar pase de lista de asistencia dando cuenta que se encuentran presentes la totalidad de ediles, por lo que se decreta el **Quórum Legal** para sesionar, en términos del artículo 29 **segundo párrafo de la Ley Orgánica del Municipio Libre y en consecuencia se abre oficialmente la Sesión de Cabildo**; por lo que los acuerdos que se tomen serán válidos **apasa** obliga a su cumplimiento; el Ciudadano Presidente ordena a la Secretaria se proceda **apasa** segundo punto.

Leobardo Gómez González
Regidor 5º.





Ayuntamiento de Tehuatlán, Veracruz 2022-2025



SEGUNDO PUNTO: - La ciudadana Licenciada **Mirta Idalia García García** Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional, **da lectura a la propuesta del orden día** en los términos de la convocatoria, sometiéndolo a consideración de este Cuerpo Edilicio, por lo que se les piden levanten la mano de manera general para la emisión de su voto, y una vez contados los votos se hace mención que se obtuvieron **6 a favor y un voto en contra emitido por el C. Lic. Bernardo Aldana Vaquier Regidor Tercero por lo que es aprobado por Mayoría de los presentes, el orden del día**

Sindica


TERCER PUNTO:- Corresponde al titular de la **Comisión de Obras Públicas, el edil José Norberto Aguirre Orellan**, dar el Informe de la obra pública realizada por parte de la Dirección en el periodo correspondiente **al mes de junio del año 2023**, para lo cual previamente se hizo circular documental, **de los anexos 09H, 09V, 11 y 12**. Una vez aprobada se deberá presentar ante el Órgano de Fiscalización Superior en el Estado en donde se detallan los aspectos técnicos y financiero de las mismas, estando el **Ingeniero Erik Pérez Álvarez Director de Obras Públicas** presente en la sesión a fin de contestar los requerimientos u observaciones de parte de los integrantes del Honorable Cabildo.-.....

CUARTO PUNTO:- Habiendo concluido el informe de parte de la titular de la comisión respectiva, el ciudadano Presidente **Leobardo Gómez González**, solicita a los comparecientes **manifiesten su conformidad para aprobar el informe de Obra Pública** realizada en el mes de **junio del año 2023**, para que de ser así, se proceda a la presentación ante el Congreso del Estado y el Órgano de Fiscalización Superior en el Estado, los anexos **09H, 09V, 11 y 12**; derivado de ello se pone a consideración del Honorable Cabildo el punto en comentario y se toma el siguiente: -.....

ACUERDO: Se procede a recabar la votación correspondiente por lo que los integrantes del Honorable Cabildo aprueban por **Mayoría de Votos dicho punto**, en virtud de que se obtuvieron 6 votos a favor y uno en contra, emitido por el **C. Lic. Bernardo Aldana Vaquier**. por lo que se **acuerda el informe de Obra Pública del mes de junio del año 2023, de conformidad con los artículos 35 fracciones VI, VII, 39, 40 fracción VI, 50, 73 Ter. Fracción V y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre. Hágase su remisión a la Soberanía Legislativa, Órgano Fiscalización Superior. -Cúmplase.**


QUINTO PUNTO CLAUSURA. -El ciudadano **Leobardo Gómez González** Presidente Municipal pregunta a la ciudadana Licenciada **Mirta Idalia García García** Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional, si existe algún otro punto a tratar, la cual responde que no. Por lo anterior se

Información No reservada de acuerdo a la ley de Transparencia





Ayuntamiento de Tihuatlán, Veracruz 2022-2025



instruye se proceda a la elaboración del acta de cabildo correspondiente para que sea firmada al margen y al calce, se haga la remisión a la Soberanía Legislativa, se ha publicada en la página oficial de la Unidad de Transparencia del Municipio de Tihuatlán, Veracruz, y en su oportunidad sea fijada un extracto de la presente acta en el tablero de avisos de este H. Ayuntamiento, concluyéndose la misma el día de su inicio, en punto de las diecisiete horas con cero minutos. Doy fe. Cúmplase.....


C. LEOBARDO GÓMEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. LIC. LIDIA DE LEÓN GUTIÉRREZ
SÍNDICA ÚNICA


C. MVZ. JOSÉ NORBERTO AGUIRRE ORELLAN
REGIDOR PRIMERO


C. MÓNICA CLAUDIO CASADOS
REGIDORA SEGUNDA


C. LIC. BERNARDO ALDANA VAQUIER
REGIDOR TERCERO


C. LIC. NORMA EDITH HERRERA VIVEROS
REGIDORA CUARTA


C. RODRIGO CHÁVEZ HERNÁNDEZ
REGIDOR QUINTO




C. LIC. MIRTA IBALIA GARCÍA GARCÍA.
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.



Anexo al oficio No. EMO/2023/TIHUATLÁN/87006

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2023301750216	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	No	No	No	No
2023301750222	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO INFANTIL "CRI-CRI" DE LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLAN VER.	No	No	No	No
2023301750223	EQUIPAMIENTO "JUEGOS INFANTILES" DEL PARQUE PUBLICO BENITO JUAREZ GARCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLAN VER.	No	No	No	No
2023301750224	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS, DE LA LOCALIDAD EL MAMEY, TIHUATLAN VER.	No	No	No	No
2023301750225	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ALFREDO BONFIL DE LA LOCALIDAD EL COPAL, TIHUATLAN VER.	Sí	No	Sí	No
2023301750226	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD PROGRESO DE MARAVILLAS, TIHUATLAN VER.	Sí	No	Sí	No
2023301750227	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LIMON DE LA LOCALIDAD ZAPOTAL SANTA CRUZ, TIHUATLAN VER.	No	No	No	No
2023301750229	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y LINDERO DE LA LOCALIDAD EL PALMAR, TIHUATLAN VER.	No	No	No	No
2023301750230	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PALMAS, BUGAMBILIA Y ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD, ACUATEMPA, TIHUATLAN VER.	No	No	No	No



SELLO DIGITAL:

fjfvaiRFJHWS6Xh0bj8wif1ymboAXOz2orThhO7yuqul71f/HcXg98v5alrHL8D4yCgqZQMYNw24vAKtXU85k+C0S7stmUgrww1Pvmhq6Cs0qmbITINWYf2L3NqskikhU4qdcjImACCwcj7ibTiqP2V7onu98tXdAie6aMaAtE=



Anexo al oficio No. EMO/2023/TIHUATLÁN/87006

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2023301750231	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE LAS CALLES REVOLUCION Y 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD LA ISLA (KM. 10), TIHUATLAN VER.	No	No	No	No
2023301750232	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA LOCALIDAD SAN PEDRO MIAHUAPAN, TIHUATLAN VER.	No	No	No	No
2023301750233	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y LINDERO DE LA LOCALIDAD NUEVO PROGRESO, TIHUATLAN VER.	No	No	No	No
2023301750234	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, SANITARIOS Y CERCADO PERIMETRAL EN EL CAIC-DIF "TIHUATLAN" DE LA COLONIA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLAN VER.	Sí	No	Sí	No
2023301750235	CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS (CAP DIF) JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, TIHUATLAN VER.	No	No	No	No
2023301750236	CONSTRUCCION DE AULA Y SANITARIOS PARA EL CAIC "JUANA DE ARCO" DE LA COLONIA UNIDAD NACIONAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLAN, VER.	Sí	No	Sí	No
2023301750238	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PUBLICO Y CERCADO PERIMETRAL EN LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL, TIHUATLAN, VER.	Sí	No	Sí	No
2023301750239	AMPLIACION UNIDAD DEPORTIVA (GIMNACIO) DE LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLAN, VER.	No	No	No	No



SELLO DIGITAL:

fjfvaiRFJHWS6Xh0bj8wif1ymboAXOz2orThhO7yuqul71f/HcXG98v5alrHL8D4yCgqZQMYNw24vAKtXU85k+C0S7stmUgrww1Pvmhq6Cs0qmlbTINWyF2L3NqskikhU4qdcJlmACCwcj7ibTiqP2V7onu98tXdAle6aMaAtE=

Anexo al oficio No. EMO/2023/TIHUATLÁN/87006

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2023301750240	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO (ALBERCAS) DE LA UNIDAD DEPORTIVA, CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLAN, VER.	No	No	No	No
2023301750241	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y REHABILITACION DE SUS INSTALACIONES EN LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLAN, VER.	Sí	No	Sí	No
2023301750246	REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE PALO DE ROSA, TIHUATLAN, VER.	No	No	No	No
2023301750247	CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA (PARADOR) EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TIHUATLAN, VER.	No	No	No	No
2023301750249	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LOS PINOS, TIHUATLAN VER.	No	No	No	No

EMO/2023/ TIHUATLÁN/87006



SELLO DIGITAL:

fjfvAIRFJHWS6Xh0bj8wif1ymboAXOz2orThhO7yuqul71f/HcXG98v5alrHL8D4yCgqZQMYNw24vAKtXU85k+C0S7stmUgrww1Pvmhq6Cs0qmlbTINWYf2L3NqskikhU4qdcJmACCwcj7ibTiqP2V7onu98tXdAie6aMaAtE=



H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLÁN, VER.

RE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: TIHUATLÁN	Localidad: EL COPAL	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2023
No. de obra: 2023301750225	Periodo: JUNIO	Número de estimación: 1 (UNO) NORMAL
Descripción: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ALFREDO BONFIL DE LA LOCALIDAD EL COPAL, TIHUATLAN VER.		Fuente de financiamiento: FORTAMUNDF
		Fecha de revisión: 24/07/2023



Concepto de obra ejecutado:

Construcción de pavimentob

Concepto de obra ejecutado:

Pavimento hidráulico

Observaciones:

SE TERMINARON GUARNICIONES, BANQUETAS, SE PREPARÓ LA BASE Y SE INICIÓ EL COLADO DE CONCRETO HIDRAULICO.



Jesús Alejandro González Bonilla

Supervisor de Obras

ING.

Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLAN, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2023

FECHA DE ELABORACIÓN:	24/07/2023
MES QUE SE REPORTA	JUNIO

MUNICIPIO: TIHUATLAN		LOCALIDAD: EL COPAL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ALFREDO BONFIL DE LA LOCALIDAD EL COPAL, TIHUATLAN VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUN		No. DE OBRA: 2023301750225	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ALFREDO BONFIL DE LA LOCALIDAD DE EL COPAL
ANTECEDENTES:			
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		GRADO DE REZAGO SOCIAL:	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:		MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO X MUY BAJO	
TIPO DE ZONA: RURAL URBANA	CLAVE AGE: N/A	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	DIRECTA COMPLEMENTARIA X RESTRINGIDA	
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA			
LATITUD 0.000000000	LONGITUD 0.000000000		

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
1 (UNO) NORMAL	\$2,247,853.61	3442	\$2,238,164.59	1 (UNO) NORMAL	\$2,247,853.61	\$0.00	\$9,689.02	\$0.00	\$2,238,164.59
TOTALES	\$2,247,853.61		\$2,238,164.59		\$2,247,853.61	\$0.00	\$9,689.02	\$0.00	\$2,238,164.59

MONTO AUTORIZADO:	\$4,014,941.97	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$4,017,438.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE X NO APLICA	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIHUATLAN	
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE X NO EXISTE NO APLICA	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIHUATLAN	
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE X NO EXISTE NO APLICA	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIHUATLAN	
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACION A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA	X
NO. DE CONTRATO:	MTI-IR-FORTAMUN-DF/2023/30/175/0225	FECHA: 06/05/2023
CONTRATISTA:	CRUZ GONZALEZ MORENO	
RFC:	GOMC740502JJ2	
MONTO CONTRATADO:	\$4,014,941.97	C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO 08/05/2023 TÉRMINO 31/07/2023 DÍAS 85	REAL 08/05/2023 54
ANTICIPO:	APLICA NO APLICA X MÓNTO: \$0.00 FECHA DE PAGO: 24/07/2023	NO APLICA X PORCENTAJE: 0.00

B) REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$2,247,853.61	12/06/2023
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$2,247,853.61	
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	40	30	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	40	30	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	40	70	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	\$346,115.69
MONTO AFIANZADO:		AFIANZADORA:	SOFIMEX
FECHA DE FIANZA:		No. DE FIANZA:	2799279
FECHA:		FECHA:	06/05/2023
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO EXISTE PLAZO NO APLICA X	IMPORTE/PERIODO	INICIAL FINAL
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$4,014,941.97	FECHA	

OBSERVACIONES:



Ing. Civil Erik Pérez Álvarez
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Jesús Alejandro González Bonilla
SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLÁN, VER.

RE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio:	TIHUATLÁN	Localidad:	PROGRESO DE MARAVILLAS	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2023
No. de obra:	2023301750226	Periodo:	JUNIO	Número de estimación:	
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD PROGRESO DE MARAVILLAS, TIHUATLAN VER.			Fuente de financiamiento:	FORTAMUNDF
				Fecha de revisión:	24/07/2023



Concepto de obra ejecutado:

Cimbra guarniciones



Concepto de obra ejecutado:

Relleno en área de banquetas

Observaciones:

Empty dashed box for observations.



Jesús Alejandro González Bonilla
Supervisor de Obras

ING
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLAN, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
EJERCICIO 2023

FECHA DE ELABORACION:
24/07/2023
MES QUE SE REPORTA
JUNIO

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO: TIHUATLAN LOCALIDAD: PROGRESO DE MARAVILLAS DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUN-DF No. DE OBRA: 2023301750226 DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA: PROGRESO DE MARAVILLAS, TIHUATLAN VER.

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI NO ANTECEDENTES: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO

OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: GRADO DE REZAGO SOCIAL:
 TIPO DE ZONA: RURAL CLAVE AGEB: N/A MUY ALTO ALTO MEDIO X BAJO MUY BAJO
 SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI NO TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:
 SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO SI NO DIRECTA COMPLEMENTARIA X RESTRINGIDA

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA
 LATITUD 0.000000000 LONGITUD 0.000000000

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					IMPORTE NETO
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	
TOTALES	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MONTO AUTORIZADO: \$2,141,537.25 C/IVA
 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: \$2,142,515.70 C/IVA
 VALIDACIÓN DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE X NO APLICA
 DEPENDENCIA QUE VALIDA: NO EXISTE X NO APLICA
 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE X NO EXISTE NO APLICA
 DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIHUATLAN
 PERMISOS Y CONCESIONES: EXISTE X NO EXISTE NO APLICA
 DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIHUATLAN
 TIPO DE LICITACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA EXISTE
 INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS X
 LICITACIÓN PÚBLICA

NO. DE CONTRATO: MTI-IR-FORTAMUN-DF/2023/30/175/0226 FECHA: 14/06/2023
 CONTRATISTA: IRAZEMA AMADA JIMENEZ MALDONADO
 RFC: JIM1800212FD3
 MONTO CONTRATADO: \$2,141,537.25 C/IVA
 PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO PROGRAMADA REAL
 TÉRMINO 16/06/2023 16/06/2023
 DÍAS 45 15
 APLICA NO APLICA X
 MONTO: \$0.00 PORCENTAJE: 0.00
 FECHA DE PAGO: 24/07/2023

B) REPORTE

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$0.00	
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$0.00	
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

TIPO DE FIANZA: ANTICIPO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS
 MONTO AFIANZADO: \$184,615.28
 AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
 No. DE FIANZA: 3616-23615-9
 FECHA: 14/06/2023
 MONTO EXISTE IMPORTE/PERIODO FECHA
 CONVENIO MODIFICATORIO: MONTO INICIAL FINAL
 PLAZO NO APLICA X
 MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: \$2,141,537.25 C/IVA

Ing. Civil Erik Pérez Álvarez
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Jesús Alejandro Guzmán Bonilla
SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11



*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.




H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLÁN, VER.

RE FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS


DATOS GENERALES

Municipio:	TIHUATLÁN	Localidad:	TIHUATLÁN	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2023
No. de obra:	2023301750234	Periodo:	JUNIO	Número de estimación:	N/A
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, SANITARIOS Y CERCADO PERIMETRAL EN EL CAIC-DIF "TIHUATLAN" DE LA COLONIA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLAN, VER.			Fuente de financiamiento:	FORTAMUNDF
				Fecha de revisión:	24/07/2023

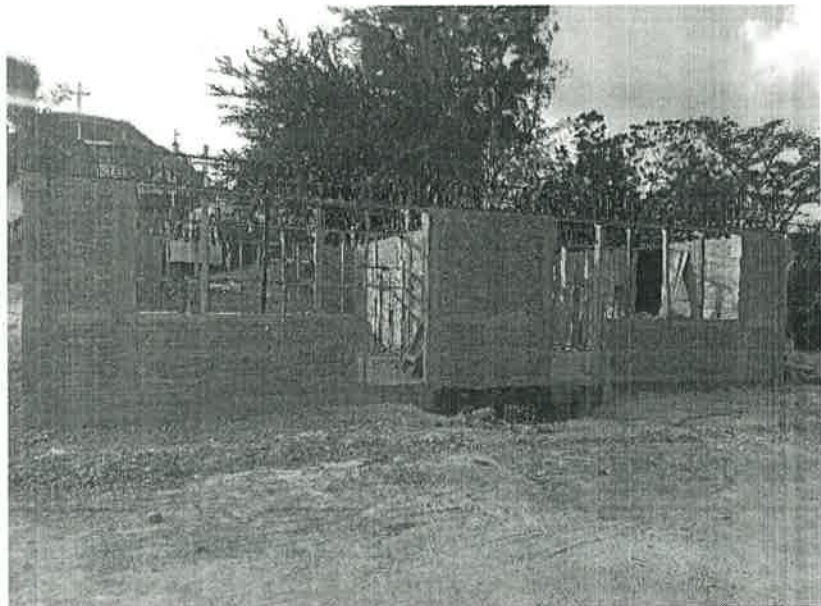

Concepto de obra ejecutado:

La fotografía representa la construcción de Muros de tabique.

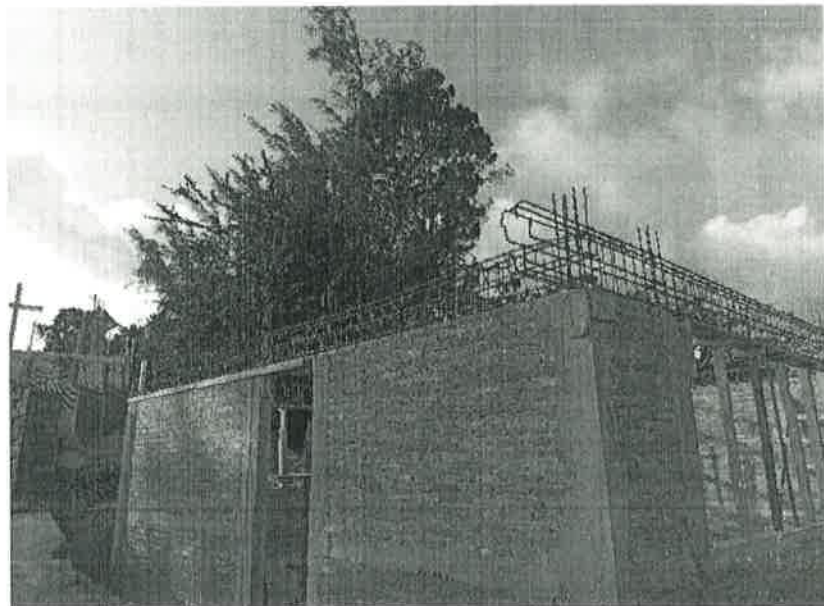

Concepto de obra ejecutado:

La fotografía representa el habilitado de acero para las trabes de concreto armado.

Observaciones:

OBRA EN PROCESO.



Uriel Mariano Vargas Salas
Supervisor de Obras

ING.
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLAN, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2023

FECHA DE ELABORACION:
24/07/2023
MES QUE SE REPORTA
JUNIO

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	TIHUATLÁN	LOCALIDAD:	TIHUATLÁN	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, SANITARIOS Y CERCADO PERIMETRAL EN EL CAIC-DIF "TIHUATLAN" DE LA COLONIA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLAN, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FORTAMUN	No. DE OBRA:	2023301750234		

Cuenta con Proyecto Ejecutivo:		SI	X	NO	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:					
TIPO DE ZONA:	RURAL	CLAVE AGE:	N/A		
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	URBANA	SI	NO	X	
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	X	NO	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA					
LATITUD	0.000000000	LONGITUD	0.000000000		

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
SE CONSTRUIRAN DOS AULAS, SANITARIOS Y CERCADO PERIMETRAL (ANEXO)

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					IMPORTE NETO
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA EXTRACCIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	
TOTALES	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MONTO AUTORIZADO:	\$2,018,379.27	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$2,019,445.13	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE X NO APLICA	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE X NO APLICA	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE X NO EXISTE NO APLICA	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:		
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA	EXISTE X

NO. DE CONTRATO:	MTC-08-FORTAMUN-07/2023/01/17/0234	FECHA:	12/05/2023
CONTRATISTA:	MACEDONIO HERNANDEZ DOMINGUEZ		
RF:	HEDM790828HW6		
MONTO CONTRATADO:	\$2,018,379.27	C/IVA	
	PROGRAMADA REAL		
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO 15/05/2023	REAL	15/05/2023
	TÉRMINO 31/07/2023		
	DÍAS 78		17
ANTICIPO:	APLICA MONTO: \$0.00	NO APLICA X	PORCENTAJE: 0.00
	FECHA DE PAGO:		24/07/2023

B) REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$0.00	30/06/2023
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$0.00	30/06/2023
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	5	50	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	5	50	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	5	55	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:		\$173,998.21	
AFIANZADORA:		Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V. - Grupo Financiero	
No. DE FIANZA:		3320-05460-7	
FECHA:		12/05/2023	
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO PLAZO	EXISTE IMPORTE/PERIODO	FECHA
	NO APLICA X	INICIAL FINAL	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$2,018,379.27	C/IVA

OBSERVACIONES:
LA OBRA CONTINUA EN PROCESO.

Ing. Civil Erik Pérez Álvarez
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Uriel Mariano Vargas Salas
SUPERVISOR DE OBRAS



FORMATO 11

*En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLÁN, VER.

RE FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio:	TIHUATLÁN	Localidad:	TIHUATLÁN	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2023
No. de obra:	2023301750236	Periodo:	JUNIO	Número de estimación:	N/A
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE AULA Y SANITARIOS PARA EL CAIC "JUANA DE ARCO" DE LA COLONIA UNIDAD NACIONAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLAN, VER.			Fuente de financiamiento:	FORTAMUNDF
				Fecha de revisión:	24/07/2023



Concepto de obra ejecutado:

La fotografía muestra el aplanado de el aula.



Concepto de obra ejecutado:

La fotografía muestra la colocación del impermeabilizante en el punto indicado.

Observaciones:

OBRA CULMINADA.



Uriel Mariano Vargas Salas
Uriel Mariano Vargas Salas
Supervisor de Obras

ING.
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLAN, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2023

FECHA DE ELABORACION:
24/07/2023
MES QUE SE REPORTA
JUNIO

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	TIHUATLAN	LOCALIDAD:	TIHUATLAN	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE AULA Y SANITARIOS PARA EL CAIC "JUANA DE ARCO" DE LA COLONIA UNIDAD NACIONAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLAN, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FORTAMUN	No. DE OBRA:	2023301750236		

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI	X	NO			
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:						
TIPO DE ZONA:	RURAL	CLAVE	N/A			
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		AGEB:				
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	NO	X		
		SI	X	NO		
GRADO DE REZAGO SOCIAL:	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	X	MUY BAJO
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:	DIRECTA	X	COMPLEMENTARIA	RESTRINGIDA		
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA	LATITUD	0.000000000	LONGITUD	0.000000000		

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
1 ANEXO

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA.

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	FACTURAS												IMPORTE NETO
		No.	MONTO				5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES											
TOTALES	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MONTO AUTORIZADO:	\$984,979.20	C/IVA	
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$985,401.88	C/IVA	
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:			NO APLICA
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA:			NO APLICA
LA FACTIBILIDAD:			
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	X	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA:			NO APLICA
LOS PERMISOS:	H. AYUNTAMIENTO, TIHUATLAN, VER.		
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA		EXISTE
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS		X
	licitación pública		

NO. DE CONTRATO:	MTY-AD-FORTAMUN-DM/10232301750236	FECHA:	
CONTRATISTA:	JUAN JORGE GONZALEZ RAMIREZ		
RF:	GORJ6806185M9		
MONTO CONTRATADO:	\$984,979.20	C/IVA	
	PROGRAMADA	REAL	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	15/05/2023	15/05/2023
	TÉRMINO	30/06/2023	30/06/2023
	DÍAS	47	47
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:	\$0.00	PORCENTAJE: 0.00
	FECHA DE PAGO:	24/07/2023	

B) REPORTE

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$0.00	
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$0.00	
FINQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	DOCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	20	80	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	20	80	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	20	100	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	\$84,912.00	VICIOS OCULTOS	\$98,497.92
MONTO AFIANZADO:					
AFIANZADORA:		DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A		
No. DE FIANZA:		23A24150	23A24151		
FECHA:		13/05/2023	30/06/2023		
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA	
	PLAZO		INICIAL	FINAL	
	NO APLICA	X			
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:			\$984,979.20		

OBSERVACIONES:
OBRA CULMINADA.

Ing. Civil Erik Pérez Álvarez
DIRECTOR DE OBRAS
Ing. Uriel Mariano Vargas Salas
SUPERVISOR DE OBRAS



FORMATO 11

*En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja



H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLÁN, VER.

RE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio:	TIHUATLÁN	Localidad:	TIHUATLÁN	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2023
No. de obra:	2023301750238	Periodo:	JUNIO	Número de estimación:	
Descripción:	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PUBLICO Y CERCADO PERIMETRAL EN LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL, TIHUATLAN, VER.			Fuente de financiamiento:	FORTAMUNDF
				Fecha de revisión:	24/07/2023



Concepto de obra ejecutado: Construcción de muro de contención a base de piedra braza



Concepto de obra ejecutado: Construcción de barda perimetral con muros de tabique rojo

Observaciones:

LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO SIN PROBLEMA ALGUNO




 Diana Guadalupe Ríos García
Supervisor de Obras

ING.
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



**H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLAN, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**

FECHA DE ELABORACIÓN:
24/07/2023
MES QUE SE REPORTA
JUNIO

EJERCICIO 2023

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO: TIHUATLAN LOCALIDAD: TIHUATLAN DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO PUBLICO Y CERCADO PERIMETRAL EN LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL, TIHUATLAN, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUN-DF No. DE OBRA: 2023301750238

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	X	NO
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:				
TIPO DE ZONA:	RURAL URBANA	CLAVE AGE:	N/A	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	NO	X	
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI	X	NO	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA				
LATITUD	0.00000000	LONGITUD	0.00000000	

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DEL CERCADO PERIMETRAL Y EDIFICIO PÚBLICO EN LAS INSTALACIONES DEL DIF

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 25%

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACION	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
TOTALES	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MONTO AUTORIZADO:	\$1,927,653.41	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$1,929,171.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE X NO EXISTE NO APLICA	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:	H. AYUNTAMIENTO	
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MÍNOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA	X

NO. DE CONTRATO:	MTI-IR-FAISMUN/2023/30/175/0238	FECHA:	30/07/2023
CONTRATISTA:	DESIGN AND CIVIL WORKS, SA DE CV		
RFC:	DCW171222NAB		
MONTO CONTRATADO:	\$1,927,653.41	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO PROGRAMADA	REAL	
	TÉRMINO	01/06/2023	01/06/2023
	DÍAS	92	30
	APLICA	NO APLICA	X
ANTICIPO:	MONTO: \$0.00	PORCENTAJE: 0.00	
	FECHA DE PAGO:	24/07/2023	

B) REPORTE

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$0.00	
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$0.00	
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:		\$166,177.02	
AFIANZADORA:		SOFIMEX	
No. DE FIANZA:		2796558	
FECHA:		30/05/2023	
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO
	PLAZO	NO APLICA	FECHA
	NO APLICA	X	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$1,927,653.41	C/IVA

OBSERVACIONES:

LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO



Ing. Civil Erik Pérez Álvarez
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Diana Guzmán de Buitrago
SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.




H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLÁN, VER.


REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: TIHUATLÁN	Localidad: TIHUATLÁN	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2023
No. de obra: 2023301750241	Periodo: JUNIO	Número de estimación:
Descripción: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y REHABILITACION DE SUS INSTALACIONES EN LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA		Fuente de financiamiento: FORTAMUNDF
		Fecha de revisión: 24/07/2023

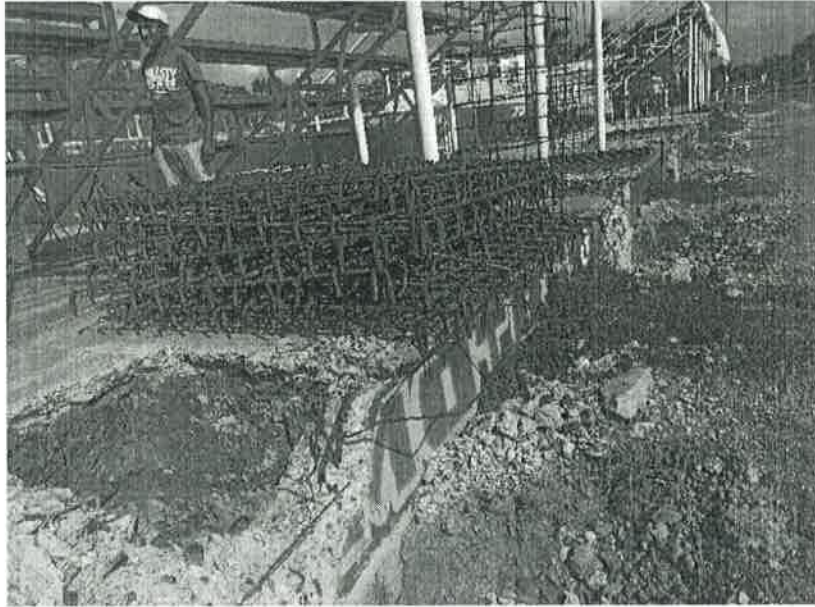

Concepto de obra ejecutado: Habilitado de acero para zapatas de sección 1.80 x 1.80

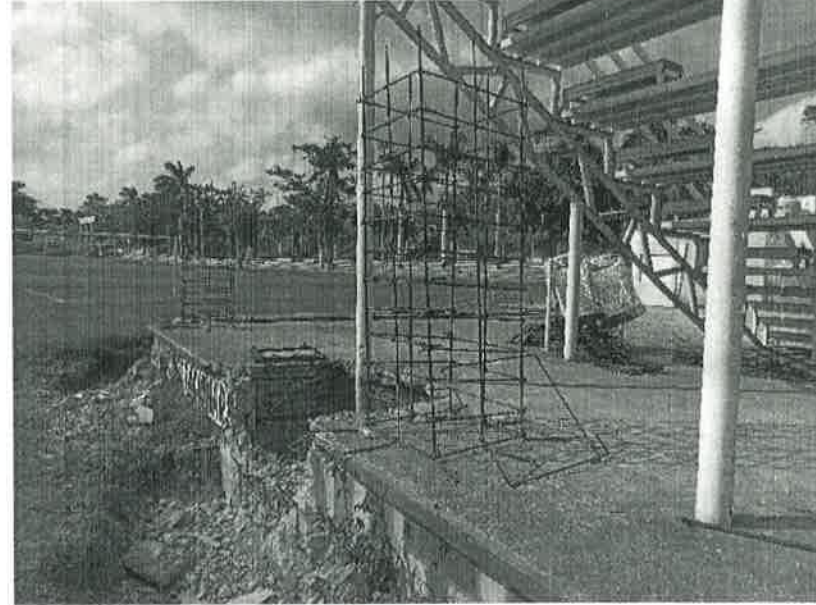

Concepto de obra ejecutado: Habilitado de acero para dados de cimentación

Observaciones:

LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO




 Diana Guadalupe Ríos García
Supervisor de Obras

ING.
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



**H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLAN, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**

EJERCICIO 2023

FECHA DE ELABORACIÓN:
24/07/2023
MES QUE SE REPORTA
JUNIO

A) PLANEACIÓN Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO: TIHUATLÁN	LOCALIDAD: TIHUATLÁN	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y REHABILITACION DE SUS INSTALACIONES EN LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLAN, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUN	No. DE OBRA: 2023301750241	

ANTECEDENTES:		GRADO DE REZAGO SOCIAL:	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:	MUY ALTO	ALTO MEDIO BAJO X MUY BAJO
TIPO DE ZONA: RURAL URBANA	CLAVE AGE: N/A	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	DIRECTA	COMPLEMENTARIA X RESTRINGIDA
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA			
LATITUD: 0.00000000	LONGITUD: 0.00000000		

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y REHABILITACION DE SUS INSTALACIONES

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:
AVANCE FISICO 30% SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION LA CIMENTACION DEL DOMO

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					IMPORTE NETO
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	
TOTALES	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MONTO AUTORIZADO:	\$6,095,366.09	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$6,099,015.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE X NO EXISTE NO APLICA	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:	H. AYUNTAMIENTO	EXISTE
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA	X

NO. DE CONTRATO:	MTI-IR-FORTAMUN-DF/2023/30/175/0241	FECHA:	08/05/2023
CONTRATISTA:	MAYRA VALDEZ RAMIREZ		
RFC:	VARM8610025B1		
MONTO CONTRATADO:	\$6,095,366.09	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA REAL		
	INICIO 10/05/2023	10/05/2023	
	TÉRMINO 06/09/2023		
	DÍAS 120	52	
ANTICIPO:	APLICA MONTO \$0.00	NO APLICA PORCENTAJE: 0.00	
	FECHA DE PAGO: 24/07/2023		

B) REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$0.00	
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$0.00	
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FISICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:
LA OBRA PRESENTA UN AVANCE DEL 30%

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:		\$525,462.00	
AFIANZADORA:		SOFIMEX	
No. DE FIANZA:		2805331	
FECHA:		08/05/2023	
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO PLAZO NO APLICA X	EXISTE IMPORTE/PERIODO	FECHA INICIAL FINAL
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$6,095,366.09	C/IVA



Ing. Civil Erik Pérez Álvarez
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Diana Guadalupe Ríos García
SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.
