




AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIHUATLÁN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
CIERRE DE EJERCICIO 2023

Ciudad y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Ciudad y Nombre del Municipio: 175 TIHUATLÁN
Fuente de Financiamiento: FEFMPT
Presupuesto Autorizado: \$13,714,285.29

Hoja: # de # 1 de 1
Fecha de Actualización:

Programa	Subprograma	Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avance físico-financiero				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Desagregada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Estructura Financiera (Saldo)							Observaciones											
						Físico		Financiero		Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Federales	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Federales	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Federales	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras																	
						%	Inicio	%	Inicio																								%	Inicio	%	Inicio	%		Inicio	%	Inicio								
SE	02		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN	30175001	CENZO DE BUENAVISTA	100.00	10/07/2023	21/09/2023	100.00	15/09/2023	15/09/2023	SN	CONTRATO	1,126,719.32	1,126,719.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126,719.32	1,126,719.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,000.00	1,000.00					
SE	02		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO (SEGUNDA ETAPA) DE LA CALLE 19 DE MAYO DE LA LOCALIDAD CHICHIMANTLA II, TIHUATLÁN, VER.	30175001	CHICHIMANTLA SEGUNDO	100.00	10/08/2023	26/07/2023	100.00	26/08/2023	26/08/2023	TERMINADA	CONTRATO	1,444,840.26	1,444,840.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444,840.26	1,444,840.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,000.00	1,000.00				
SE	02		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE 30 DE NOVIEMBRE (PRIMERA ETAPA) DE LA LOCALIDAD DE EL HORCÓN, TIHUATLÁN, VER.	30175002	EL HORCÓN	100.00	08/05/2023	30/09/2023	100.00	30/09/2023	30/09/2023	TERMINADA	CONTRATO	1,489,039.31	1,489,039.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489,039.31	1,489,039.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	984.00	984.00			
SE	02		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE ADOLOFO MATEOS DE LA LOCALIDAD EL ORIENTE, TIHUATLÁN, VER.	30175004	EL ORIENTE	100.00	10/05/2023	17/07/2023	100.00	26/08/2023	26/08/2023	TERMINADA	CONTRATO	1,461,498.80	1,461,498.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461,498.80	1,461,498.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	882.00	882.00			
SE	02		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE RAFAEL HERNANDEZ OCHOA DE LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA LA BOMBA, TIHUATLÁN, VER.	30175002	EMILIANO ZAPATA (LA BOMBA)	100.00	25/09/2023	31/10/2023	100.00	20/11/2023	20/11/2023	TERMINADA	CONTRATO	1,410,241.45	1,410,241.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410,241.45	1,410,241.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	848.00	848.00				
SE	02		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE CARRETERA ARTISIA Y MEL CHOR OCAJUP DE LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA, TIHUATLÁN, VER.	30175002	FRANCISCO VILLA	100.00	09/09/2023	26/07/2023	100.00	01/07/2023	10/08/2023	TERMINADA	CONTRATO	1,995,756.54	1,995,756.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995,756.54	1,995,756.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,171.00	1,171.00				
SE	02		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE AMPURÓN 18 DE MARZO DE LA LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN, TIHUATLÁN, VER.	30175006	RICARDO FLORES MAGÓN	100.00	22/05/2023	30/09/2023	100.00	15/09/2023	30/09/2023	TERMINADA	CONTRATO	1,597,787.69	1,597,787.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597,787.69	1,597,787.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,000.00	1,000.00			
SE	02		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DEL CALLEJÓN TLIXPAN DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL MECATEPEC, TIHUATLÁN, VER.	30176009	SAN MIGUEL MECATEPEC (MICHIMANTLA)	100.00	09/11/2023	15/12/2023	100.00	30/12/2023	30/12/2023	TERMINADA	CONTRATO	1,998,458.95	1,998,458.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998,458.95	1,998,458.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,215.00	1,215.00				
AS	03		CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL PARA EL POZO PÚBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLÁN, VER.	30175000	TIHUATLÁN	100.00	03/10/2023	25/10/2023	100.00	15/11/2023	15/11/2023	TERMINADA	CONTRATO	519,948.89	519,948.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,948.89	519,948.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	1.00		
UB	02		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	30175000	TIHUATLÁN	100.00	01/12/2023	15/12/2023	100.00	30/12/2023	30/12/2023	TERMINADA	CONTRATO	391,328.80	391,328.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,328.80	391,328.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	200.00	200.00	
SE	02		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLEJONES DE LA LOCALIDAD, LAS PIEDRAS, TIHUATLÁN, VER.	30175005	LAS PIEDRAS	100.00	01/12/2023	25/12/2023	100.00	30/12/2023	30/12/2023	TERMINADA	CONTRATO	350,072.54	350,072.54	0.00	0.00	71,408.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,072.54	350,072.54	0.00	0.00	71,408.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	355.00	355.00	

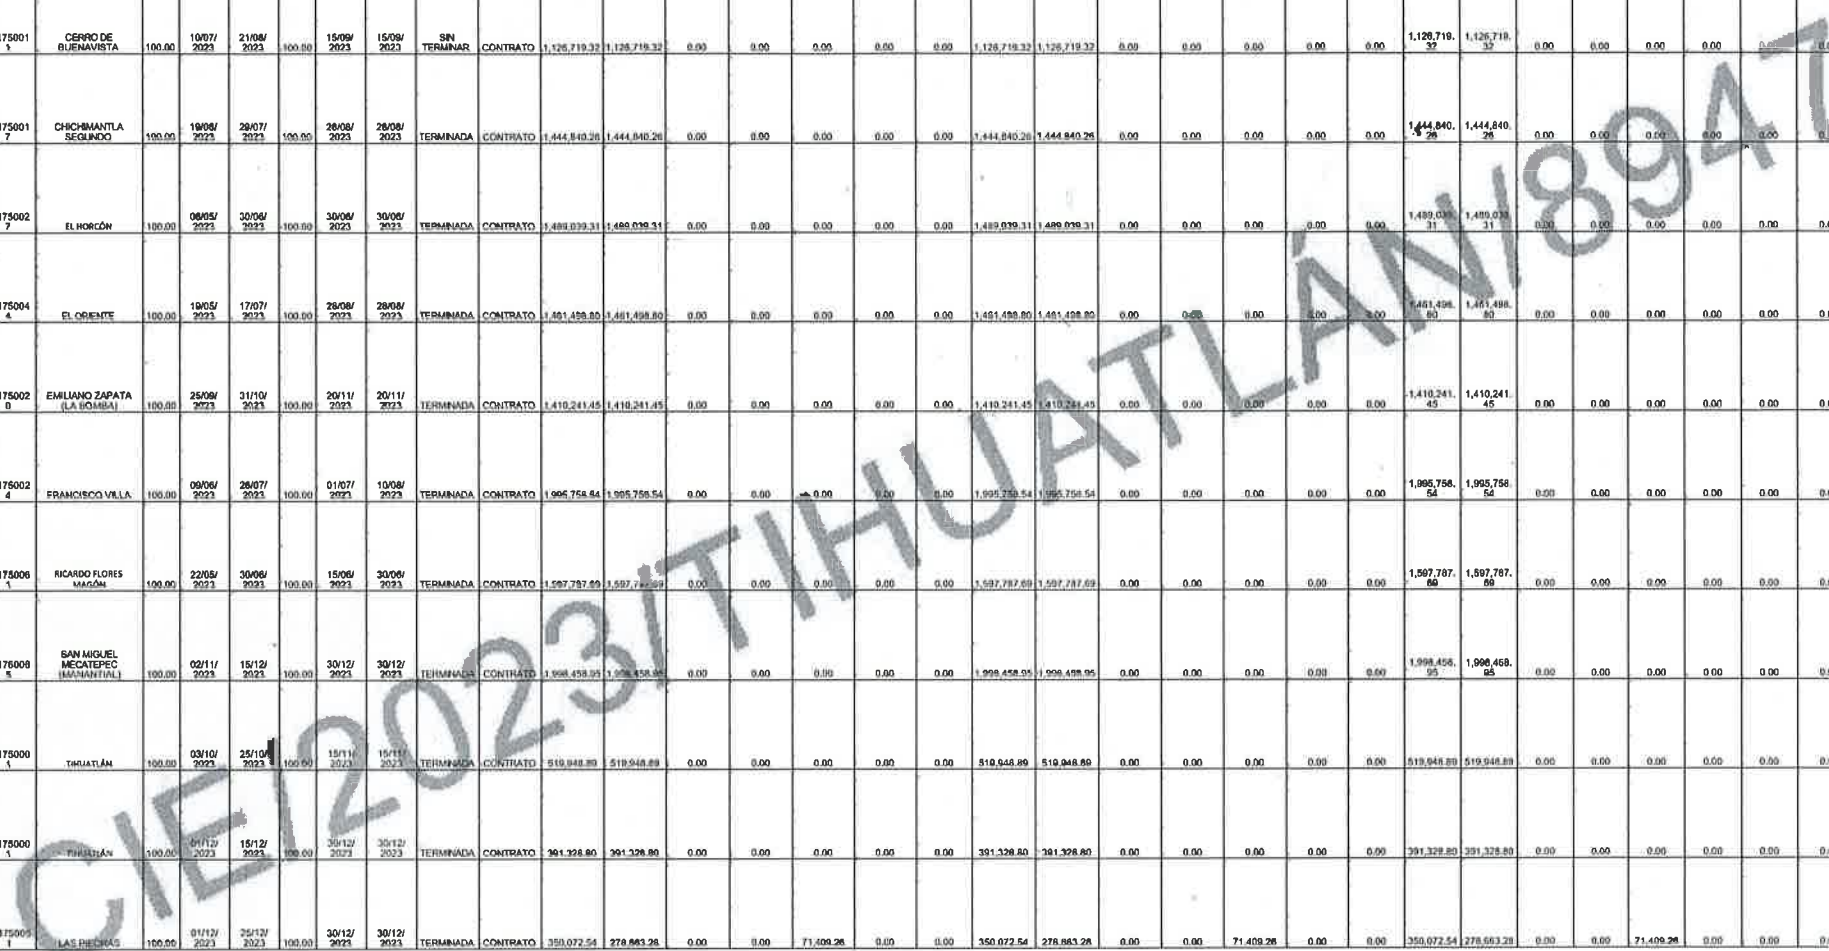

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO: \$13,785,604.55 / \$13,714,285.29

Roberto Domínguez González
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



Rosa Marina Sánchez López
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



Aniceto Argimiro Garza Macho
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

